



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERKAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah



LAPORAN BULAN III

PEKERJAAN :

**PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

LOKASI :

**KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH**



CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESIGN - SUPERVISION - ENGINEERING CONSULTANT

Jl. Sekeloa, Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah
Telp : 0907-810000, Fax : 0907-810000
Email : faya.kuntura.sentosa@gmail.com

**TAHUN :
2023**



CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESAIN – SUPERVISION – ENGINEERING CONSULTANT

Office : Komplek Puri Jeruk Nipis No. 01 Jl. Jeruk Nipis Abepura – Jayapura
Phone : 0967 – 5185454. Fax : 0967 – 5185453

Nomor : 02/FKS/WAS-AKIPPT/2023

Nabire, 31 Desember 2023

Perihal : Laporan Pendahuluan

Kepada Yth,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Merdeka, nabire / provinsi papua tengah

di -

Nabire

Dengan hormat,

Berdasarkan Kontrak Konsultan Supervisi

Paket : **PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH**

Nomor : **20.3/WAS-AKSES PPT/SP/DPUPR-PPT/2023**

tanggal : **16 OKTOBER 2023**

bersama ini disampaikan Laporan Pendahuluan

No : 03

Periode : LAPORAN BULAN 3

Sebanyak : 5 buku

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
KONSULTAN SUPERVISI
CV. FAYA KUNTURA SENTOSA



DESIARTI NDAMAWALAHARA, ST

Site Engineer

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
SURAT PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETA LOKASI	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum.....	1
1.2. Uraian Pekerjaan	4
1.3. Kondisi Eksisting	5
1.4. Rencana Penanganan	5

BAB II AKTIVITAS KONTRAKTOR

2.1. Aktivitas Fisik Bulan ini	6
2.2. Struktur Organisasi Kontraktor	7
2.3. Daftar Peralatan	8
2.4. Laporan Kemajuan Pekerjaan	8
2.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan.....	15
2.6. Ringkasan Quality Control	16

BAB III AKTIVITAS KONSULTAN

3.1. Laporan Aktivitas Konsultan Supervisi.....	17
3.2. Struktur Organisasi Konsultan Supervisi	18
3.3. Jadwal Penugasan Personil.....	19


BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Saran	20


LAMPIRAN

Lampiran sesuai progress pada bulan yang bersangkutan	21
---	----

PETA LOKASI

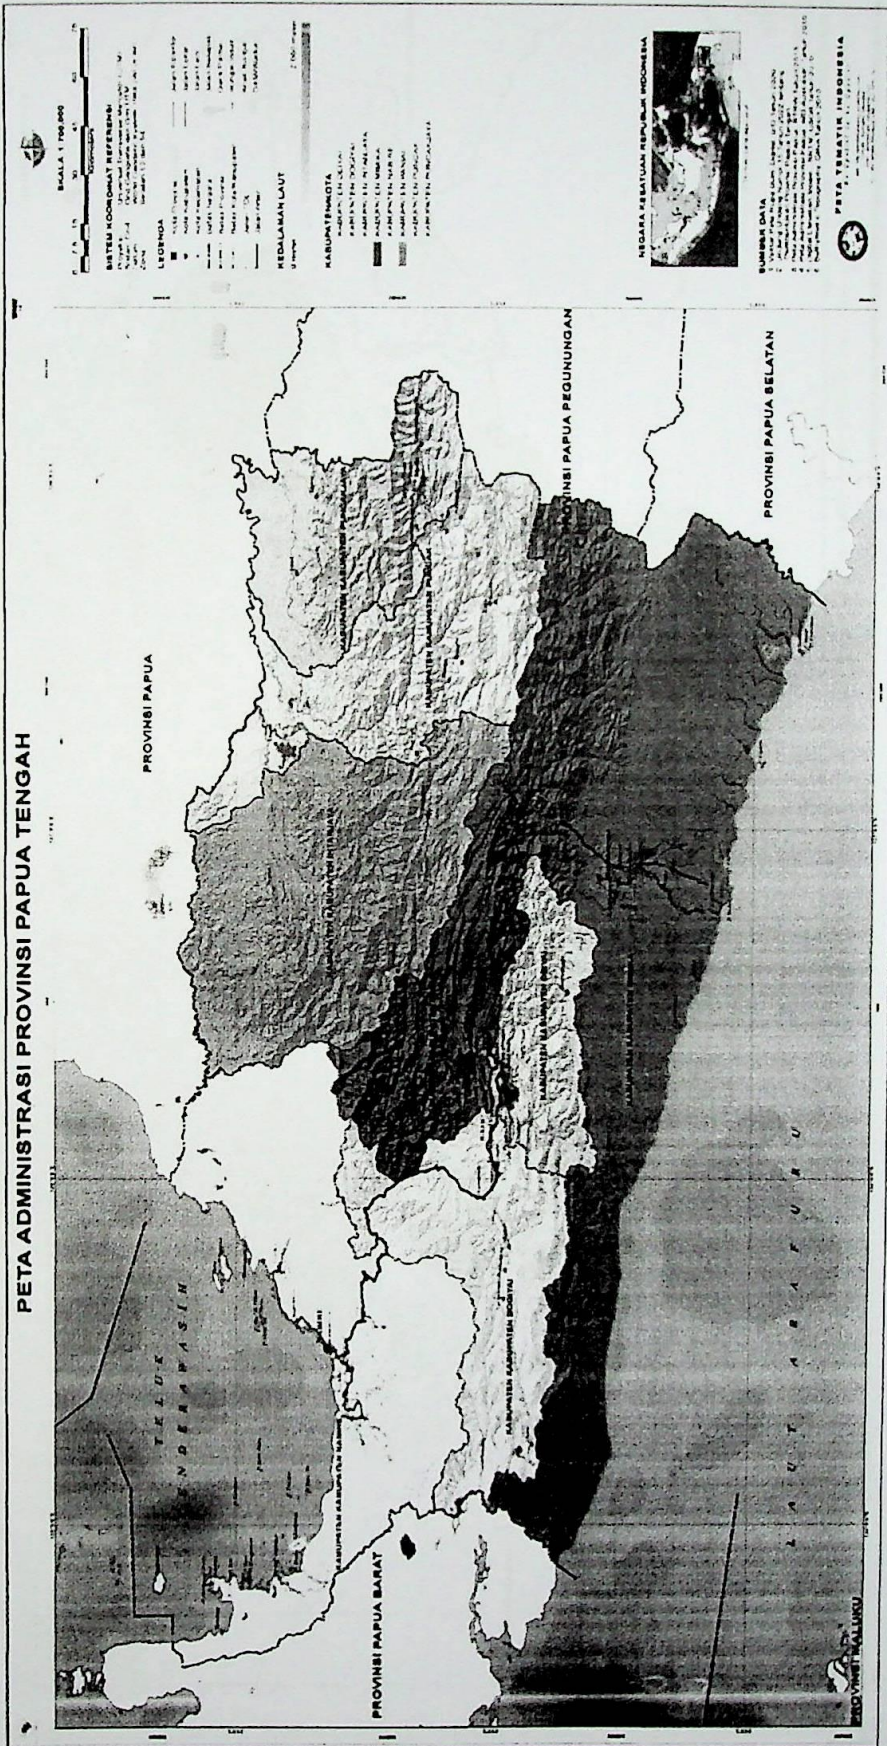

PETA LOKASI KABUPATEN NABIRE

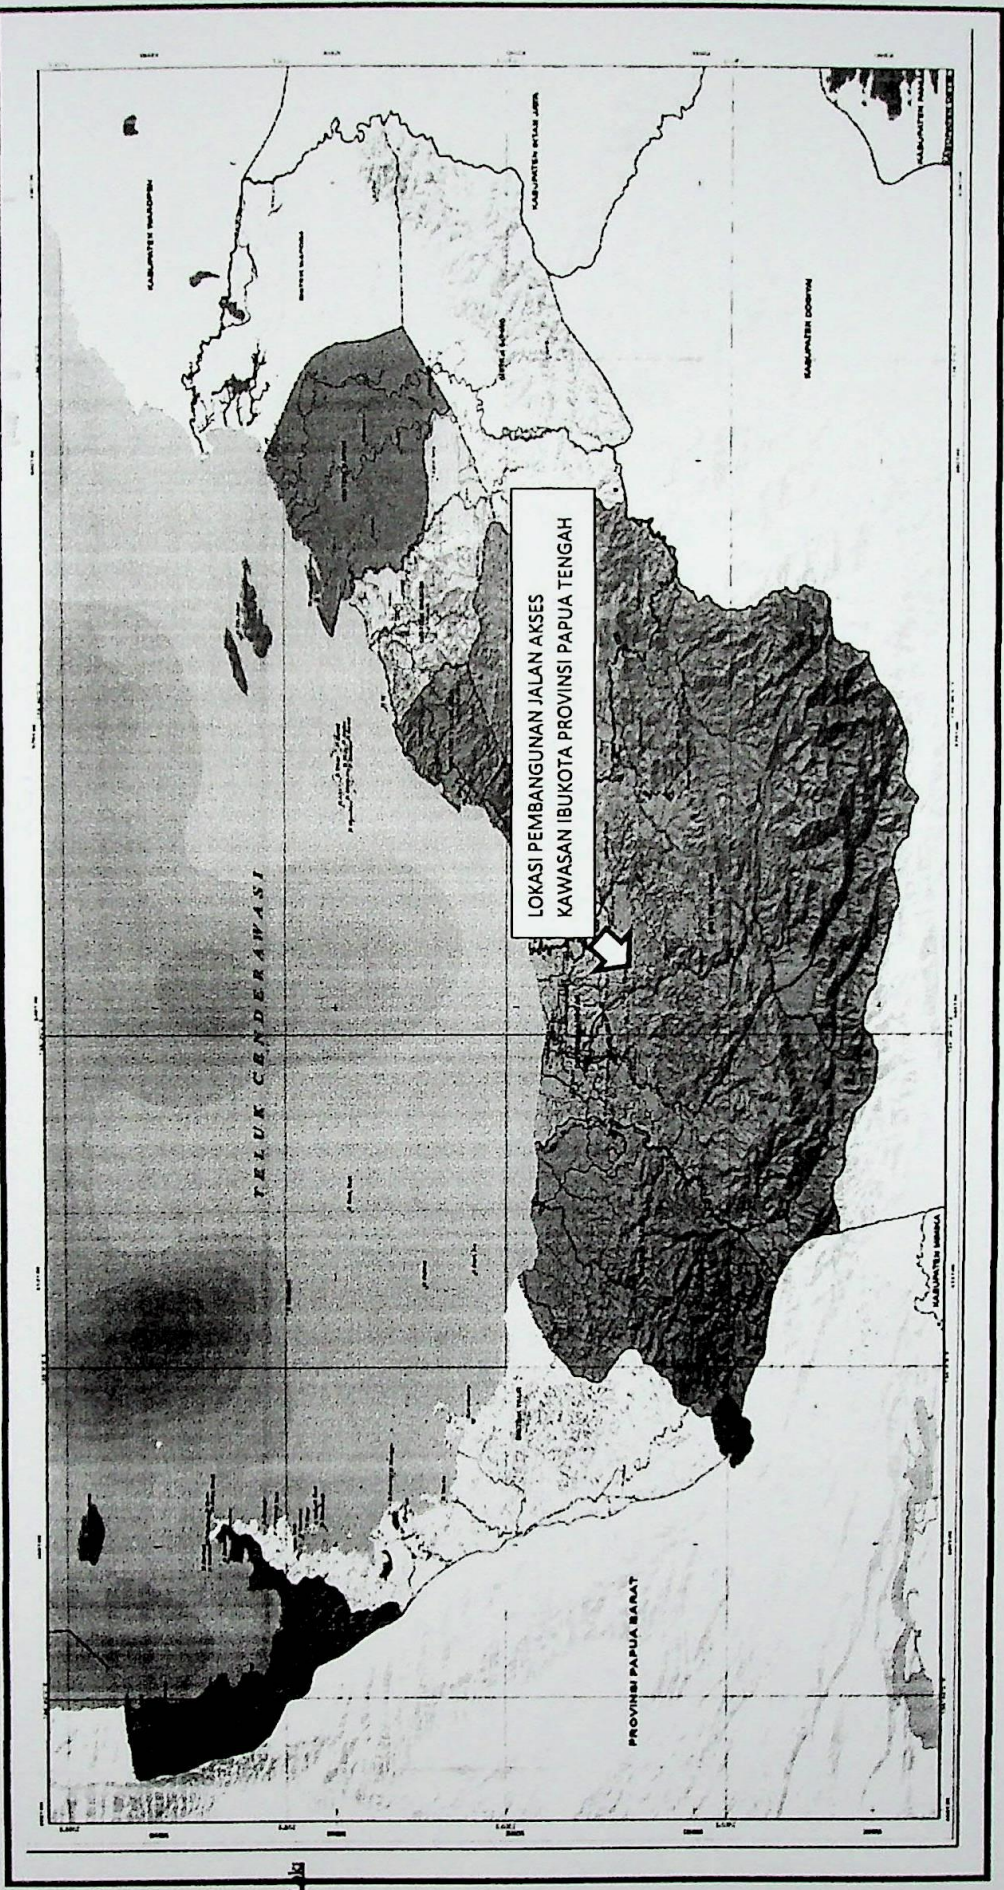

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan sasaran pembangunan yang diarahkan pada Indonesia Bagian Timur termasuk di dalamnya Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Kabupaten Nabire , maka pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan.

Dan Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian baik pelaksanaan fisik di lapangan maupun administrasi, maka Pemerintah daerah dalam hal ini **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, telah menunjuk Konsultan Pengawasan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan **“PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH”**. Dan dalam hal ini Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan Pengawasan jalan tersebut diatas yaitu **CV. FAYA KUNTURA SENTOSA** , Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor **20.3/WAS-AKSES PPT/SP/DPUPR-PPT/2023** Tanggal 16 OKTOBER 2023. Adapun Struktur Organisasi Pengguna Anggaran dalam hal ini **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** pada kegiatan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH** yaitu yang terlampir dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGGUNA ANGGARAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)


Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN

IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH

Provinsi : Papua Tengah

Kabupaten : Nabire

Tahun : 2023



Adapun pula data-data umum dari kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan **“PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH ”**, Provinsi papua tengah,kabupaten Nabire yaitu:

Kontraktor : **PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI**
Nama Pekerjaan : **PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH**
Nomor Kontrak : **21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023**
Tanggal Kontrak : **16 OKTOBER 2023**
Nilai Kontrak Fisik : **Rp. 34.196.817.583,13**
Tahun Anggaran : **2023**
Waktu Pelaksanaan : **75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender**

1.2. URAIAN PEKERJAAN

Adapun Uraian Pekerjaan kontraktor pelaksana **PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH** berdasarkan Perjanjian kontrak Tanggal 16 OKTOBER 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah					
Prop/Kab/Kodya : Provinsi Papua Tengah / Nabire					
Tahun Anggaran : ' 2023					
No	Uraian	Sat	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	e	d	f
	DIVISI 1. UMUM				
1,2	Mobilisasi	LS	1,00	311.000.000,00	311.000.000,00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	59.060.000,00	59.060.000,00
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	144.100.000,00	144.100.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	14.068,00	62.034,55	872.702.049,40
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	126.832,50	32.424,69	4.112.504.494,43
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M ³	6.291,90	27.050,77	170.200.752,01
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	45.260,00	477.094,75	21.593.308.385,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	130.000,00	12.339,41	1.604.123.773,49
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²	80.000,00	24.261,81	1.940.944.621,03
	NILAI FISIK	:			30.807.944.075,35
	PPN 11%	:			3.388.873.848,29
	JUMLAH	:			34.196.817.923,64
	DIBULATKAN	:			34.196.817.000,00

1.3. KONDISI EKSISTING

Adapun Kondisi eksisting lokasi Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH Tahun 2023 yaitu :

- Lokasi Peningkatan Berada di Kabupaten nabire, Distrik Wanggar, Provinsi Papua Tengah.
- Area Lahan Berkontur Datar dan Gunung.
- Tanah dasar pada lokasi kegiatan cukup baik.

1.4. RENCANA PENANGANAN

Adapun rencana penanganan dari Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH adalah sebagai berikut:

Rencana Penanganan :

Adapun proses Penanganan pada PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH Tahun Anggaran 2023 oleh kontraktor pelaksana yaitu:

- PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI II. DRAINASE
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH

2.1. AKTIVITAS FISIK BULAN INI

Kontraktor : PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI

Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA
- PROVINSI PAPUA TENGAH

Provinsi : PAPUA TENGAH

Kabupaten : NABIRE

Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

- A. Kontraktor telah melakukan mobilisasi alat berat di lokasi pekerjaan.
- B. Kontraktor telah melakukan pekerjaan land clearing, Penyiapan Badan Jalan, Pekerjaan Galian Biasa, Pekerjaan Timbunan Biasa, Pekerjaan Timbunan Pilihan dan Juga Galian Saluran.
- C. Pekerjaan Mengalami Keterlambatan Kerja dikarenakan adanya Pemalangan dari Masyarakat Setempat Pemilik Hak Ulayat pada lokasi Kerja

2.2. STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR

PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI

**PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA
TENGAH**



2.3. DAFTAR PERALATAN

Adapun dibawah ini Tabel daftar penggunaan peralatan yang dipergunakan kontraktor pelaksana dilapangan yaitu :

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1.	Exavator	6 Unit	Nabire	Baik
2.	Dozer	2 Unit	Nabire	Baik
3	MOTOGRADE	2 Unit	Nabire	Baik
4	VIBRATOR ROLLER	2 Unit	Nabire	Baik
5.	Truck	55 Unit	Nabire	Baik
6.	Perlengkapan Lainnya	1 Unit	Nabire	Baik

2.4. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

- ❖ Laporan Mingguan
- ❖ Laporan Bulanan

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Naibre, 08 Desember 2023
--

DIBUAT OLEH ::

KONGRESI SUPERVISI

CV. PATAKONTURA

This micrograph shows a cross-section of a plant stem. The central vascular cylinder is prominent, surrounded by a ring of large, thin-walled cells. The outer layers of the stem are also visible, showing a clear boundary between the cortex and the pith.

James

1

Superior Foodway

MENYETUJUH :

PEJABAT PEMUDA KOMPREN (PPK)

DINAS PERENCANAAN, UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANGKALAN
Jl. Veteran No. 100, Bangkalan
Telp. (031) 831 2111
Faks. (031) 831 2111
E-mail: bangkalan@bangkalan.go.id
Website: bangkalan.go.id

卷之六

★
JAWABAN PAKET

PA



DATA TENC

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

IAJADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Number	10-December-2023
--------	------------------

• ATTILIO

PELABAT PEMERINTAH (GINTI/REKSPK)
DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH SAKIT DAN KEMERDIAAN TUBUH



DIBUAT OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
SY FAYA KUNTURA SENTOSA

DESIGNER

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Pembangunan Jalan Aspal Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
 Prop/Kab/Kota : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Anggaran : 2023



PT. FATA KUSTURA SISTORA
 Jl. Raya Kustura Sistora
 Telp. (0907) 1111111, Fax (0907) 1111111

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

No	Uraian	Sat	Volume	Bobot (%)	MINGGU KE :		PERIODE :		PERSENTASE	DESEMBER												Kif
					9 (SEBULAN)		13 Desember 2023			NOVEMBER												
					REKUIBARI		OCTOBER															
					MINGGU LALU		MINGGU INI			NOVEMBER												
a	b	c	d	e	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	f	18 Oct 2023	25 Oct 2023	1 Nov 2023	8 Nov 2023	15 Nov 2023	22 Nov 2023	29 Nov 2023	6 Dec 2023	13 Dec 2023	20 Dec 2023	27 Dec 2023		
										RENC												
										PERCEPTAN												
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	1.009	0.78	0.78	-	-	78	0.50												
										REAL												
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	0.192	0.78	0.14	-	-	78	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
										PERCEPTAN												
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	0.488	0.78	0.38	-	-	78	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
										REAL												
										PERCEPTAN												
2.1 (1)	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M ³	14.088.00	2.833	280.00	0.08	-	-	2	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	
										PERCEPTAN												
										REAL												
3.1 (1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKNIK Galian Biasa	M ³	128.832.50	13.349	3.992.8	0.42	2.299	0.24	0.66	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	
										PERCEPTAN												
3.2 (1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M ³	6.291.90	0.842	2.026.0	0.18	4.267	0.37	0.66	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
										PERCEPTAN												
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	45.260.00	70.090	8.240.0	0.66	5.439	8.42	18.09	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	
										PERCEPTAN												
3.3 (1)	Pemadatan Badan Jalan	M ²	130.000.00	5.207	28.900	1.20	74.100	2.97	4.17	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	
										PERCEPTAN												
3.4 (1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²	80.000.00	6.300	61.760	4.86	4.260	0.33	6.20	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	
										PERCEPTAN												
										REAL												
	Jumlah			100.00		17.63	12.34		29.97													



MEKORAT
 PELABAT
 DINAS
 190410226710041001
 17
 17 Desember 2023
 Nabire, 17 Desember 2023
 DESKATI NAWAWAN
 Supervisi

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Petuk : Provil Papua Tengah / Nabile : 2023	Pembangunan Jalan Akses Kemasetan Koti Kota Provial Papua Tengah ' 2023
--	--

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Nabre, 21 December 2023

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

NOVA

.. BAYĀ KUNTURA BENTOMA

—

1

June 1

—

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

Supervital Engineer

1

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

NABIRE, 28 Desember 2023
 DIBUAT OLEH :
 KONSULTAN SUPERVISI
 GUYA KUNTURA SENTOSA

 DESLARTI NDAMA
 Supervisor Engineer

NABIRE, 28 Desember 2023
 DIBUAT OLEH :
 KONSULTAN SUPERVISI
 GUYA KUNTURA SENTOSA

 DESLARTI NDAMA
 Supervisor Engineer

[illegible]

Nihil obstat 27 December 2023
 Konsultant Superior
 SK. JAYA KULTURA SENTOSA
 DEBASTINDOMAWAL VARI, ST
 Suparwati Engineering

2.5 JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (KURVA S)

[illegible][illegible][illegible]

2.5 JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (KURVA S)

[illegible][illegible][illegible]

2.6. RINGKASAN QUALITY CONTROL

Kontraktor : PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
Nomor Kontrak : 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
Tanggal Kontrak : 16 OKTOBER 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 34.196.817.583,13
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender

Kemajuan Pekerjaan s/d Akhir Kontrak ini (Oktober – Desember 2023)

- Rencana Kontrak : 100 %
- Rencana Percepatan : 100 %
- Realisasi : 62,12 %
- Deviasi Terhadap Kontrak : 37,88 %
- Deviasi Terhadap Prceptan: 37,88 %

- Keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan disebabkan oleh adanya pemalangan pekerjaan oleh Masyarakat pemilik lahan dan Total Pemalangan yang dilakukan memakan waktu sekitar 10 Hari Kerja sehingga menyebabkan terjadinya deviasi minus terhadap progress pekerjaan terhadap kontrak.
- Cuaca juga menjadi salah factor terhambatnya pekerjaan dikarenakan tingginya curah hujan yang berdampak pada terhambatnya loading material urugan pilihan dari Sungai wanggar menuju lokasi di karenakan meluapnya Sungai wanggar dan rusak parahnya jalan akses dari lokasi quarry

menuju lokasi penimbunan urugan pilihan yang berada pada sta 0 + 000 sampai sta 8 + 000.

- Lambatnya penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi dengan Para Pemilik Lahan di Kawasan Ibukota menjadi salah satu factor utama pada keterlambatan kerja yang disebabkan oleh pemalangan lokasi kerja.

BAB III

AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

3.1. LAPORAN AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

❖ Site Engineer :

1. Mengikuti Rapat Rutin Bulanan
2. Inspeksi Kelokasi Pekerjaan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pengawasan (Supervisi).
3. Memeriksa semua pekerjaan fisik Proyek terhadap kualitas dan kuantitas.
4. Memeriksa progress kemajuan fisik yang diajukan kontraktor.
5. Memonitor semua Pekerjaan Quality Control yang dilaksanakan Kontraktor.
6. Memeriksa Monthly Sertificate (Sertifikat Bulanan) yang diajukan Kontraktor.
7. Membuat dan menyusun laporan bulanan dan laporan Kemajuan progress pekerjaan Konsultan.

❖ Quantity/Quality Control/Inspector.

1. Memeriksa laporan harian dan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor.
2. Mengawasi semua pekerjaan konstruksi dilapangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan / monitoring pelaksanaan pekerjaan Paket PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH maka dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Kemajuan progres fisik untuk dari Oktober sampai dengan Desember 2023 berjalan lambat hal ini dikarenakan cuaca dan pemalangan pada lokasi pekerjaan. Deviasi dari pekerjaan di bulan ini Negatif 37,88 %.
- ❖ Keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan disebabkan oleh adanya pemalangan pekerjaan oleh Masyarakat pemilik lahan dan juga Hak ulayat dari Suku Wate. Total Pemalangan yang dilakukan memakan waktu sekitar 10 Hari Kerja sehingga menyebabkan terjadinya deviasi minus terhadap progress pekerjaan terhadap kontrak.
- ❖ Cuaca juga menjadi salah factor terhambatnya pekerjaan dikarenakan tingginya curah hujan yang berdampak pada terhambatnya loading material urugan pilihan dari Sungai wanggar menuju lokasi di karenakan meluapnya Sungai wanggar dan rusak parahnya jalan akses dari lokasi quarry menuju lokasi penimbunan urugan pilihan yang berada pada sta 0 + 000 sampai sta 8 + 000.

❖ Lambatnya penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi dengan Para Pemilik Lahan di Kawasan Ibukota menjadi salah satu factor utama pada keterlambatan kerja yang disebabkan oleh pemalangan lokasi kerja.

❖ Adapun rincian kemajuan progres sebagai berikut :

Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (**31 Desember 2022**)

- Rencana Kontrak : 100 %
- Rencana Percepatan : 100 %
- Realisasi : 62,12 %
- Deviasi Terhadap Kontrak : 37,88 %
- Deviasi Terhadap Prceptan: 37,88 %

4.2. SARAN

Hal-hal yang perlu kami sarankan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- ❖ Diharapkan kontraktor segera mencari Solusi atas ketertinggalan terhadap deviasi pekerjaan dengan menambah jam lembur sebagai pengganti hilangnya jam kerja normal yang diakibatkan oleh pemalangan dan cuaca buruk.
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat bermusyawarah dengan masyarakat setempat, agar tidak terjadinya pemalangan yang mengakibatkan progress pekerjaan dilapangan terganggu.

2.6. RINGKASAN QUALITY CONTROL

Kontraktor : PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
Nomor Kontrak : 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
Tanggal Kontrak : 16 OKTOBER 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 34.196.817.583,13
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender

Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (November 2023)

- Rencana Kontrak : 100 %
 - Rencana Percepatan : 100 %
 - Realisasi : 62,12 %
 - Deviasi Terhadap Kontrak : 37,88 %
 - Deviasi Terhadap Prcepatan: 37,88 %
-
- Keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan disebabkan oleh adanya pemalangan pekerjaan oleh Masyarakat pemilik lahan dan Total Pemalangan yang dilakukan memakan waktu sekitar 10 Hari Kerja sehingga menyebabkan terjadinya deviasi minus terhadap progress pekerjaan terhadap kontrak.
 - Cuaca juga menjadi salah factor terhambatnya pekerjaan dikarenakan tingginya curah hujan yang berdampak pada terhambatnya loading material urugan pilihan dari Sungai wanggar menuju lokasi di karenakan meluapnya Sungai wanggar dan rusak parahnya jalan akses dari lokasi quarry

menuju lokasi penimbunan urugan pilihan yang berada pada sta 0 + 000 sampai sta 8 + 000.

- Lambatnya penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi dengan Para Pemilik Lahan di Kawasan Ibukota menjadi salah satu factor utama pada keterlambatan kerja yang disebabkan oleh pemalangan lokasi kerja.

BAB III

AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

3.1. LAPORAN AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

❖ Site Engineer :

1. Mengikuti Rapat Rutin Bulanan
2. Inspeksi Kelokasi Pekerjaan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pengawasan (Supervisi).
3. Memeriksa semua pekerjaan fisik Proyek terhadap kualitas dan kuantitas.
4. Memeriksa progress kemajuan fisik yang diajukan kontraktor.
5. Memonitor semua Pekerjaan Quality Control yang dilaksanakan Kontraktor.
6. Memeriksa Monthly Sertificate (Sertifikat Bulanan) yang diajukan Kontraktor.
7. Membuat dan menyusun laporan bulanan dan laporan Kemajuan progress pekerjaan Konsultan.

❖ Quantty/Quality Control/Inspector.

1. Memeriksa laporan harian dan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor.
2. Mengawasi semua pekerjaan konstruksi dilapangan.

3.2. STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN SUPERVISI

CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
PROVINSI PAPUA TENGAH/KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2023

DEASY NDAWALAHARA, ST

Site Engineer

SIMON J. SIMAMORA, ST

Quality/Quantity control/inspector

NATALIA S. BIDA REHI, ST

Ahli K3

SUCI RAHMADHANA, ST

Inspector

Diajukan oleh:
CV. FAYA KUNTURA SENTOSA



DESIARTI NDAMALAHARA, ST
Site Engineer

PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA

3.3 JADWAL PENUGASAN PERSONIL

JADWAL PENGAWASAN PERSONIL																
NO	PERSONIL	OKTOBER				NOVEMBER							DESEMBER			
		18/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	20/11/2023	27/11/2023	04/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	25/12/2023	01/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023
		SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
		22/10/2023	28/10/2023	05/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023				
I.	SITE ENGINEER															
II.	QUALITY ENGINEER															
II.	AHLI K3															
II.	INSPECTOR															
KETERANGAN :		HADIR :  TIDAK HADIR : 														

Disetujui/ Mengetahui oleh:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA
PROVINSI PAPUA TENGAH



Diajukan oleh:
CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESIARTI NDAMA LAWAHARA, ST
Site Engineer

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan / monitoring pelaksanaan pekerjaan Paket PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH maka dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Kemajuan progres fisik untuk bulan Desember 2023 berjalan lambat hal ini di karenakan cuaca dan pemalangan pada lokasi pekerjaan. Deviasi dari pekerjaan di bulan ini Negatif 37,88 %.
- ❖ Keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan disebabkan oleh adanya pemalangan pekerjaan oleh Masyarakat pemilik lahan dan juga Hak ulayat dari Suku Wate. Total Pemalangan yang dilakukan memakan waktu sekitar 10 Hari Kerja sehingga menyebabkan terjadinya deviasi minus terhadap progress pekerjaan terhadap kontrak.
- ❖ Cuaca juga menjadi salah factor terhambatnya pekerjaan dikarenakan tingginya curah hujan yang berdampak pada terhambatnya loading material urugan pilihan dari Sungai wanggar menuju lokasi di karenakan meluapnya Sungai wanggar dan rusak parahnya jalan akses dari lokasi quarry menuju lokasi penimbunan urugan pilihan yang berada pada sta 0 + 000 sampai sta 8 + 000.
- ❖ Lambatnya penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah

Provinsi dengan Para Pemilik Lahan di Kawasan Ibukota menjadi salah satu factor utama pada keterlambatan kerja yang disebabkan oleh pemalangan lokasi kerja.

❖ Adapun rincian kemajuan progres sebagai berikut :

Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (**05 Desember 2022**)

- Rencana Kontrak : 100 %
- Rencana Percepatan : 100 %
- Realisasi : 62,12 %
- Deviasi Terhadap Kontrak : 37,88 %
- Deviasi Terhadap Prcepatan: 37,88 %

4.2. SARAN

Hal-hal yang perlu kami sarankan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- ❖ Diharapkan kontraktor segera mencari Solusi atas ketertinggalan terhadap deviasi pekerjaan dengan menambah jam lembur sebagai pengganti hilangnya jam kerja normal yang diakibatkan oleh pemalangan dan cuaca buruk.
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat bermusyawarah dengan masyarakat setempat, agar tidak terjadinya pemalangan yang mengakibatkan progress pekerjaan dilapangan terganggu.

LAMPIRAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



GALIAN BIASA



GALIAN BIASA


PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



3.43826407S 135.38331509E
9 Des 2023 10.15.22
Jalan Tanpa Nama
Karadiri
Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire
Papua

#Pembangun Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Papua Tengah

GALIAN BIASA

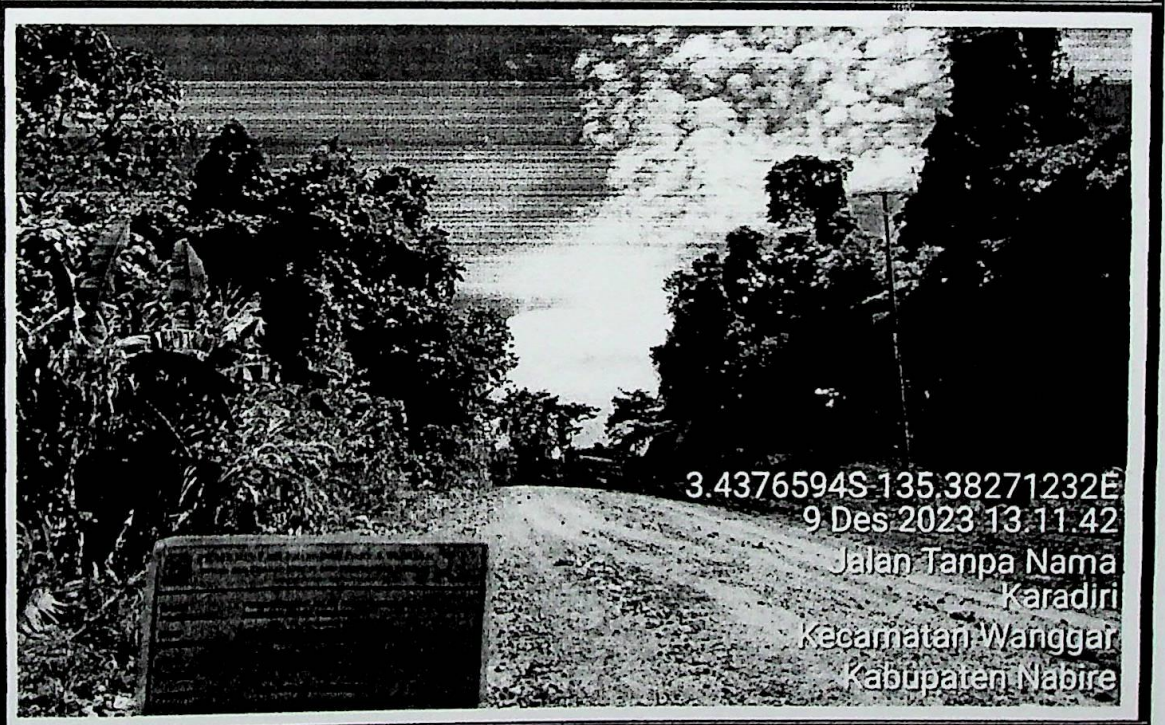

3.4376594S 135.38271232E
9 Des 2023 13.11.42
Jalan Tanpa Nama
Karadiri
Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire

GALIAN BIASA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



GALIAN BIASA



GALIAN BIASA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



LAND CLEARING



GALIAN BIASA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA
	TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER




GALIAN BIASA




GALIAN BIASA

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER

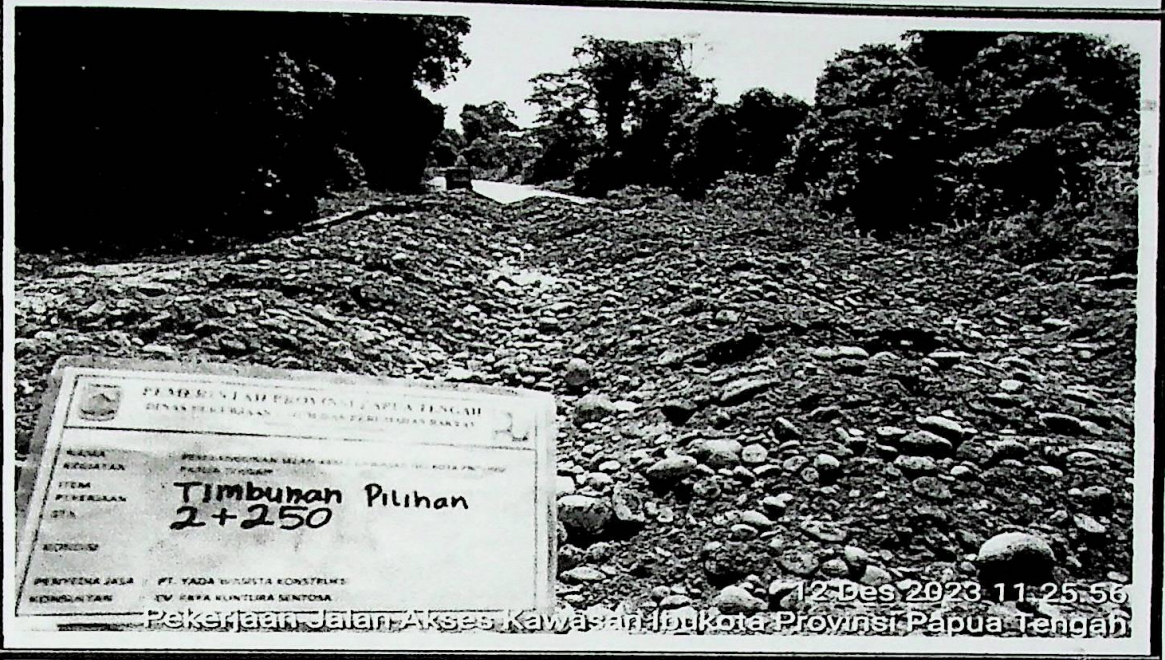

TIMBUNAN PILIHAN

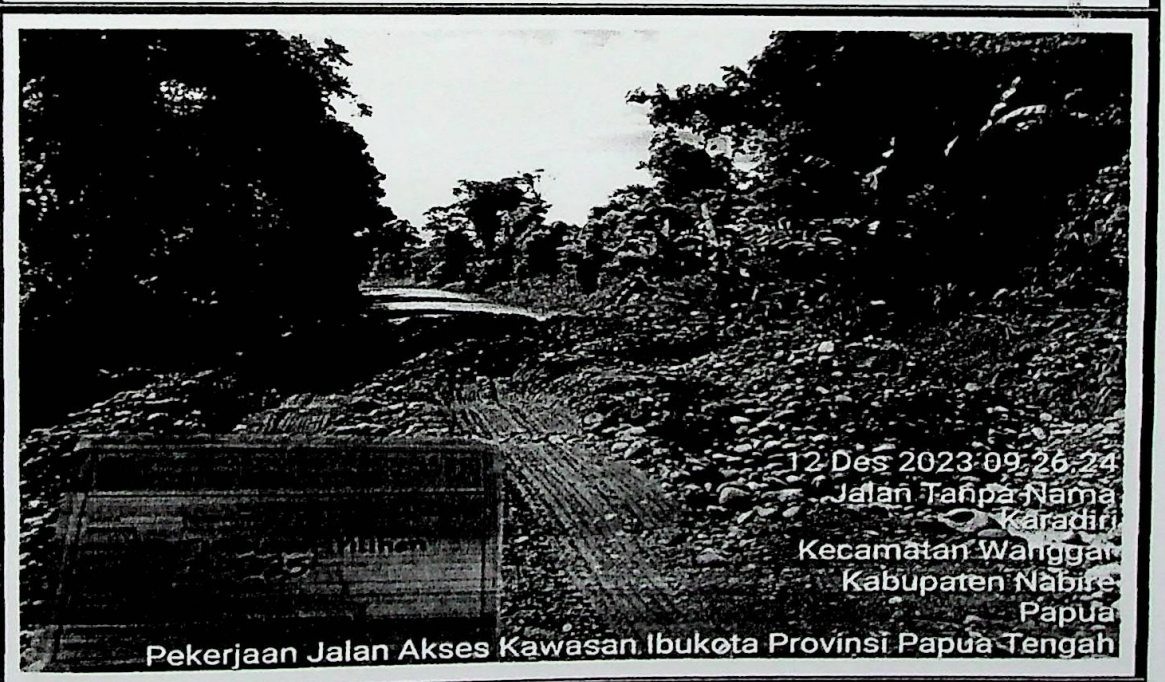

TIMBUNAN PILIHAN


PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



13 Des 2023 11.07.37
Wanggar Makmur
Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire
Papua

Pekerjaan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi Papua Tengah

TIMBUNAN PILIHAN

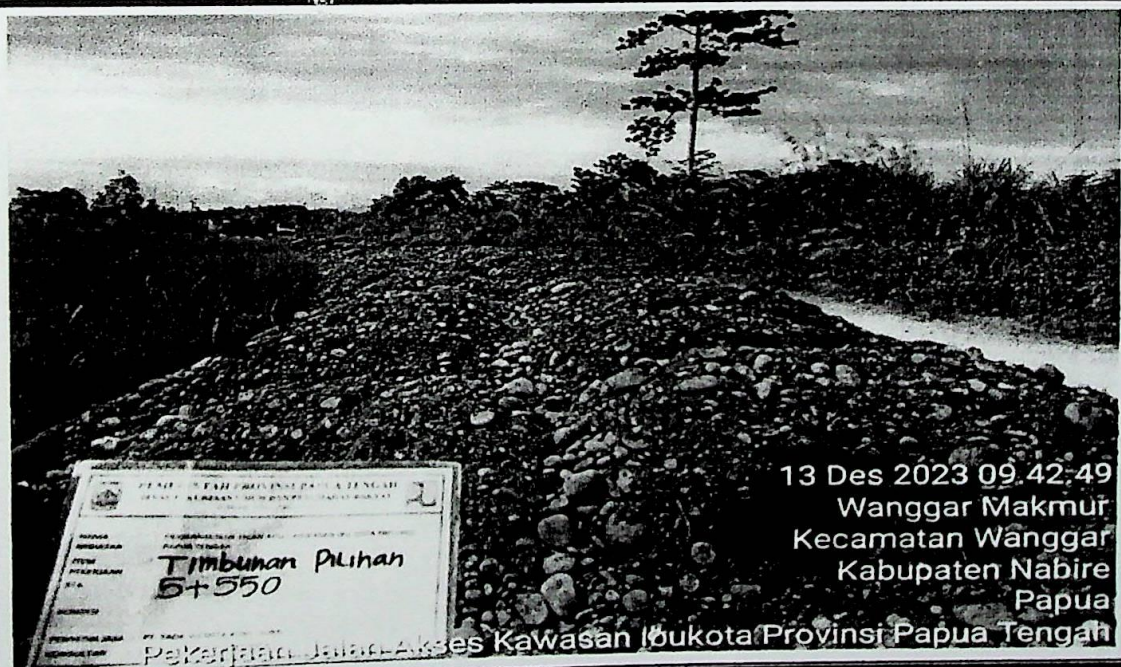

13 Des 2023 09.42.49
Wanggar Makmur
Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire
Papua


Pekerjaan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi Papua Tengah

TIMBUNAN PILIHAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER




TIMBUNAN PILIHAN

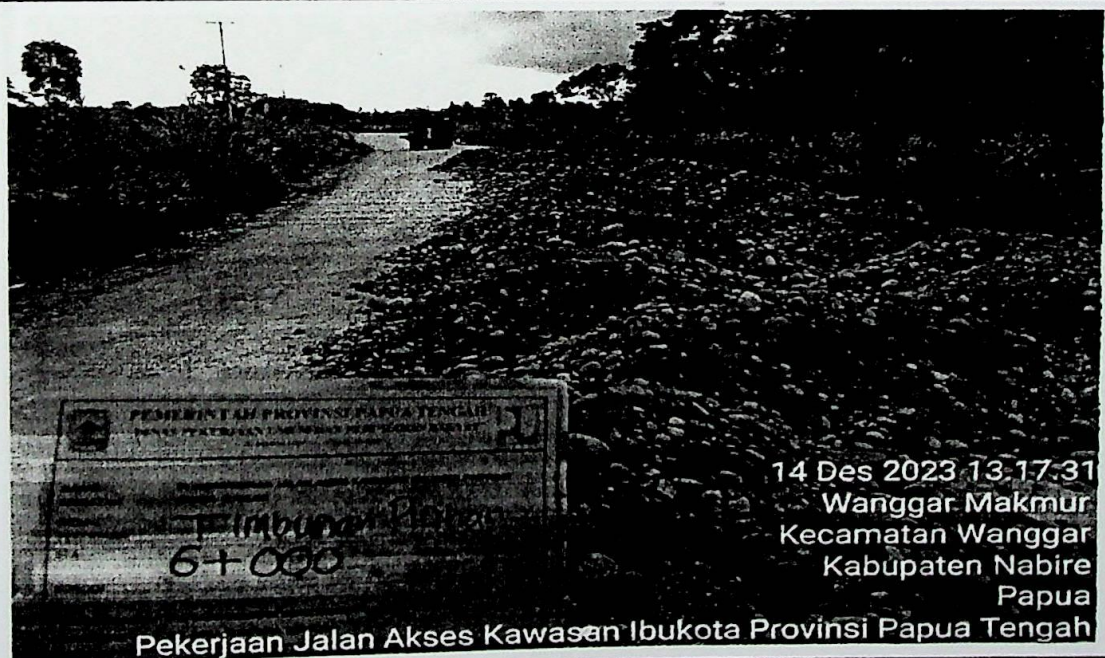


TIMBUNAN PILIHAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER

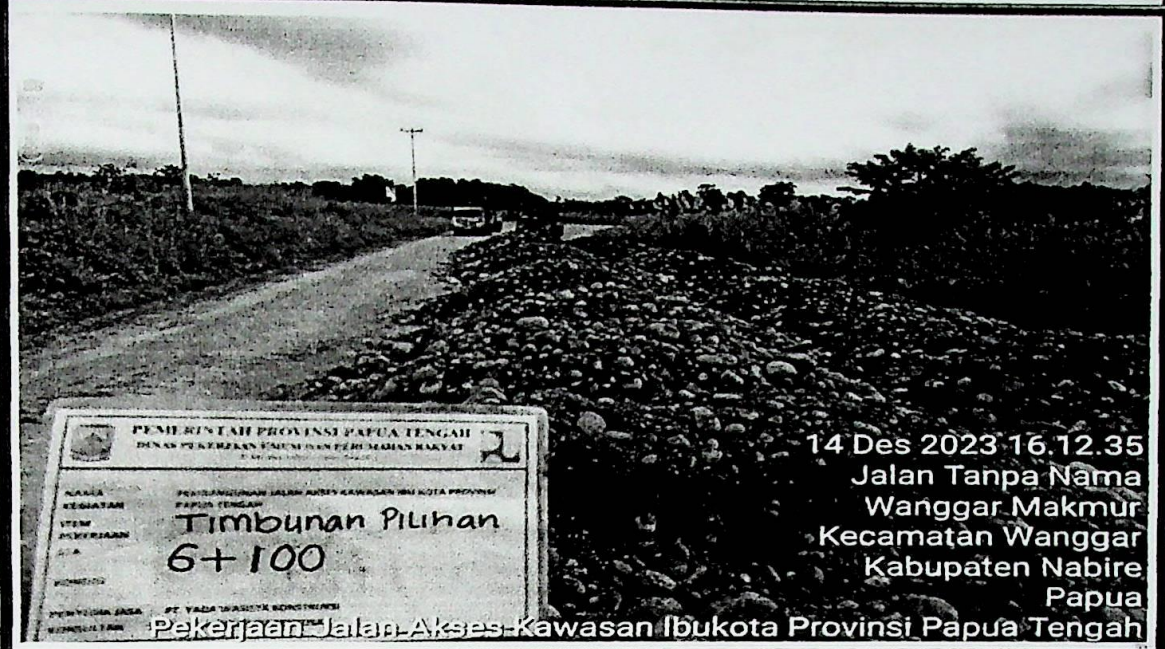

TIMBUNAN PILIHAN

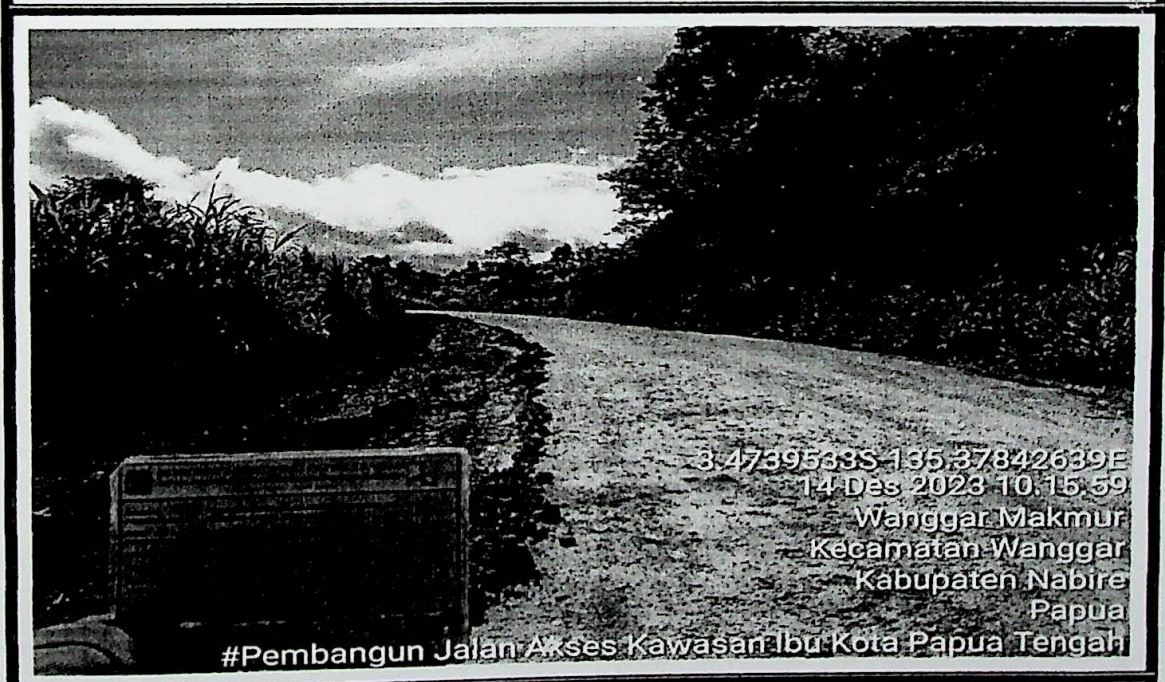

LAND CLEARING

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



LAND CLEARING




LAND CLEARING

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



TIMBUNAN BIASA

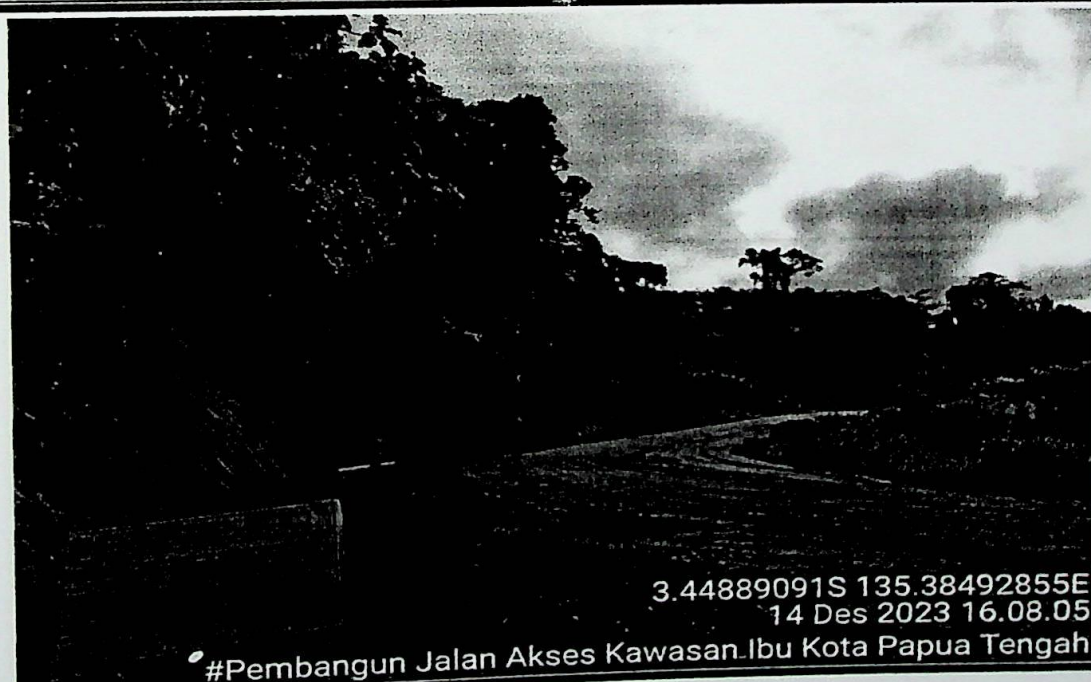

TIMBUNAN BIASA

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



GALIAN BIASA



TIMBUNAN BIASA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER




GALIAN & TIMBUNAN BIASA



GALIAN & TIMBUNAN BIASA

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER

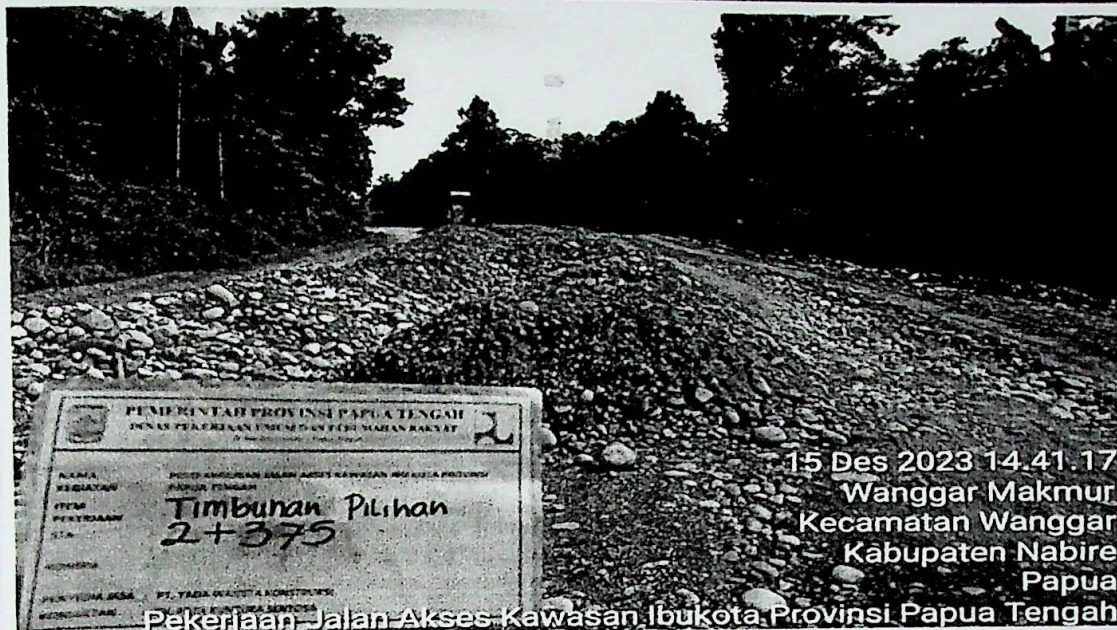


TIMBUNAN PILIHAN



TIMBUNAN PILIHAN

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER

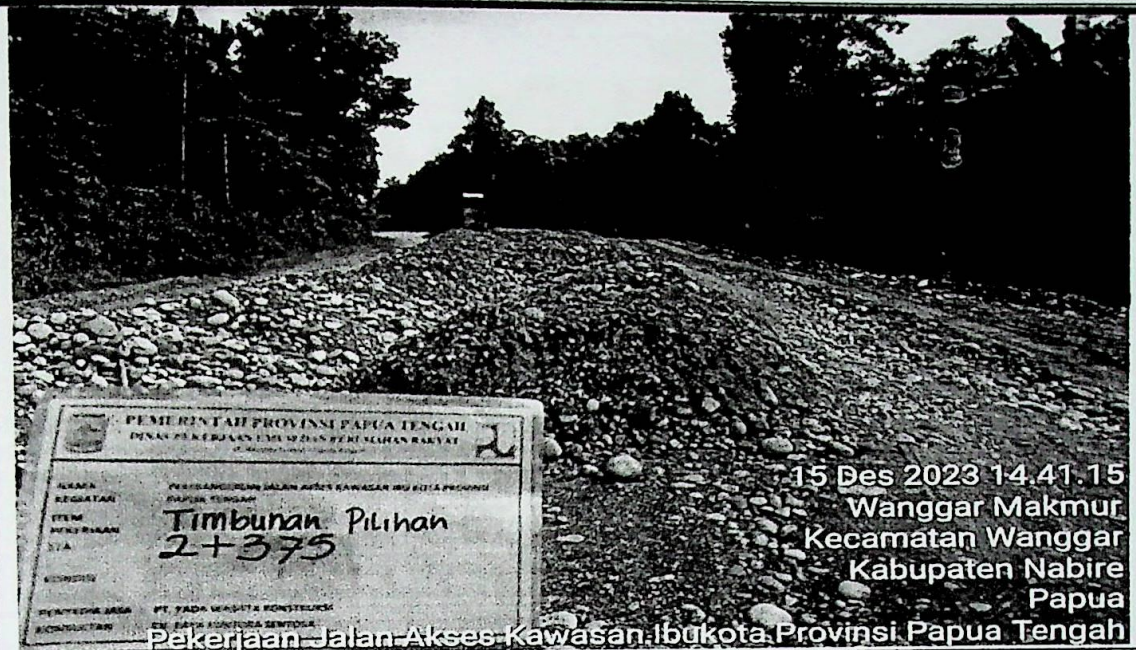


TIMBUNAN PILIHAN




GALIAN & TIMBUNAN BIASA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER

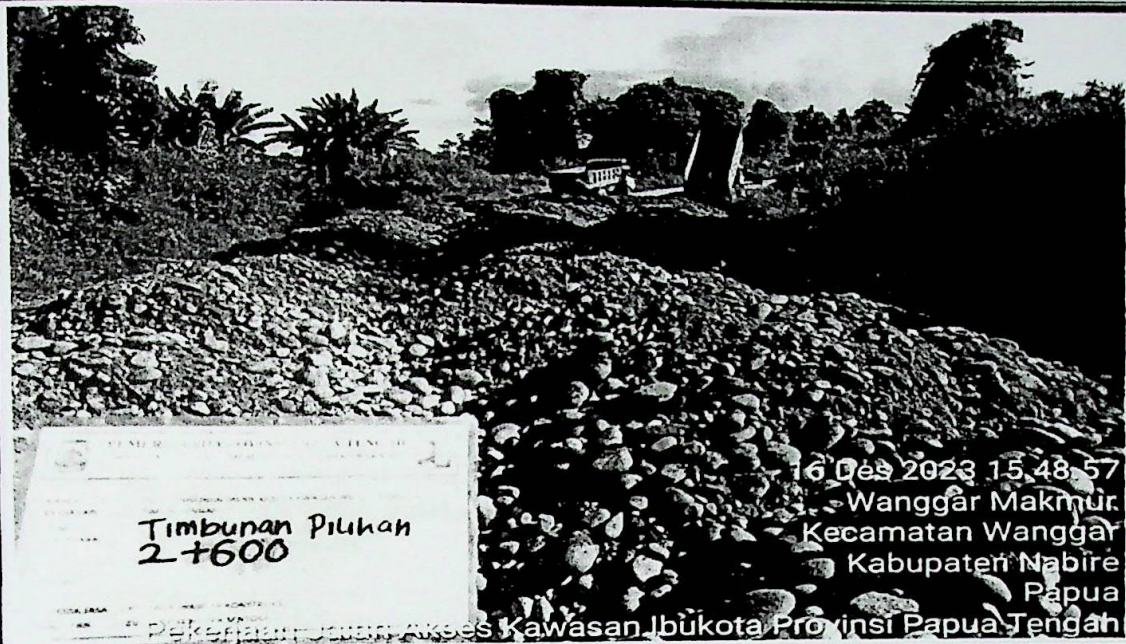


TIMBUNAN PILIHAN

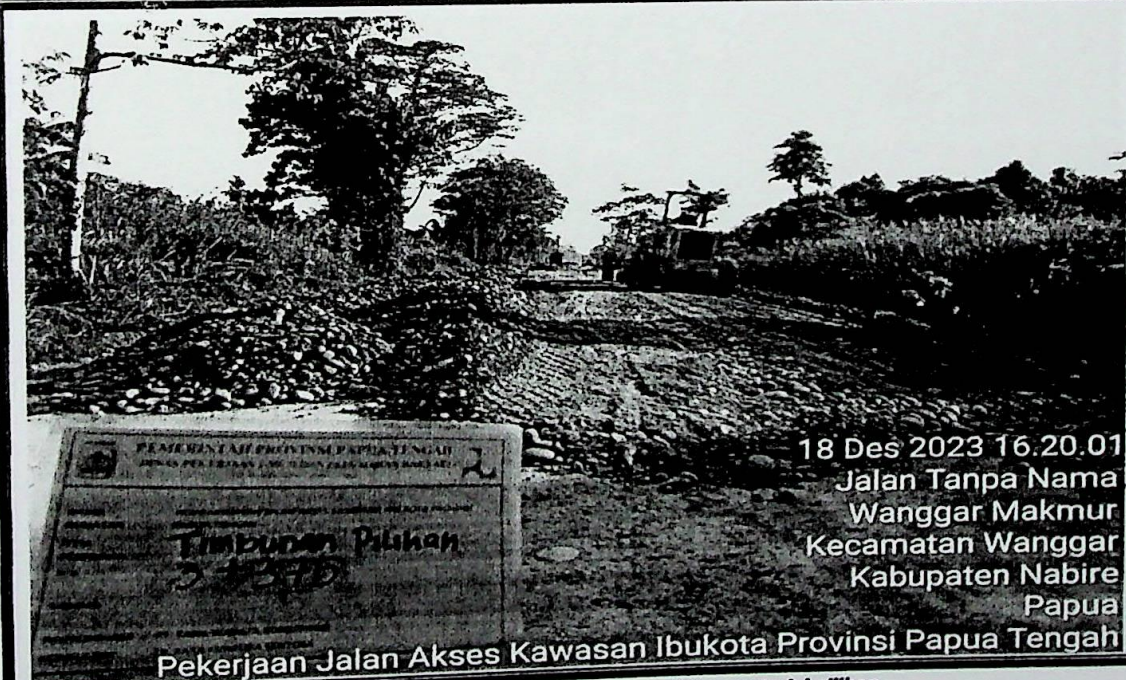

Pekerjaan penghamparan dan pemadatan material pilihan

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER

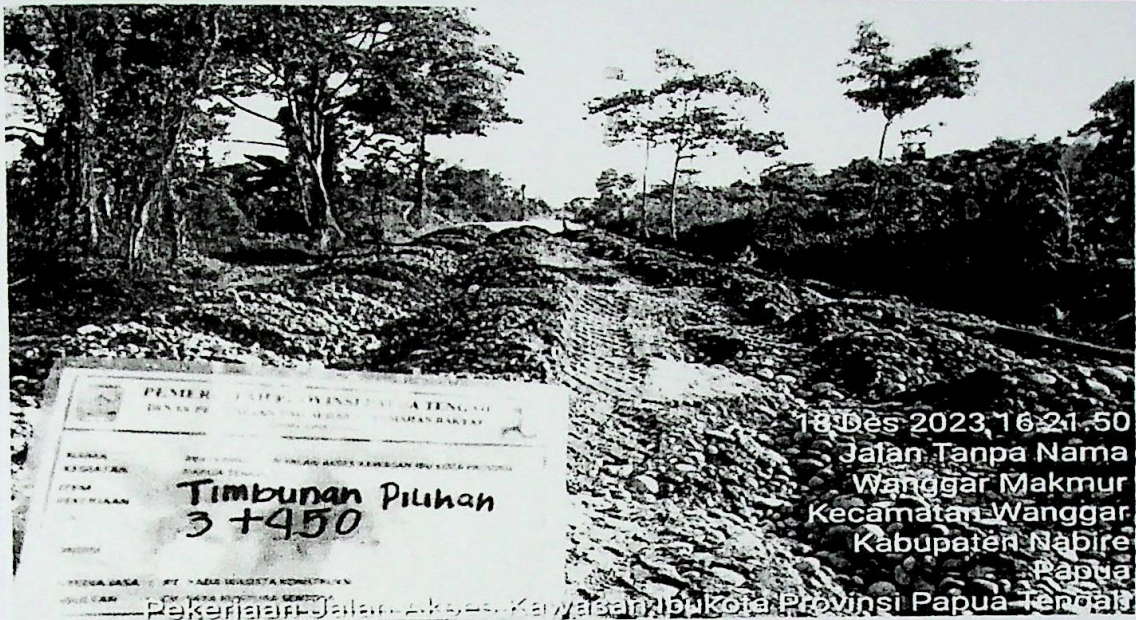

Pekerjaan penghamparan dan pematatan material pilihan



Pekerjaan penghamparan dan pematatan

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



19 Des 2023 12.29.58

#Pembangun Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Papua Tengah

GALIAN BIASA



3 44980957S 135.38312198E

19 Des 2023 09 29 13

#Pembangun Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Papua Tengah

Pekerjaan penghamparan dan pemadatan material pilihan

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



GALIAN SALURAN



Pekerjaan GALIAN BIASA


PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



3.45129549S 135.38264647E
21 Des 2023 08 32 25

#Pembangun Jalán Akses Kawasan Ibu Kota Papua Tengah

Pekerjaan GALIAN SALURAN

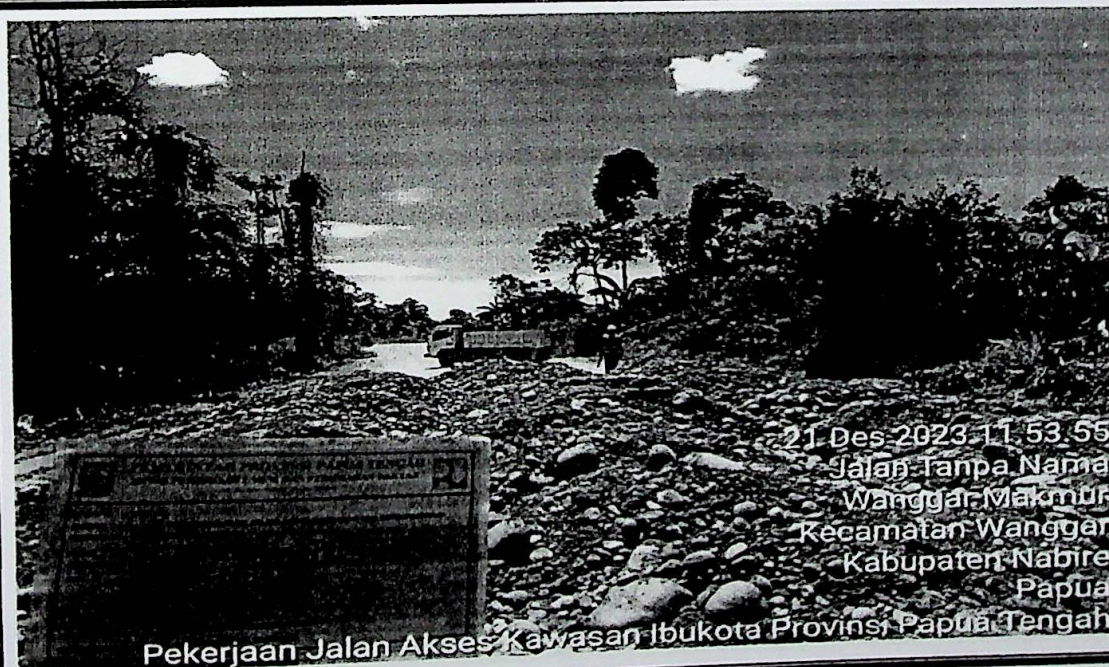

21 Des 2023 11 53 55
Jalan Tanpa Nama
Wanggar Makmur
Kecamatan Wanggar
Kabupaten Nabire
Papua

Pekerjaan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi Papua Tengah

Pekerjaan GALIAN BIASA

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



TIMBUNAN PILIHAN




TIMBUJIAN PILIHAN

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



GALIAN & TIMBUNAN BIASA

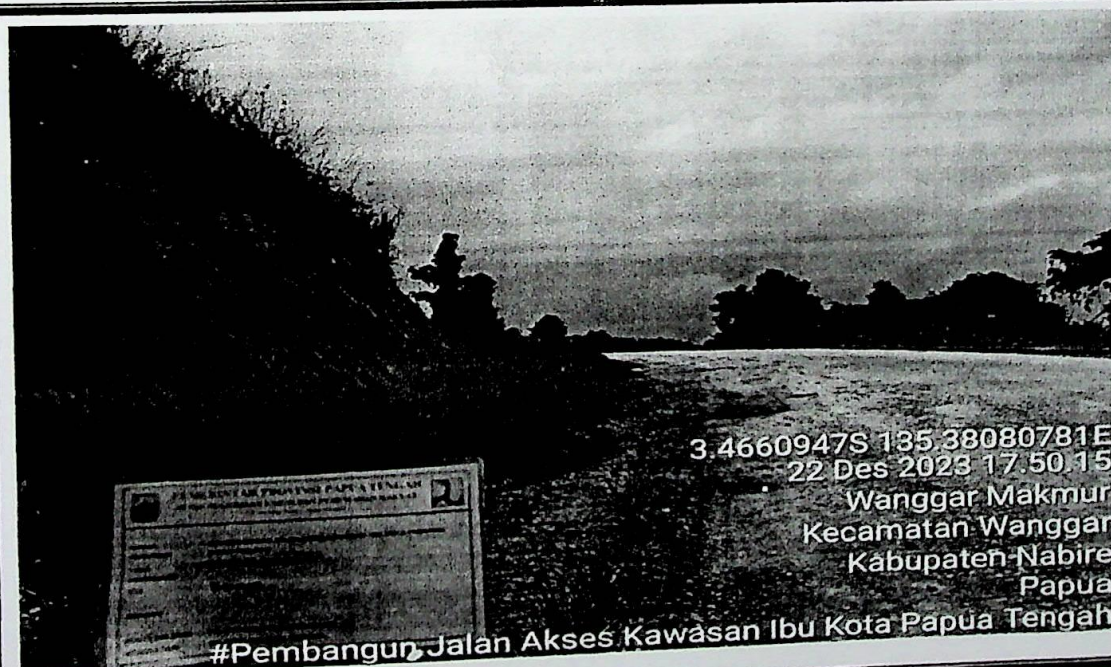


GALIAN & TIMBUNAN BIASA

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA
LOKASI	:	TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NILAI KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
	:	75 HARI KALENDER



TIMBUNAN PILIHAN

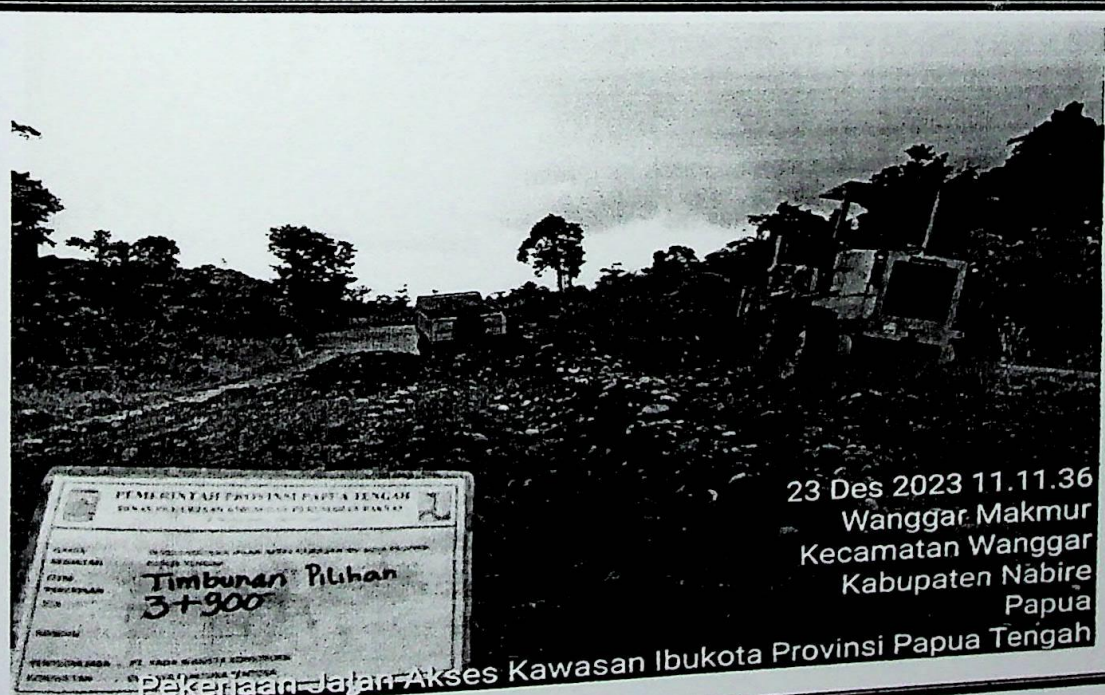

TIMBUNAN PILIHAN

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



PENYELESAIAN PEMALANGAN 10 DESEMBER – 14 DESEMBER

NOTULEN

PEMALANGAN LOKASI

- SATE NUS TELONGEN, MELAKU PEMILIK LAHAN CAHLI WAKU TANAH YANG DITEMPATI OLEH KAMP PEKERJA DARI PT. YADA WAKISTA, MELARANG ADANYA KERITATAN PROYEN PADA LOKASI TERSEBUT, SAMPAI DITELESAIKAN PEMBAYARAN TANAH OLEH PEMPROV PAPUA TENGAH.
- TANAH JATA BELUM DITELESAIKAN PEMBAYARAN DAN TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH BAPAK URBINAF.
- SATE HARPERAN AGAS DI SELESAIKAN DAN DIBAYARKAN SELESAI NYA, AGAS TERSEBUT JALAN BISA DILANJUTKAN.

A.N PEMILIK LAHAN

[Signature]

NUS TELONGEN



PENYELESAIAN PEMALANGAN 16 DESEMBER – 20 DESEMBER

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	:	75 HARI KALENDER



14 Dec 2023 at 13.43.50
3.464461, +135.382598

Kabupaten Nabire
Papua

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi Papua tengah.

PENYELESAIAN PEMALANGAN 10 DESEMBER – 14 DESEMBER



PENYELESAIAN PEMALANGAN 16 DESEMBER – 20 DESEMBER
