



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN PEKERJAAN

BOBOT 0% - 100%

PERIODE 25 OKTOBER 2023 S/D 24 DESEMBER 2023

KEGIATAN :

**PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR
TANAH DALAM DAERAH PROVINSI**

PEKERJAAN :

**Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air
Tanah di Wilayah Nabire 2**

KONSULTAN PENGAWAS



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAL DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN PEKERJAAN

BOBOT 0% - 100%

PERIODE 24 OKTOBER 2023 S/D 13 DESEMBER 2023

KEGIATAN :

**PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR
TANAH DALAM DAERAH PROVINSI**

PEKERJAAN :

**Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaro Makmur
1, Yaro Makmur 2, Yaro Makmur 4)**

LOKASI :

**Nabire II PAKET 10 (Wiraska, Yaro Makmur 1, Yaro Makmur 2, Yaro
Makmur 4)**

KONSULTAN PENGAWAS



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAL DISTRIK HERAM KOTA, JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023

TIME SCHEDULE (JADWAL PELAKSANAAN)

KEGIATAN
LOKASI

NO. KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2, Yaromakmur 4)

: PAKET 10 NABIRE 2

: 0003.3.2/67/SPK/S.BOR.PKT.10/PPK/ESDM/2023

: 24 Oktober 2023

: OTSUS/DTI TA 2023

: 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT	RENCANA DAN REALISASI	BERKONTRAK										RE/	
					OKTOBER	NOVEMBER			DESEMBER							
						II 30 - 5	III 6 - 12	IV 13 - 19	V 20 - 26	VI 27 - 3	VII 4 - 10	VIII 11 - 13				
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	43,00	8,35	RENCANA REALISASI	6,62 5,43	1,00										1,73 1,92
II	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	721,43	61,05	RENCANA REALISASI		19,49 21,98	19,49 21,98	17,72 12,21	4,35 4,88							
III	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	203,00	7,51	RENCANA REALISASI					62,60	7,51 7,51						
IV	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	2.850,60	19,99	RENCANA REALISASI						10,00 9,00	10,00 8,80					
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	106,84	3,10	RENCANA REALISASI												3,10 3,10
JUMLAH		3.924,87														
			Rencana		6,62	19,49	19,49	17,72	4,35	17,50	10,00	4,83				
			Rencana Kumulatif		6,62	26,11	45,60	63,32	67,67	85,18	95,17	100,00				
			Realisasi		5,43	22,98	21,98	12,21	7,08	16,51	8,80	5,02				
			Realisasi Kumulatif		5,43	28,41	50,39	62,60	69,68	86,19	94,98	100,00				
			Deviasi		-1,19	2,30	4,79	-0,72	2,01	1,01	-0,19	0,00				

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

KI ASINA YANSEMA
DIREKTRIS

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 - 2

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaro Makmur 1, Yaro Makmur 2,
Yaro Makmur 4)

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: 1 (satu)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
sesi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73			4,00	1,73	4,00	1,73
bilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73						
angan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85			2,00	0,93	2,00	0,93
Konstruksi									
leksi dan Promosi K3 terdiri atas:									
duk	BH	1,00	0,04			1,00	0,04	1,00	0,04
elindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63			6,00	0,63	6,00	0,63
lung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17			6,00	0,17	6,00	0,17
g tangan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04			6,00	0,04	6,00	0,04
tu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,75			6,00	1,75	6,00	1,75
ti keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42			6,00	0,42	6,00	0,42
PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
bersihan Lokasi Pengambilan	La	4,00	0,56						
eboran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66						
adatan/ perapihan dinding lubang bor	M	215,00	2,76						
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
ambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67						
lisis hasil Coring	Ttk	4,00	5,56						
lisa Hidrologi	ttk	4,00	2,78						
oran Akhir	La	1,00	1,39						
IN PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
IPA AW diameter 4"	M	215,00	6,27						
tem Plug	BH	4,00	0,06						
IN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
gurangan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49						
N PUMPING TES									
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65						
Pemulihan	Jam	24,00	1,65						
N PENYELESAIAN									
mbuatan Box Sumur	La	4,00	0,56						
IN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
R BAKU									
mpa Submersible Phase	Unit	4,00	6,8						
masangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71						
N TOWER TANDON AIR									
IN PERSIAPAN :									
mbersihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3						
lisan Tanah	M3	0,22	0,01						
ugan Tanah	M3	0,06	0						
AN BETON PONDASI TOWER									
of									
kerjaan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52						
mbuatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55						
ngcoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24						
ndasi Titik									
kerjaan Pembesian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22						
mbuatan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7						
ngcoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69						
AN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
esi Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49						
esi Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96						
lat manhole tebal 1 cm	M2	0,92	3,15						
ngkur Baut M16	Bh	64,00	0,44						
ngadaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39						
sa Peralatan dan Pengeelasan	Unit	4,00	4,17						
AN PENGECATAN RANGKA TOWER									
ngcatan Bewi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54						
AN LANTAI DUDUKAN TANDON									
ngadaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16						
AN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
emasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23						
ngadaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22						
AN PEMASANGAN KRAN UMUM									
AN PERSIAPAN									
Pembersihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03						
AN TANAH									
alisan tanah	M3	1,84	0,09						
Urugan Kembali	M3	1,44	0,02						
AN BETON									
Pekerjaan Pas bekisting	M2	15,68	0,64						
Pekerjaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62						
NGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
Stop Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08						
Kran Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04						
Pas Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46						
AN AKHIR									
ekerjaan Akhir	Ttk	4,00	1,11						
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				-	-	37,00	5,71	37,00	5,71
(B) Rencana (%)						43,00	8,36	43,00	8,36
Deviasi				0,00	0,00	-6,00	-2,66	-6,00	-2,66

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS
Inspector

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2
: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: II (DUA)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DUM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDAHULUAN									
el peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
lensi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
ngan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	2,00	0,93	2,00	0,93	4,00	1,85
onstruksi									
lesi dan Promosi K3 terdiri atas:									
k	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
ng mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
angan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
INGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
rihan Lokasi Pengeboran	La	4,00	0,56			4,00	0,56	4,00	0,56
oran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66			107,50	17,33	107,50	17,33
atau/ perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76			107,50	1,38	107,50	1,38
IN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
ambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67			2,00	0,84	2,00	0,84
is hasil Coring	Ttk	4,00	5,56			2,00	2,78	2,00	2,78
a Hidrologi	ttk	4,00	2,78			2,00	1,39	2,00	1,39
m Akhir	La	1,00	1,39			0,50	0,70	0,50	0,70
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
VC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	-	-	-	-	-	-
n Plug	BH	4,00	0,06			-	-	-	-
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
runan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	-	-	-	-	-	-
PUMPING TES									
ompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
mulihan	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
PENYELESAIAN									
ustan Box Sumur	La	4,00	0,56	-	-	-	-	-	-
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
a Submersible Phase	Unit	4,00	6,8	-	-	-	-	-	-
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71	-	-	-	-	-	-
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
erisihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3	-	-	-	-	-	-
n Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
m Tanah	M3	0,06	0	-	-	-	-	-	-
BETON PONDASI TOWER									
jaan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52	-	-	-	-	-	-
uatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	-	-	-	-	-	-
ecoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	-	-	-	-	-	-
asi Titik									
jaan Pembesian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	-	-	-	-	-	-
uatan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7	-	-	-	-	-	-
ecoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	-	-	-	-	-	-
IRANGKA DAN TANGGA TOWER									
Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	-	-	-	-	-	-
Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	-	-	-	-	-	-
manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	-	-	-	-	-	-
or Baut M16	Bh	64,00	0,44	-	-	-	-	-	-
adaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	-	-	-	-	-	-
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	-	-	-	-	-	-
PENGECATAN RANGKA TOWER									
ecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	-	-	-	-	-	-
LANTAI DUDUKAN TANDON									
adaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	-	-	-	-	-	-
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
angan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	-	-	-	-	-	-
adaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	-	-	-	-	-	-
PEMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
erisihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-
TANAH									
n tanah	M3	1,84	0,09	-	-	-	-	-	-
gan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
BETON									
jaan Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	-	-	-	-
jaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	-	-	-	-
IAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
p Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
n Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
AKHIR									
jaan Akhir	Ttk	4,00	1,11	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				37,00	5,71	227,50	26,40	264,50	32,10
(B) Rencana (%)				43,00	8,36	447,00	50,38	490,00	58,74
Deviasi				-6,00	-2,66	-219,50	-23,99	-225,50	-26,64

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 3 - 4

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaro Makmur 1, Yaro Makmur 2,
Yaro Makmur 4)

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTT TA 2023
: 2023

KEMAJUAN PEKERJAAN

MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: III (TIGA)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
ai peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
isi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
angan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
(konstruksi)									
sasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
k	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,33	6,00	0,33			6,00	0,33
ng mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
PENGEDORAN SUMUR EKSPLORASI									
rahan Lokasi Pengeboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
xoran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	107,50	17,83	107,50	17,83	215,00	35,66
atan/ perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	107,50	1,38	107,50	1,38	215,00	2,76
IN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
nihan Sample dan Analisis Sample	Tuk	4,00	1,67	2,00	0,84	2,00	0,84	4,00	1,67
in hasil Coring	Tuk	4,00	5,56	2,00	2,78	2,00	2,78	4,00	5,56
a Hidrologi	tuk	4,00	2,78	2,00	1,39	2,00	1,39	4,00	2,78
m Akhir	La	1,00	1,39	0,50	0,70	0,50	0,70	1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
VC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	-	-	-	-	-	-
n Plug	BH1	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
runjan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	-	-	-	-	-	-
PUMPING TES									
nompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
mulihan	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
PENYELESAIAN									
uatan Box Sumur	La	4,00	0,56	-	-	-	-	-	-
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
a Submersible Phase	Unit	4,00	6,8	-	-	-	-	-	-
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71	-	-	-	-	-	-
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
erisihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3	-	-	-	-	-	-
n Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
an Tanah	M3	0,06	0	-	-	-	-	-	-
BETON PONDASI TOWER									
jaan Pembeasan Sloof	Kg	168,80	0,52	-	-	-	-	-	-
uantan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	-	-	-	-	-	-
ecoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	-	-	-	-	-	-
asi Titik									
jaan Pembeasan Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	-	-	-	-	-	-
uantan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7	-	-	-	-	-	-
ecoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	-	-	-	-	-	-
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	-	-	-	-	-	-
Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	-	-	-	-	-	-
manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	-	-	-	-	-	-
ur Baut M16	Bh	64,00	0,44	-	-	-	-	-	-
adaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	-	-	-	-	-	-
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	-	-	-	-	-	-
PENGECATAN RANGKA TOWER									
ecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	-	-	-	-	-	-
LANTAI DUDUKAN TANDON									
adaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	-	-	-	-	-	-
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
asangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	-	-	-	-	-	-
adaan Profile Tank 220" L	bh	4,00	2,22	-	-	-	-	-	-
PEMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
berisihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-
TANAH									
an tanah	M3	1,84	0,09	-	-	-	-	-	-
gan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
BETON									
erajaan Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	-	-	-	-
erajaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	-	-	-	-
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
g Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
an Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
AKHIR									
erajaan Akhir	Tuk	4,00	1,11	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				264,50	32,10	221,50	24,91	486,00	57,01
(B) Rencana (%)				490,00	58,74	447,00	50,38	490,00	58,74
Deviasi				-225,50	-26,64	-225,50	-25,47	-4,00	-1,73

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

Dibuat Oleh
CV. ANDORAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS


: IV (EMPAT)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
1. Konstruksi									
Instalasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
Duk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
Kacamata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
Vest keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI									
Persiapan Lokasi Pengboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
Pengboran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66			215,00	35,66
Pengboran/perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76			215,00	2,76
ANALISA DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Tik	4,00	1,67	4,00	1,67			4,00	1,67
Analisa hasil Coning	Tik	4,00	5,56	4,00	5,56			4,00	5,56
Analisa Hidrologi	nk	4,00	2,78	4,00	2,78			4,00	2,78
Pengambilan Akhir	La	1,00	1,39	1,00	1,39			1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
PVC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	-	-	215,00	6,27	215,00	6,27
Penyambungan Plug	BH	4,00	0,06	-	-	4,00	0,06	4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
Pengisian dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	-	-	3,43	0,49	3,43	0,49
4. PUMPING TES									
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,65	-	-	-	-	-	-
5. PENYELESAIAN									
Persiapan Box Sumur	La	4,00	0,56	-	-	-	-	-	-
6. DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
7. BAKU									
Pengisian Submersible Phase	Unit	4,00	6,8	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	199,00	6,71	-	-	-	-	-	-
8. TOWER TANDON AIR									
9. PERSIAPAN									
Persiapan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3	-	-	-	-	-	-
Persiapan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
Persiapan Tanah	M3	0,06	0	-	-	-	-	-	-
10. BETON PONDASI TOWER									
11. PERSIAPAN									
Persiapan Pembebasan Sloof	Kg	168,80	0,52	-	-	-	-	-	-
Persiapan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	-	-	-	-	-	-
Persiapan Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	-	-	-	-	-	-
Persiapan Titik				-	-	-	-	-	-
Persiapan Pembebasan Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	-	-	-	-	-	-
Persiapan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7	-	-	-	-	-	-
Persiapan Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	-	-	-	-	-	-
12. RANGKA DAN TANGGA TOWER									
Persiapan Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	-	-	-	-	-	-
Persiapan Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	-	-	-	-	-	-
Persiapan manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	-	-	-	-	-	-
Persiapan Bant M16	Bh	64,00	0,44	-	-	-	-	-	-
Persiapan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	-	-	-	-	-	-
Persiapan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	-	-	-	-	-	-
13. PENGECATAN RANGKA TOWER									
Pengecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	-	-	-	-	-	-
14. LANTAI DUDUKAN TANDON									
Persiapan Papan Lantai Kayu Besi T=2 cm	M2	23,04	1,16	-	-	-	-	-	-
15. PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	-	-	-	-	-	-
Persiapan Profil Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	-	-	-	-	-	-
16. PEMASANGAN KRAN UMUM									
17. PERSIAPAN									
Persiapan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-
18. TANAH									
Persiapan tanah	M3	1,84	0,09	-	-	-	-	-	-
Persiapan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
19. BETON									
Persiapan Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	-	-	-	-
Persiapan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	-	-	-	-
20. PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
Persiapan Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
Persiapan Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Persiapan Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
21. AKHIR									
Persiapan Akhir	Tik	4,00	1,11	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				486,01	57,01	222,43	6,82	708,43	63,83
(B) Rencana (%)				490,00	58,74	222,43	6,82	712,43	65,56
Deviasi				-4,00	-1,73	0,00	0,00	-4,00	-1,73

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 5 - 6

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaro Makmur 1, Yaro Makmur 2,
Yaro Makmur 4)

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: V (LIMA)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPIA KONSULTAN


REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TINDAHULUAN									
testi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
testi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
angan Pipa dan Me-in untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
Konstruksi									
testi dan Promosi K3 terdiri atas:									
testi	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
ing mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
angan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
ENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI									
ruhan Lokasi Pengeloran	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
oran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66			215,00	35,66
atan/ perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76			215,00	2,76
IN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
mbilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67	4,00	1,67			4,00	1,67
u hasil Coring	Ttk	4,00	5,56	4,00	5,56			4,00	5,56
u Hidrologi	ttk	4,00	2,78	4,00	2,78			4,00	2,78
u Akhir	La	1,00	1,39	1,00	1,39			1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
VC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
i Plug	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
angan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
PUMPING TES									
ompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65			24,00	1,65	24,00	1,65
mulihan	Jam	24,00	1,65			24,00	1,65	24,00	1,65
PENYELESAIAN									
atan Box Sumur	La	4,00	0,56			4,00	0,56	4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSTIBLE									
AKU									
i Submersible Phase	Unit	4,00	6,8	-	-	4,00	6,80	4,00	6,80
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	199,00	0,71						
OWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
ruhan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3	-	-	100,00	0,30	100,00	0,30
Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01	0,22	0,01
i Tanah	M3	0,06	0	-	-	0,06	-	0,06	-
BETON PONDASI TOWER									
an Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52	-	-	168,80	0,52	168,80	0,52
atan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	-	-	13,44	0,55	13,44	0,55
oran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	-	-	3,52	1,24	3,52	1,24
u Titik				-	-				
an Pembesian Pondasi Tiuk	Kg	71,00	0,22	-	-	71,00	0,22	71,00	0,22
atan Bekisting Pondasi Tiuk	M2	17,28	0,7	-	-	17,28	0,70	17,28	0,70
oran Beton Pondasi Tiuk K-175	M3	4,64	1,69	-	-	4,64	1,69	4,64	1,69
LANGKA DAN TANGGA TOWER									
iku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	-	-				
iku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	-	-				
nhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	-	-				
r Baut M16	Bh	64,00	0,44	-	-				
aan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	-	-				
rakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	-	-				
PENGECATAN RANGKA TOWER									
atan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,51	-	-				
JANTAI DUDUKAN TANDON									
aan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	-	-				
ERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
angan Pipe PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	-	-				
aan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	-	-				
EMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
ruhan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,03	-	-				
TANAH									
tanah	M3	1,84	0,09	-	-				
u Kembali	M3	1,44	0,02	-	-				
BETON									
an Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-				
an Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-				
PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
rant 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-				
ur PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-				
an PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-				
KHIR									
an Akhir	Ttk	4,00	1,11	-	-				
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				708,43	63,83	434,96	15,89	1.143,39	79,72
(B) Rencana (%)				712,43	65,56	629,32	14,91	1.346,39	82,16
Deviasi				-4,00	-1,73	-194,36	0,98	-203,00	-2,44

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPIA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTT TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: VI (ENAM)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDAHULUAN									
el peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
lasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
ngan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
onstruksi									
asi dan Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
g mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
angan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
epelamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
NGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
ahan Lokasi Pengboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
oran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66			215,00	35,66
stan/ perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76			215,00	2,76
N DAN ANALISA SAMPUL TANAH									
ambilan Sample dan Analisis Sample	Tik	4,00	1,67	4,00	1,67			4,00	1,67
a hasil Corong	Tik	4,00	5,56	4,00	5,56			4,00	5,56
idrologi	tk	4,00	2,78	4,00	2,78			4,00	2,78
n Akhir	La	1,00	1,39	1,00	1,39			1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
VC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
Plug	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
angan dmding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
PUMPING TES									
ompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
mulihan	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
PENYELESAIAN									
etan Box Sumur	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIB' E									
AKU									
a Submersible Phase	Unit	4,00	6,80	4,00	6,80			4,00	6,80
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71			199,00	0,71	199,00	0,71
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
ersihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,30	100,00	0,30			100,00	0,30
y Tanah	M3	0,22	0,01	0,22	0,01			0,22	0,01
n Tanah	M3	0,06	0	0,06	-			0,06	-
BETON PONDASI TOWER									
aan Pembeian Sloof	Kg	168,80	0,52	168,80	0,52			168,80	0,52
uatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	13,44	0,55			13,44	0,55
coran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	3,52	1,24			3,52	1,24
asi Titik									
aan Pembeian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22			71,00	0,22	71,00	0,22
uatan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7			17,28	0,70	17,28	0,70
coran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69			4,64	1,69	4,64	1,69
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
Siku 50/50 5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49			1.958,88	3,49	1.958,88	3,49
Siku 40/40 4 (Pagur)	Kg	352,80	0,96	-	-	352,80	0,96	352,80	0,96
nanhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	-	-	0,92	0,15	0,92	0,15
ur Baut M16	Bh	64,00	0,44	-	-	64,00	0,44	64,00	0,44
adaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	-	-	4,00	1,39	4,00	1,39
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	-	-	4,00	4,17	4,00	4,17
PENGECATAN RANGKA TOWER									
ecatan Basi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	-	-	-	-	-	-
LANTAI DUDUKAN TANDON									
adaan Papan Lantai Kayu Basi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	-	-	-	-	-	-
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
angan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	-	-	-	-	-	-
adaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	-	-	-	-	-	-
PEMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
bersihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-
TANAH									
n tanah	M3	1,84	0,09	-	-	-	-	-	-
gan Kembeli	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
BETON									
njaan Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	-	-	-	-
njaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	-	-	-	-
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
n Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
AKHIR									
njaan Akhir	Tik	4,00	1,11	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				1.050,47	77,11	2.676,52	13,92	3.726,99	91,03
(B) Rencana (%)				1.253,47	79,55	2.477,52	13,21	3.730,99	92,76
Deviasi				-203,00	-2,44	199,00	0,71	-4,00	-1,73

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN


SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 7 - 8

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaro Makmur 1, Yaro Makmur 2,
Yaro Makmur 4)

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN

MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: VII (TUJUH)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLA MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDAHULUAN									
si peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
si peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-				
angan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur te masuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
onstruksi									
asi dan Promosi K3 terdiri atas:									
k	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
ng mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
angan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
ENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
rihan Lokasi Pengeboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56	-	-	4,00	0,56
oran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66	-	-	215,00	35,66
atan/ perapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76	-	-	215,00	2,76
IN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
ambilan Simple dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67	4,00	1,67	-	-	4,00	1,67
ia hasil Coring	Ttk	4,00	5,56	4,00	5,56	-	-	4,00	5,56
a Hidrologi	ttk	4,00	2,78	4,00	2,78	-	-	4,00	2,78
an Akhir	La	1,00	1,39	1,00	1,39	-	-	1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
VC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
n Plug	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
angan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
PUMPING TES									
ompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
mulihan	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
PENYELESAIAN									
utan Box Sumur	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
a Submersible Phase	Unit	4,00	6,80	4,00	6,80	-	-	4,00	6,80
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	199,00	0,71	199,00	0,71	-	-	199,00	0,71
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
erubahan Lokasi Tower	M2	100,00	0,30	100,00	0,30	-	-	100,00	0,30
n Tanah	M3	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01
an Tanah	M3	0,06	0	0,06	-	-	-	0,06	-
BETON PONDASI TOWER									
aan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52	168,80	0,52	-	-	168,80	0,52
uatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	13,44	0,55	-	-	13,44	0,55
ooran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	3,52	1,24	-	-	3,52	1,24
asi Titik									
aan Pembesian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	71,00	0,22			71,00	0,22
uatan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,70	17,28	0,70			17,28	0,70
ooran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	4,64	1,69			4,64	1,69
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	1958,88	3,49			1958,88	3,

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

Dibuat Oleh
CV. ANGGRAH PAPUA KONSULTAN



SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1, Yaromakmur 2,
: PAKET 10 NABIRE 2

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/D/11 TA 2023
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: VIII (DELAPAN)
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN


URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
isi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
isi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,73	-	-	4,00	1,73	4,00	1,73
ngin Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
Konstruksi									
asi dan Promosi K3 terdiri atas:									
ak	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
indung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
ing mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
angan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
PENGEBORAN SUMUR EKSPLOASI									
lahan Lokasi Pengboran	LS	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
boran segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66			215,00	35,66
latan/ perupian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76			215,00	2,76
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
ambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67	4,00	1,67			4,00	1,67
isi hasil Coring	Ttk	4,00	5,56	4,00	5,56			4,00	5,56
isi Hidrologi	ttk	4,00	2,78	4,00	2,78			4,00	2,78
an Akhir	LS	1,00	1,39	1,00	1,39			1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
PVC AW diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
m Plug	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
urungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
PUMPING TES									
omompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
emulihan	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
PENYELESAIAN									
buatan Box Sumur	LS	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
pa Submersible Phase	Unit	4,00	6,8	4,00	6,80			4,00	6,80
asangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	199,00	0,71	199,00	0,71			199,00	0,71
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
bersihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,3	100,00	0,30			100,00	0,30
an Tanah	M3	0,22	0,01	0,22	0,01			0,22	0,01
gan Tanah	M3	0,06	0	0,06	-			0,06	-
ETON PONDASI TOWER									
if									
erajaan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52	168,80	0,52			168,80	0,52
buatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	13,44	0,55			13,44	0,55
gecoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	3,52	1,24			3,52	1,24
dasi Titik									
erajaan Pembesian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	71,00	0,22			71,00	0,22
buatan Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7	17,28	0,70			17,28	0,70
gecoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	4,64	1,69			4,64	1,69
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
i Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	1.353,88	3,49			1958,88	3,49
i Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	352,80	0,96			352,80	0,96
manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	0,92	0,15			0,92	0,15
kur Baut M16	Bh	64,00	0,44	64,00	0,44			64,00	0,44
gadaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	4,00	1,39			4,00	1,39
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	4,00	4,17			4,00	4,17
PENGECATAN RANGKA TOWER									
gecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	28,00	0,54			28,00	0,54
N LANTAI DUDUKAN TANDON									
gadaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	23,04	1,16			23,04	1,16
N PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
masangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	32,00	0,23			32,00	0,23
ngadaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	4,00	2,22			4,00	2,22
N PEMASANGAN KRAN UMUM									
N PERSIAPAN									
mbersihan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	10,00	0,03
N TANAH									
ilan tanah	M3	1,84	0,09	-	-	1,84	0,09	1,84	0,09
rgan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	1,44	0,02	1,44	0,02
N BETON									
kerjaan Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	15,63	0,64	15,68	0,64
kerjaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	1,88	0,62	1,88	0,62
IGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
op Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	4,00	0,08	4,00	0,08
ran Air PVC Ø 3/4"	bh	4,00	0,04	-	-	4,00	0,04	4,00	0,04
is Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	64,00	0,46	64,00	0,46
N AKHIR									
kerjaan Akhir	Ttk	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	4,00	1,11
J U M L A H		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				3.814,03	95,18	110,84	4,82	3.924,87	100,00
(B) Rencana (%)				3.818,03	96,91	110,84	4,82	3.924,87	100,00
Deviasi				-4,00	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN BULANAN

OKTOBER

2023

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zon
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1
: PAKET 10 NABIRE 2
: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN BULANAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


BULAN
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: OKTOBER
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUCRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN


URAIAN PEKERJAAN	S/TUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
				BULAN LALU		DALAM BULAN INI		S/D BULAN INI	
		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
eralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team personil	Kali	4,00	1,73			4,00	1,73	4,00	1,73
il peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team	Kali	4,00	1,73						
n Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Kali	4,00	1,85			2,00	0,93	2,00	0,93
trukel									
dan Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04			1,00	0,04	1,00	0,04
ung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63			6,00	0,63	6,00	0,63
ata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17			6,00	0,17	6,00	0,17
an (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04			6,00	0,04	6,00	0,04
elamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and to i cap)	Psg	6,00	1,75			6,00	1,75	6,00	1,75
elamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,42			6,00	0,42	6,00	0,42
PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
n Lokasi Pengeboran	La	4,00	0,56						
a segala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66						
/ persiapan dinding lubang bor	M	215,00	2,76						
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
an Sample dan Analisis Sample	Tuk	4,00	1,67						
uil Coring	Tuk	4,00	5,56						
drologi	tk	4,00	2,78						
khur	La	1,00	1,39						
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
AW diameter 4"	M	215,00	6,27						
ug	BH	4,00	0,06						
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
an dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Pak tertentu	M3	3,43	0,49						
PUMPING TES									
npaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65						
ihan	Jam	24,00	1,65						
PENYELESAIAN									
n Box Sumur	La	4,00	0,56						
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
mersible Phase	Unit	4,00	6,8						
an Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71						
TOWER TANDON AJR									
PERSIAPAN :									
an Lokasi Tower	M2	100,00	0,3						
nah	M3	0,22	0,01						
nah	M3	0,06	0						
BETON PONDASI TOWER									
Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,52						
n Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55						
an Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24						
duk									
Pembesian Pond usi Titik	Kg	71,00	0,22						
n Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,7						
an Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69						
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
50.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49						
40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96						
sole tebal 1 cm	M2	0,92	0,15						
laut M16	Bh	64,00	0,44						
n Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39						
kitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17						
PENGEKATAN RANGKA TOWER									
an Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54						
LANTAI DUDUKAN TANDON									
n Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16						
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
an Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23						
n Profile Tink 2200 L	bh	4,00	2,22						
PEMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
ihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03						
TANAH									
nah	M3	1,84	0,09						
Kembali	M3	1,44	0,02						
BETON									
n Pas bekisting	M2	15,68	0,64						
n Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,62						
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
ut 3/4"	Bh	4,00	0,08						
PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04						
PVC 3/4"	M	64,00	0,46						
AKHIR									
Akhir	Tuk	4,00	1,11						
JUMLAH		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				-	-	37,00	5,71	37,00	5,71
(B) Rencana (%)						43,00	8,36	43,00	8,36
Deviasi				0,00	0,00	-6,00	-2,66	-6,00	-2,66

Disetujui Oleh :
EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUCRAH PAPUA KONSULTAN



SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN BULANAN

NOVEMBER

2023

: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

KEMAJUAN PEKERIAAN

BULAN
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: NOVEMBER
: 24 Oktober s/d 13 Desember
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	BULAN LALU		DALAM BULAN INI		S/D BULAN INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DAHULUAN									
Koran bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team personil	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
Peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team	Kali	4,00	1,73	-	-				
Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk ukur	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
Headset (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
Kacamata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
Gloves (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
Sepatu (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
Vest (Safety Vest)	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
NGEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
Lokasi pengeboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56	-	-	4,00	0,56
Spesifikasi Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66	-	-	215,00	35,66
Gradien dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76	-	-	215,00	2,76
UJI DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,67	4,00	1,67		-	4,00	1,67
Coring	Ttk	4,00	5,56	4,00	5,56		-	4,00	5,56
Logi	tk	4,00	2,78	4,00	2,78		-	4,00	2,78
Logi	La	1,00	1,39	1,00	1,39		-	1,00	1,39
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
Pipa diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
Isi dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
UMPING TES									
Uji bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65			24,00	1,65	24,00	1,65
Uji	Jam	24,00	1,65			24,00	1,65	24,00	1,65
ENYELESAIAN									
Box Sumur	La	4,00	0,56			4,00	0,56	4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
AKU									
Submersible Phase	Unit	4,00	6,80	-	-	4,00	6,80	4,00	6,80
Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	199,00	0,71						
DOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
1. Lokasi Tower	M2	100,00	0,30	-	-	100,00	0,30	100,00	0,30
2.	M3	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01	0,22	0,01
3.	M3	0,06	0	-	-	0,06	-	0,06	-
BETON PONDASI TOWER									
1. Besi Siku Sloof	Kg	168,80	0,52	-	-	168,80	0,52	168,80	0,52
2. Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	-	-	13,44	0,55	13,44	0,55
3. Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	-	-	3,52	1,24	3,52	1,24
4.									
1. Besi Siku Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	-	-	71,00	0,22	71,00	0,22
2. Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,70	-	-	17,28	0,70	17,28	0,70
3. Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	-	-	4,64	1,69	4,64	1,69
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
1. 3.50.3 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49</						

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH | PAPIA KONSULTAN



SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

LAPORAN BULANAN

DESEMBER

2023

				LAPORAN BULANAN					
: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zon Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wiraska, Yaromakmur 1 : PAKET 10 NABIRE 2 : 24 Oktober 2023 : OTSUS/DTI TA 2023 : 2023				KEMAJUAN PEKERJAAN					
				BULAN PERIODE KONSULTAN PENGAWAS		: DESEMBER : 24 Oktober s/d 13 Desember : CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN			
REKAPITULASI LAPORAN BULANAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	BULAN LALU		DALAM BULAN INI		S/D BULAN INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DAHULUAN									
atan bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team personil	Kali	4,00	1,73	4,00	1,73			4,00	1,73
alatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu nya serta team	Kali	4,00	1,73	-	-	4,00	1,73	4,00	1,73
pa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Kali	4,00	1,85	4,00	1,85			4,00	1,85
kel									
n Promosi K3 terdiri atas:									
(Safety Helmet)	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
(Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,63	6,00	0,63			6,00	0,63
(Safety Gloves)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
utan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
utan (Safety Vest)	Psg	6,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
	BH	6,00	0,42	6,00	0,42			6,00	0,42
GEBORAN SUMUR EKSPLORASI									
okasi pengeboran	La	4,00	0,56	4,00	0,56	-	-	4,00	0,56
gala Formasi diameter 4"	M	215,00	35,66	215,00	35,66	-	-	215,00	35,66
rapian dinding lubang bor	M	215,00	2,76	215,00	2,76	-	-	215,00	2,76
DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
Sample dan Analisis Sample	Tuk	4,00	1,67	4,00	1,67			4,00	1,67
Coring	Tuk	4,00	5,56	4,00	5,56			4,00	5,56
logi	tk	4,00	2,78	4,00	2,78			4,00	2,78
r	La	1,00	1,39	1,00	1,39			1,00	1,39
IPA KONSTRUKSI SUMUR									
V diameter 4"	M	215,00	6,27	215,00	6,27			215,00	6,27
	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
IAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,49	3,43	0,49			3,43	0,49
JMPING TES									
an bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
n	Jam	24,00	1,65	24,00	1,65			24,00	1,65
ENYELESAIAN									
lox Sumur	La	4,00	0,56	4,00	0,56			4,00	0,56
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
UKU									
ersible Phase	Unit	4,00	6,80	4,00	6,80	-	-	4,00	6,80
Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	199,00	0,71	199,00	0,71	-	-	199,00	0,71
OWER TANDON AIR:									
ERSIAPAN									
Lokasi Tower	M2	100,00	0,30	100,00	0,30	-	-	100,00	0,30
h	M3	0,22	0,01	0,12	0,01	-	-	0,22	0,01
h	M3	0,06	0	0,06	-	-	-	0,06	-
ETON PONDASI TOWER									
embesian Sloof	Kg	168,80	0,52	168,80	0,52	-	-	168,80	0,52
Bekisting Sloof	M2	13,44	0,55	13,44	0,55	-	-	13,44	0,55
Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,24	3,52	1,24	-	-	3,52	1,24
k									
embesian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	71,00	0,22			71,00	0,22
Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,70	17,28	0,70			17,28	0,70
Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,69	4,64	1,69			4,64	1,69
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
0.50.5 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,49	1 958,88	3,49			1958,88	3,49
0.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	0,96	352,80	0,96			352,80	0,96
le tebal 1 cm	M2	0,92	0,15	0,92	0,15			0,92	0,15
st M16	Bh	64,00	0,44	64,00	0,44			64,00	0,44
Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,39	4,00	1,39			4,00	1,39
an dan Pengelasan	Unit	4,00	4,17	4,00	4,17			4,00	4,17
PENGECATAN RANGKA TOWER									
Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,54	28,00	0,54			28,00	0,54
LANTAI DUDUKAN TANDON									
Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,16	23,04	1,16			23,04	1,16
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
n Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,23	32,00	0,23			32,00	0,23
Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,22	4,00	2,22			4,00	2,22
PEMASANGAN KRAN UMUM									
PERSIAPAN									
an Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	10,00	0,03
TANAH									
h	M3	1,84	0,09	-	-	1,84	0,09	1,84	0,09
embali	M3	1,44	0,02	-	-	1,44	0,02	1,44	0,02
BETON									
Pas bekisting	M2	15,68	0,64	-	-	15,68	0,64	15,68	0,64
Cor Blok Beton Kran Air	M3	1,88	0,62	-	-	1,88	0,62	1,88	0,62
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	4,00	0,08	4,00	0,08
PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	4,00	0,04	4,00	0,04
PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	64,00	0,46	64,00	0,46
AKHIR									
Akhir	Tuk	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	4,00	1,11
J U M L A H		3.924,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				3.814,03	95,18	110,84	4,82	3.924,87	100,00
(B) Rencana (%)				3.818,03	96,91	110,84	4,82	3.924,87	100,00
Deviasi				-4,00	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Disetujui Oleh :
JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002


Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN SUMUR EKSPLORASI DI KABUPATEN NABIRE
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023


KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
 KABUPATEN : NABIRE
 LOKASI : Jayamukti, Yaro makmur, Malompo, dan Ororodo




Progeress 10 %




PROGRES 15 %

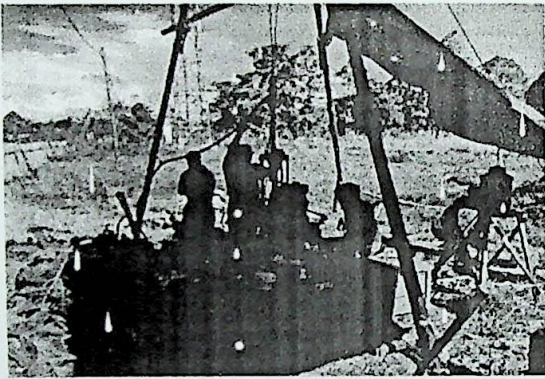


PROGRES 35 %

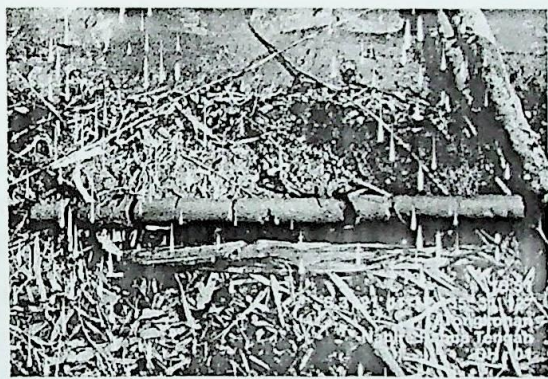

PROGRES 48 %

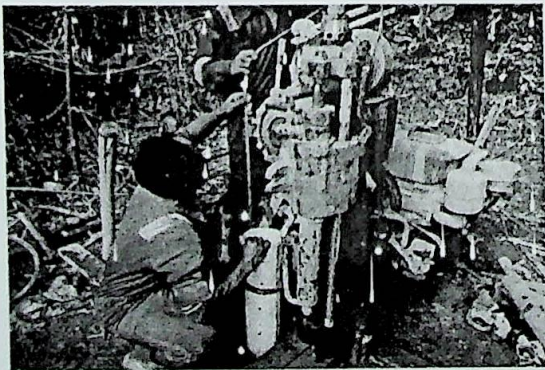

PROGRES 85 %

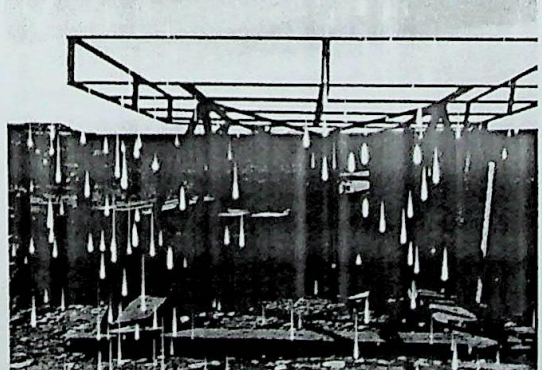

PROGRES 100 %



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN PEKERJAAN

BOBOT 0% - 100%

PERIODE 24 OKTOBER 2023 S/D 13 DESEMBER 2023

KEGIATAN :

**PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR
TANAH DALAM DAERAH PROVINSI**

PEKERJAAN :

**Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaro Makmur 3,
Ororodo, Jaya Mukti, Simbokeri)**

LOKASI :

Nabire II PAKET 11 (Yaro Makmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, Simbokeri)

KONSULTAN PENGAWAS



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023


TIME SCHEDULE (JADWAL PELAKSANAAN)

KEGIATAN LOKASI		: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, Simbokeri)													
		: PAKET 11 NABIRE 2													
NO. KONTRAK		: 000.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023													
TANGGAL KONTRAK		: 24 Oktober 2023													
SUMBER DANA		: OTSUS/DTI TA 2023													
TAHUN ANGGARAN		: 2023													
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT %	RENCANA DAN REALISASI	BERKONTRAK										REAL
					OKTOBER		NOVEMBER				DESEMBER				
					I 24 - 29	II 30 - 5	III 6 - 12	IV 13 - 19	V 20 - 26	VI 27 - 3	VII 4 - 10	VIII 11 - 13			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	43,00	8,63	RENCANA REALISASI	6,84 5,61	1,04	-	-	-	-	-	-	-	94,32 1,98	100,00
II	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	676,43	59,83	RENCANA REALISASI	- 18,75 21,54	18,75 21,54	17,84 11,97	4,49 4,79	- - -88,5	-	-	-	-	-	-
III	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA AIR BAKU	188,00	7,70	RENCANA REALISASI	- -	- -	- 49,72	- -	- -	7,70 7,70	-	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	2.850,60	20,64	RENCANA REALISASI	- -	- 28,18	- -	- -	2,27 -	10,32 9,29	10,32 9,08	-	-	-	-
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	106,84	3,20	RENCANA REALISASI	- 5,61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,20 3,20	-
JUMLAH:		3.864,87	100,00		6,84	18,75	18,75	17,84	4,49	18,02	10,32	4,99	-	-	-
			Rencana		6,84	25,59	44,34	62,18	66,67	84,69	95,01	100,00	-	-	-
			Rencana Kumulatif		6,84	22,57	21,54	11,97	7,06	16,99	9,08	5,18	-	-	-
			Realisasi		5,61	28,18	49,72	61,69	68,75	85,73	94,82	100,00	-	-	-
			Realisasi Kumulatif		5,61								-	-	-
			Deviasi		-1,23	2,59	5,38	-0,49	2,08	1,04	-0,19	0,00	-	-	-

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN


KLASINA YANSEMA
DIREKTRIS

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 - 2

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Yaro Makmur 3, Ororodo, Jaya Mukti,
Simbokeri)

AK
AN

Perubahan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S
PAKET 11 NABIRE 2
000.3.2/65/SPK/5.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023
24 Oktober 2023
OTSUS/DIT TA 2023
2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

1 (satu)
24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AN PENDAHULUAN									
alat peralatan bor 1 (set) unit dan alat bantu nya serta team personal dari	Kali	4,00	1,79	-	-	-	4,00	1,79	4,00
mesin peralatan bor 1 (set) unit dan alat bantu nya serta team personal dari	Kali	4,00	1,79	-	-	-	-	-	-
pipa dan mesin untuk pemasangan sumur termasuk Konstruksi	Kali	4,00	1,91	-	-	-	2,00	0,96	2,00
Besi dan Promosi K3 terdiri atas:									
helm	BH	1,00	0,04	-	-	-	1,00	0,04	1,00
gantung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,65	-	-	-	6,00	0,65	6,00
gantung (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	-	-	-	6,00	0,17	6,00
gantung (Safety Shoes)	Peg	6,00	0,04	-	-	-	6,00	0,04	6,00
gantung (Safety Shoes, rubber safety shoes and too cap)	Peg	6,00	1,81	-	-	-	6,00	1,81	6,00
gantung (Safety Vest)	BH	6,00	0,43	-	-	-	6,00	0,43	6,00
AN PENGEDORAN SUMUR EKSPLOKASI									
gantung Lokasi Pengboran	La	4,00	0,57	-	-	-	-	-	-
boran segala Formasi diameter 4"	M	200,00	34,27	-	-	-	-	-	-
batas/ perapuan dinding lubang bor	M	200,00	2,65	-	-	-	-	-	-
BILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
gantung Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,72	-	-	-	-	-	-
sis hasil Coring	Ttk	4,00	5,74	-	-	-	-	-	-
sis Hidrologi	tkk	4,00	2,87	-	-	-	-	-	-
sis Akhir	La	1,00	1,43	-	-	-	-	-	-
AN PPA KONSTRUKSI SUMUR									
PVC AW diameter 4"	M	200,00	6,02	-	-	-	-	-	-
sis Piring	BH	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-
AN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
gantung dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	-	-	-	-
AN PUMPING TES									
gantung boratup dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
gantung	Jam	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
AN PENYELESAIAN									
gantung Box Sumur	La	4,00	0,57	-	-	-	-	-	-
AN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
AIR BAKU									
gantung Submersible Phase	Unit	4,00	7,02	-	-	-	-	-	-
gantung Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	184,00	0,68	-	-	-	-	-	-
AN TOWER TANDON AIR									
AN PERSIAPAN									
gantung Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-
sis Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
sis Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-
AN BETON FONDASI TOWER									
gantung Penebaran Sloof	Kg	168,80	0,51	-	-	-	-	-	-
gantung Bekisting Sloof	M2	13,44	0,56	-	-	-	-	-	-
gantung Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,78	-	-	-	-	-	-
sis Tink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gantung Penebaran Pondasi Tink	Kg	71,00	0,27	-	-	-	-	-	-
gantung Bekisting Pondasi Tink	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-
gantung Beton Pondasi Tink K-175	M3	4,64	1,75	-	-	-	-	-	-
AN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
sis 50 50 3 Tangg Usana	Kg	1968,88	3,60	-	-	-	-	-	-
sis 40 40 4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-
sis 40 40 4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-
sis 40 40 4 (Pagar)	BH	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
sis 40 40 4 (Pagar)	bb	4,00	1,43	-	-	-	-	-	-
sis 40 40 4 (Pagar)	Unit	4,00	4,30	-	-	-	-	-	-
AN PENGECAKAN RANGKA TOWER									
gantung Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,56	-	-	-	-	-	-
AN LANTAI DUDUKAN TANDON									
gantung Papan Lantai Kayu Besi Tr 2 cm	M2	23,04	1,20	-	-	-	-	-	-
AN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
gantung Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-
gantung Profile Tink 2200 L	bb	4,00	2,30	-	-	-	-	-	-
AN PEMASANGAN KRAN UMUM									
AN PERSIAPAN									
gantung Lokasi Kran umum	M	10,00	0,04	-	-	-	-	-	-
AN TANAH									
sis tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-
sis Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
AN BETON									
gantung Pte bekisting	M2	15,68	0,69	-	-	-	-	-	-
gantung Cor Block Beton Kran Air	M3	1,68	0,64	-	-	-	-	-	-
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
gantung Kran 3/4	BH	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
sis Air PVC Ø 3/4"	BH	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,47	-	-	-	-	-	-
AN AKHIR									
sis Akhir	Ttk	4,00	1,15	-	-	-	-	-	-
J U M L A H			3,864,87	100,00					
		(A) Realisasi (%)					37,00	5,89	37,00
		(B) Rencana (%)					43,00	8,63	43,00
Deviasi				0,00	0,00		-6,00	-2,75	-6,00

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)




GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cek Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Onorodo, Jaya Mukti, Sa : PAKET 1.1 NABIRE 2 : 000.3.2/05/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESOM/2023 : 24 Oktober 2023 : OTSUS/DTI TA 2023 : 2023				LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE : II (DUA) PERIODE : 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023 KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN					
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UN PINDAHILAIAN									
1) peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Knl	4,00	1,79	4,00	1,79			4,00	1,79
2) peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Knl	4,00	1,79	-	-				
3) PIPA dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Knl	4,00	1,91	2,00	0,96	2,00	0,96	4,00	1,91
Gerebrukal									
4) alat dan Promosi K3 terdiri atas :									
a. K	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
b. Helm (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	6,00	0,65			6,00	0,65
c. Goggles (Goggles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
d. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pag	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
e. Sepatu Safety (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pag	6,00	1,81	6,00	1,81			6,00	1,81
f. Helm (Safety Vest)	BH	6,00	0,43	6,00	0,43			6,00	0,43
UN PENGEDORAN SUMUR EKSPLORASI									
1) bahan Lokasi Pengedoran	La	4,00	0,57			4,00	0,57	4,00	0,57
2) coran segula Forman diameter 4"	M	200,00	34,27			100,00	17,14	100,00	17,14
3) beton/ pengisian dinding lubang bor	M	200,00	2,65			100,00	1,33	100,00	1,33
BILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
1) bahan Sample dan Analisa Sample	Ttk	4,00	1,72			2,00	0,86	2,00	0,86
2) hasil Coring	Ttk	4,00	5,74			2,00	2,87	2,00	2,87
3) Hidrologi	tk	4,00	2,87			2,00	1,44	2,00	1,44
4) Akkur	La	1,00	1,43			0,50	0,72	0,50	0,72
AAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
1) VC AW diameter 4"	M	200,00	6,02			-	-	-	-
2) Pting	BH	4,00	0,06			-	-	-	-
AAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
1) timbunan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park teritum	M3	3,43	0,51			-	-	-	-
AAN PUMPING TES									
1) pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71			-	-	-	-
2) analisis	Jam	24,00	1,71			-	-	-	-
AAN PENYELESAIAN									
1) beton Box Sumur	La	4,00	0,57			-	-	-	-
AAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
1) UR BAKU									
2) Submersible Phase	Unit	4,00	7,02			-	-	-	-
3) saluran PIPA PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	184,00	0,68			-	-	-	-
AAN TOWER TANDON AIR									
AAN PERSIAPAN :									
1) grahian Lokasi Tower	M2	100,00	0,31			-	-	-	-
2) Tanah	M3	0,22	0,01			-	-	-	-
3) Tanah	M3	0,06	0,00			-	-	-	-
AAN BETON FONDASI TOWER									
1) beton Ponderasi Sloof	Kg	168,80	0,53			-	-	-	-
2) beton Bekisting Sloof	M2	13,44	0,56			-	-	-	-
3) coran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,28			-	-	-	-
4) besi Tink									
5) beton Ponderasi Pondasi Tink	Kg	71,00	0,22			-	-	-	-
6) beton Bekisting Pondasi Tink	M2	17,28	0,73			-	-	-	-
7) coran Beton Pondasi Tink K-175	M3	4,64	1,75			-	-	-	-
AAN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
1) Sika 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1968,88	3,60			-	-	-	-
2) Sika 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00			-	-	-	-
3) sika hole tebal 1 cm	M2	0,12	0,16			-	-	-	-
4) besi Batas M16	Bk	64,00	0,46			-	-	-	-
5) sikaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,43			-	-	-	-
6) Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,30			-	-	-	-
AAN PENGECATAN RANGKA TOWER									
1) catan Basi Sika Rangka Tower	M2	28,00	0,56			-	-	-	-
AAN LANTAI DUDUKAN TANDON									
1) sikaan Papan Lantai Kayu Kayu Basi T= 2 cm	M2	23,04	1,20			-	-	-	-
AAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
1) saluran PIPA PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24			-	-	-	-
2) sikaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,30			-	-	-	-
AAN PEMASANGAN KRAN UMUM									
AAN PERSIAPAN									
1) bahan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,04			-	-	-	-
AAN TANAH									
2) tanah	M3	1,84	0,10			-	-	-	-
3) tanah	M3	1,44	0,02			-	-	-	-
AAN BETON									
1) beton Pas bekisting	M2	15,68	0,66			-	-	-	-
2) beton Cor Black Beton Kran Air	M3	1,68	0,64			-	-	-	-
AAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
1) Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08			-	-	-	-
2) Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04			-	-	-	-
3) PIPA PVC 3/4"	M	64,00	0,47			-	-	-	-
AAN AKHIR									
1) Akkur	Ttk	4,00	1,31			-	-	-	-
JUMLAH		3.864,87	100,00						
		(A) Realisasi (%)		37,00	5,89	212,50	25,87	249,50	31,75
		(B) Rencana (%)		43,00	8,63	417,00	49,25	460,00	57,88
Deviasi				-6,00	-2,75	-204,50	-23,39	-210,50	-26,13

Ditandatangani Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002



Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWA S.IT
Inspector

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 3 - 4

KEGIATAN :


PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI


PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Yaro Makmur 3, Ororodo, Jaya Mukti,
Simbokeri)

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabin II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S...					LAPORAN MINGGUAN				
: PAKET 11 NABIRE 2 : 000.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023 : 24 Oktober 2023 : OTSUS/DTI TA 2023 : 2023					KEMAJUAN PEKERJAAN				
					MINGGU KE : 10 (TIGA) PERIODI : 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023 KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN				
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LULU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
peralatan bor 1 (set) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79	4,00	1,79			4,00	1,79
peralatan bor 1 (set) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79	-	-				
peralatan bor 1 (set) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,91	4,00	1,91			4,00	1,91
PEKERJAAN									
PEKERJAAN PEMBERSIHAN									
dan Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
helm (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	6,00	0,65			6,00	0,65
goggles (Safety Goggles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
gloves (Safety Gloves)	Pag	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
sepatu safety (Safety Shoes, rubber safety shoes and low cap)	Pag	6,00	1,81	6,00	1,81			6,00	1,81
vest (Safety Vest)	BH	6,00	0,43	6,00	0,43			6,00	0,43
PEKERJAAN SUMUR EKSPLORASI									
dan Lokasi Pengboran	La	4,00	0,57	4,00	0,57			4,00	0,57
dan sebagai Forman diameter 4"	M	200,00	34,27	100,00	17,14	100,00	17,14	200,00	34,27
dan persiapan dinding lubang bor	M	200,00	2,65	100,00	1,33	100,00	1,33	200,00	2,65
PEKERJAAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
dan Sample dan Analisa Sample	Ttk	4,00	1,72	2,00	0,86	2,00	0,86	4,00	1,72
dan Coring	Ttk	4,00	5,74	2,00	2,87	2,00	2,87	4,00	5,74
dan Hidrologi	Ttk	4,00	2,87	2,00	1,44	2,00	1,44	4,00	2,87
dan Akhir	La	1,00	1,43	0,50	0,72	0,50	0,72	1,00	1,43
PEKERJAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
dan AW diameter 4"	M	200,00	6,02	-	-	-	-	-	-
dan Pipa	BH	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
dan sebagai Lapisan Bor (Material Pilihan) Gravel /ark tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES									
dan sebagai pompa dan debit tetap	Jem	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
dan sebagai pompa	Jem	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENYELESAIAN									
dan Port Sumur	La	4,00	0,57	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
PEKERJAAN UBAHU									
dan sebagai Phase	Unit	4,00	7,02	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	184,00	0,68	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR									
PEKERJAAN PERSIAPAN									
dan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-
dan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
dan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER									
dan sebagai Sloof	Kg	168,80	0,53	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Sloof	M2	13,44	0,56	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Sloof K-175	M3	3,52	1,28	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Tink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Pondasi Tink	Kg	71,00	0,22	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Pondasi Tink	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-
dan sebagai Pondasi Tink K-175	M3	4,64	1,75	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
dan sebagai 50.50.5 Tangga Utama	Kg	1968,88	3,60	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 40.40.4 (Pager)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	Da	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	bb	4,00	1,43	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	Unit	4,00	4,30	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M2	28,00	0,56	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M2	23,04	1,20	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	bb	4,00	2,30	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM									
PEKERJAAN PERSIAPAN									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M	10,00	0,04	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M2	15,68	0,66	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M3	1,68	0,64	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA TANDON KE KRAN UMUM									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	M	64,00	0,47	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AKHIR									
dan sebagai 100.100.100 (Pager)	Ttk	4,00	1,15	-	-	-	-	-	-
J U M L A H			3.864,87	100,00					
		(A) Realisasi (%)		249,50	31,75	206,50	24,34	456,00	56,09
		(B) Rencana (%)		460,00	57,88	417,00	49,25	460,00	57,88
Deviasi				-210,50	-26,13	-210,50	-24,91	-4,00	-1,79


Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN MINGGUAN					KEMAJUAN PEKERJAAN				
: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaroniakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S					: IV (EMPAT)				
: PAKET 11 NABIRE 2					: 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023				
: 000.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/TSOM/2023					: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN				
: 24 Oktober 2023									
: OTUS/DTI TA 2023									
: 2023									
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
				MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAHULUAN									
peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79	4,00	1,79			4,00	1,79
peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79						
peralatan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Kali	4,00	1,91	4,00	1,91			4,00	1,91
peralatan dan Promosi K3 terdiri atas:									
- Helm	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
- Sarung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	6,00	0,65			6,00	0,65
- Masker (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
- Sarung (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
- Sepatu (Safety Shoes, rubber safety shoes and ice cap)	Psg	6,00	1,81	6,00	1,81			6,00	1,81
- Selendang (Safety Vest)	BH	6,00	0,43	6,00	0,43			6,00	0,43
PENGEDARAN SUMUR EKSPLORASI									
- Instalasi Pompa	La	4,00	0,57	4,00	0,57	-	-	4,00	0,57
- Instalasi Formasi diameter 4"	M	200,00	34,27	200,00	34,27	-	-	200,00	34,27
- Instalasi perapian dinding lubang bor	M	200,00	2,65	200,00	2,65	-	-	200,00	2,65
LAM DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
- Instalasi dan Analisa Sample	Ttk	4,00	1,72	4,00	1,72	-	-	4,00	1,72
- Instalasi Coring	Ttk	4,00	5,74	4,00	5,74	-	-	4,00	5,74
- Hidrologi	tk	4,00	2,87	4,00	2,87	-	-	4,00	2,87
- Akhir	La	1,00	1,43	1,00	1,43	-	-	1,00	1,43
IN PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
- 2" AW diameter 4"	M	200,00	6,02	-	-	200,00	6,02	200,00	6,02
- Pipa	BH	4,00	0,06	-	-	4,00	0,06	4,00	0,06
IN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
- Instalasi dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park vertikal	M3	3,43	0,51	-	-	3,43	0,51	3,43	0,51
N PUMPING TES									
- Instalasi bersikap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
- Aliran	Jam	24,00	1,71	-	-	-	-	-	-
N PENYELESAIAN									
- Instalasi Box Sumur	La	4,00	0,57	-	-	-	-	-	-
IN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
- Instalasi				-	-	-	-	-	-
- Instalasi Flase	Unit	4,00	7,02	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	164,00	0,68	-	-	-	-	-	-
N TOWER TANDON AIR									
- N PERSIAPAN :				-	-	-	-	-	-
- Instalasi Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-
- Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-
- Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-
N BETON FONDASI TOWER									
- Instalasi Pondasi Sloof	Kg	168,80	0,53	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Bekisting Sloof	M2	13,44	0,56	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,28	-	-	-	-	-	-
- Tink				-	-	-	-	-	-
- Instalasi Pondasi Tink	Kg	71,00	0,22	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Bekisting Pondasi Tink	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Beton Pondasi Tink K-175	M3	4,64	1,75	-	-	-	-	-	-
IN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
- Instalasi 50.50.5 Tangga Utama	Kg	1968,88	3,60	-	-	-	-	-	-
- Instalasi 40.40.4 (Pager)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-
- Instalasi balok tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Balok M16	Ba	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	1,43	-	-	-	-	-	-
- Instalasi dan Pengelasan	Unit	4,00	4,30	-	-	-	-	-	-
IN PENGECATAN RANGKA TOWER									
- Instalasi Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,56	-	-	-	-	-	-
IN LANTAI DUDUKAN TANDON									
- Instalasi Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,20	-	-	-	-	-	-
IN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
- Instalasi Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Profile Tank 2300 L	bb	4,00	2,30	-	-	-	-	-	-
IN PEMASANGAN KRAN UMUM									
- Instalasi Kran umum	M	10,00	0,04	-	-	-	-	-	-
IN TANAH									
- Instalasi	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
IN BETON									
- Instalasi Pita bekisting	M2	15,68	0,66	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Cor Block Beton Kuan Air	M3	1,68	0,64	-	-	-	-	-	-
IN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
- Instalasi 3/4"	Ba	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
- Instalasi Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,47	-	-	-	-	-	-
IN AKHIR									
- Instalasi Akhir	Ttk	4,00	1,15	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		3.864,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				56,00	56,09	207,43	6,59	663,43	62,68
(B) Rencana (%)				460,00	57,88	207,43	6,59	667,43	64,47
Deviasi				-4,00	-1,79	0,00	0,00	-4,00	-1,79

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUINAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Disetujui Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



MON RUMEAWAS, ST
Inspektor

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 5 - 6

KEGIATAN :


PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Yaro Makmur 3, Ororodo, Jaya Mukti,
Simbokeri)

LAPORAN MINGGUAN					KEMAJUAN PEKERJAAN				
: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cek Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, Su PALET 11 NABIRE 2 : 000.3.2/65/SPK/5.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023 : 24 Oktober 2023 : OTSUS/DTI TA 2023 : 2023					MINGGU KE : V (LIMA) PERIODE : 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023 KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN				
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DALAM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WENDAHILUAN									
uratan bor 1 (sat) unit dan alat bantu nya serta team personil dari	Km	4,00	1,79	4,00	1,79	-	-	4,00	1,79
uratan bor 1 (sat) unit dan alat bantu nya serta team personil dari	Km	4,00	1,79	-	-	-	-	-	-
n Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur bermasak struktur	Km	4,00	1,91	4,00	1,91	-	-	4,00	1,91
dan Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	Bh	5,00	0,65	6,00	0,65	-	-	6,00	0,65
nya (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17	-	-	6,00	0,17
an (Safety Gloves)	Pag	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
amanatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pag	6,00	1,81	6,00	1,81	-	-	6,00	1,81
amanatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-	6,00	0,43
PENGEDORAN SUMUR EKSPLORASI									
an Lokasi Pembebasan	La	4,00	0,57	4,00	0,57	-	-	4,00	0,57
an kepala Formasi diameter 4"	M	200,00	34,27	200,00	34,27	-	-	200,00	34,27
an perapian dinding lubang bor	M	200,00	2,65	200,00	2,65	-	-	200,00	2,65
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
an Sampel dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,72	4,00	1,72	-	-	4,00	1,72
an Coring	Ttk	4,00	5,74	4,00	5,74	-	-	4,00	5,74
anologi	tk	4,00	2,87	4,00	2,87	-	-	4,00	2,87
akhir	La	1,00	1,43	1,00	1,43	-	-	1,00	1,43
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
AW diameter 4"	M	200,00	6,02	200,00	6,02	-	-	200,00	6,02
BH	BH	4,00	0,06	1,00	0,06	-	-	4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
an dinding Lubang Bor (Material Pijihuan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	3,43	0,51	-	-	3,43	0,51
PUMPING TES									
ngapan berdasar dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71	-	-	24,00	1,71	24,00	1,71
dan	Jam	24,00	1,71	-	-	24,00	1,71	24,00	1,71
PENYELESAIAN									
n Bor Sumur	La	4,00	0,57	-	-	4,00	0,57	4,00	0,57
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
BAKU									
Remersible Pianso	Unit	4,00	7,02	-	-	4,00	7,02	4,00	7,02
an Pipa PVC dia. 3/4" Or let Pompa	M	184,00	0,68	-	-	-	-	-	-
TOWER TANDON AIR									
PERSIAPAN :									
an Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	100,00	0,31	100,00	0,31
anah	M3	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01	0,22	0,01
anah	M3	0,06	0,00	-	-	0,06	-	0,06	-
BETON PONDASI TOWER									
an Persebaran Sloof	Kg	168,80	0,53	-	-	168,80	0,53	168,80	0,53
an Bekisting Sloof	M2	13,44	0,56	-	-	13,44	0,56	13,44	0,56
an Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,28	-	-	3,52	1,28	3,52	1,28
an Tink									
an Persebaran Pondasi Tink	Kg	71,00	0,22	-	-	71,00	0,22	71,00	0,22
an Bekisting Pondasi Tink	M2	17,28	0,73	-	-	17,28	0,73	17,28	0,73
an Beton Pondasi Tink K-175	M3	4,64	1,75	-	-	4,64	1,75	4,64	1,75
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
an 50 50 5 Tiang Utama	Kg	1968,88	3,60	-	-	-	-	-	-
an 40 40 4 (Pagar)	Kg	352,60	1,00	-	-	-	-	-	-
an hole tebal 1 cm	M2	0,52	0,16	-	-	-	-	-	-
an baut M16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-
an Tangga Tower Tindakan	bb	4,00	1,43	-	-	-	-	-	-
an dan Pongelasan	Unit	4,00	4,30	-	-	-	-	-	-
PENGECATAN RANGKA TOWER									
an Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,56	-	-	-	-	-	-
N LANTAI DUDUKAN TANDON									
an Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,20	-	-	-	-	-	-
N PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
an Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-
an Profile Tank 2200 L	bb	4,00	2,30	-	-	-	-	-	-
PEMASANGAN KRAN UMUM									
N PERSIAPAN									
anah Lokasi Kran umum	M	10,00	0,04	-	-	-	-	-	-
N TANAH									
anah	M3	1,64	0,10	-	-	-	-	-	-
anah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
N BETON									
an Pas bekisting	M2	15,68	0,66	-	-	-	-	-	-
an Cor Block Beton Keras Air	M3	1,68	0,64	-	-	-	-	-	-
GAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
an 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
an PVC Ø 3/4"	Mh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
an PVC 3/4"	M	64,00	0,47	-	-	-	-	-	-
AN AKHIR									
an Akhir	Ttk	4,00	1,15	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		3.864,87	100,00						
(A) Realisasi (%)				663,43	62,68	434,96	16,40	1.098,39	79,08
(B) Rencana (%)				647,43	64,47	614,32	15,33	1.286,39	81,55
Deviasi				-14,00	-1,79	-179,36	1,07	-188,00	-2,47

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Disetujui Oleh :
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN




SIMON RUBBEWAS, ST

Inspector

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cek Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S PAKET 11 NABIRE 2 000.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023 : 24 Oktober 2023 : OTSUS/DTI TA 2023 : 2023				LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE : VI (ENAM) PERIODE : 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023 KONSULTAN PENCAWAS : CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN					
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BENDAHILUJIAN									
peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta helm pribadi dari	Kali	4,00	1,79	4,00	1,79			4,00	1,79
peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta helm pribadi dari	Kali	4,00	1,79	-	-				
pipa dan mesin untuk uji pemampatan sumur termasuk	Kali	4,00	1,91	4,00	1,91			4,00	1,91
ditruhal									
dan Promosi K3 terdiri atas:									
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04
1. Helm (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	6,00	0,65			6,00	0,65
2. Goggles, Spectacles	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17
3. Safety Shoes	Pap	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04
4. Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap	Pap	6,00	1,81	6,00	1,81			6,00	1,81
5. Safety Vest	BH	6,00	0,43	6,00	0,43			6,00	0,43
PENGEDARAN SUMUR EKSPLORASI									
m Lokasi Pengedaran	La	4,00	0,57	4,00	0,57			4,00	0,57
m Kepala Forman diameter 4"	M	200,00	34,27	200,00	34,27			200,00	34,27
m Perapian dinding lubang bor	M	200,00	2,65	200,00	2,65			200,00	2,65
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH									
m Sample dan Analisa Sample	Ttk	4,00	1,72	4,00	1,72			4,00	1,72
unit Corong	Ttk	4,00	5,74	4,00	5,74			4,00	5,74
ditologi	ttk	4,00	2,87	4,00	2,87			4,00	2,87
akhir	La	1,00	1,43	1,00	1,43			1,00	1,43
PIPA KONSTRUKSI SUMUR									
AW diameter 4"	M	200,00	6,02	200,00	6,02			200,00	6,02
1. H	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
m dinding 1 lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	3,43	0,51			3,43	0,51
PUMPUNG TES									
m pampa bersahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71			24,00	1,71
dan	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71			24,00	1,71
PENYELESAIAN									
1. Bor Sumur	La	4,00	0,57	4,00	0,57			4,00	0,57
DAN PEMASANGAN POMPA SUMUR IMERSIBLE									
BAKU									
Immersible Phase	Unit	4,00	7,02	4,00	7,02			4,00	7,02
m Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	184,00	0,68			184,00	0,68	184,00	0,68
TOWER TANDON AIR									
1. PERSIAPAN :									
m Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	100,00	0,31			100,00	0,31
mah	M3	0,22	0,01		0,22		0,01		0,01
mah	M3	0,06	0,00		0,06		-		0,06
BETON PONDASI TOWER									
1. Perencanaan Sloof	Kg	168,80	0,53	168,80	0,53			168,80	0,53
m Bekisting Sloof	M2	13,44	0,56		13,44		0,56		0,56
m Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,28		3,52		1,28		1,28
1.1tk									
Perencanaan Pondasi Titek	Kg	71,00	0,22			71,00	0,22	71,00	0,22
m Bekisting Pondasi Titek	M2	17,28	0,73			17,28	0,73	17,28	0,73
m Beton Pondasi Titek K-175	M3	4,64	1,75			4,64	1,75	4,64	1,75
RANGKA DAN TANGGA TOWER									
30 50 5 Tang Utama	Kg	1958,88	3,60			1.958,88	3,60	1.958,88	3,60
40 40 4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00			352,80	1,00	352,80	1,00
1.1tk tebal 1 cm	M2	0,92	0,16			0,92	0,16	0,92	0,16
m M16	Bh	64,00	0,46			64,00	0,46	64,00	0,46
m Tangga Tower Tandon	bb	4,00	1,43			4,00	1,43	4,00	1,43
1.1tk dan Pengelasan	Unit	4,00	4,20						
PENGECATAN RANGKA TOWER									
m Basi Sikla Jangka Tower	M2	28,00	0,56						
LANTAI DUDUKAN TANDON									
m Papan Lantai Kayu Basi T= 2 cm	M2	23,04	1,20						
PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
m Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24						
m Profile Tank 2200 L	bb	4,00	2,30						
PEMASANGAN KRAN UMUM									
1. PERSIAPAN :									
m Lokasi Kran umum	M	10,00	0,04						
1.1tk TANAH									
mah	M3	1,84	0,10						
mah	M3	1,44	0,02						
BETON									
m Pas bekisting	M2	15,68	0,66						
m Cor Block Beton Kran Air	M3	1,68	0,64						
1.1tk AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
m 3/4"	Bh	4,00	0,08						
m PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04						
m PVC 3/4"	M	64,00	0,47						
1.1tk AKHIR									
m Akhir	Ttk	4,00	1,15						
JUMLAH		3.864,87		100,00					
		(A) Realisasi (%)		1.005,47	76,38	2.657,52	10,03	3.662,99	86,41
		(B) Rencana (%)		1.193,47	78,85	2.477,52	13,65	3.670,99	92,50
		Deviasi		-188,00	-2,47	180,00	-3,62	-8,00	-6,09

Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBI WAS, ST
Inspector

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 7 - 8

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Yaro Makmur 3, Ororodo, Jaya Mukti,
Simbokeri)

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S...

: PAKET 11 NABIRE 2

: 000.3.2/65/SPK/S BOR PKT.11/PPK/ESOM/2023

: 24 Oktober 2023

: OTSUS/OTI TA 2023

: 2023

LAPORAN MINGGUAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


MINGGU KE
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: VII (TUJUH)
: 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN					
		VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		DLM MINGGU INI		SD MINGGU INI	
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAHULUAN									
persiapan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79	4,00	1,79	-	-	4,00	1,79
dan persiapan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79	-	-	-	-	-	-
dan pipa dan mesin untuk uji pemompaan sumur bermata air	Kali	4,00	1,91	4,00	1,91	-	-	4,00	1,91
PEKERJAAN									
dan Promosi K3 terdiri atas:									
dan Promosi K3 terdiri atas:	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
dan Promosi K3 terdiri atas:	BH	6,00	0,65	6,00	0,65	-	-	6,00	0,65
dan Promosi K3 terdiri atas:	BH	6,00	0,17	6,00	0,17	-	-	6,00	0,17
dan Promosi K3 terdiri atas:	Pg	6,00	0,04	6,00	0,04	-	-	6,00	0,04
dan Promosi K3 terdiri atas:	Pg	6,00	1,81	6,00	1,81	-	-	6,00	1,81
dan Promosi K3 terdiri atas:	BH	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-	6,00	0,43
PEKERJAAN SUMUR EKSPLORASI									
dan Lokasi Pengambilan	La	4,00	0,57	4,00	0,57	-	-	4,00	0,57
dan Lokasi Pengambilan	M	200,00	34,27	200,00	34,27	-	-	200,00	34,27
dan Lokasi Pengambilan	M	200,00	2,65	200,00	2,65	-	-	200,00	2,65
PEKERJAAN ANALISA SAMPEL TANAH									
dan Lokasi Pengambilan	Tdk	4,00	1,72	4,00	1,72	-	-	4,00	1,72
dan Lokasi Pengambilan	Tdk	4,00	5,74	4,00	5,74	-	-	4,00	5,74
dan Lokasi Pengambilan	tk	4,00	2,87	4,00	2,87	-	-	4,00	2,87
dan Lokasi Pengambilan	La	1,00	1,43	1,00	1,43	-	-	1,00	1,43
PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR									
dan Lokasi Pengambilan	M	200,00	6,02	200,00	6,02	-	-	200,00	6,02
dan Lokasi Pengambilan	BH	4,00	0,06	4,00	0,06	-	-	4,00	0,06
PEKERJAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR									
dan Lokasi Pengambilan	M3	3,43	0,51	3,43	0,51	-	-	3,43	0,51
PEKERJAAN PUMPING TES									
dan Lokasi Pengambilan	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71	-	-	24,00	1,71
dan Lokasi Pengambilan	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71	-	-	24,00	1,71
PEKERJAAN PENYELESAIAN									
dan Lokasi Pengambilan	La	4,00	0,57	4,00	0,57	-	-	4,00	0,57
PEKERJAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE									
PEKERJAAN BAKU									
dan Lokasi Pengambilan	Unit	4,00	7,02	4,00	7,02	-	-	4,00	7,02
dan Lokasi Pengambilan	M	184,00	0,68	184,00	0,68	-	-	184,00	0,68
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR									
PEKERJAAN PERSIAPAN									
dan Lokasi Pengambilan	M2	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-	100,00	0,31
dan Lokasi Pengambilan	M3	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01
dan Lokasi Pengambilan	M3	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-	0,06	0,00
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER									
dan Lokasi Pengambilan	Kg	168,80	0,53	168,80	0,53	-	-	168,80	0,53
dan Lokasi Pengambilan	M2	13,44	0,56	13,44	0,56	-	-	13,44	0,56
dan Lokasi Pengambilan	M3	3,52	1,28	3,52	1,28	-	-	3,52	1,28
dan Lokasi Pengambilan	Tdk	-	-	-	-	-	-	-	-
dan Lokasi Pengambilan	Kg	71,00	0,22	71,00	0,22	-	-	71,00	0,22
dan Lokasi Pengambilan	M2	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-	17,28	0,73
dan Lokasi Pengambilan	M3	4,64	1,75	4,64	1,75	-	-	4,64	1,75
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER									
dan Lokasi Pengambilan	Kg	1958,88	3,60	1958,88	3,60	-	-	1958,88	3,60
dan Lokasi Pengambilan	Kg	352,80	1,00	352,80	1,00	-	-	352,80	1,00
dan Lokasi Pengambilan	M2	0,92	0,16	0,92	0,16	-	-	0,92	0,16
dan Lokasi Pengambilan	Bh	64,00	0,46	64,00	0,46	-	-	64,00	0,46
dan Lokasi Pengambilan	Bh	4,00	1,43	4,00	1,43	-	-	4,00	1,43
dan Lokasi Pengambilan	Unit	4,00	4,30	4,00	4,30	-	-	4,00	4,30
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER									
dan Lokasi Pengambilan	M2	28,00	0,56	-	-	28,00	0,56	28,00	0,56
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON									
dan Lokasi Pengambilan	M2	23,04	1,20	-	-	23,04	1,20	23,04	1,20
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON									
dan Lokasi Pengambilan	M	32,00	0,24	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24
dan Lokasi Pengambilan	Bh	4,00	2,30	-	-	4,00	2,30	4,00	2,30
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM									
dan Lokasi Pengambilan	M	10,00	0,04	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH									
dan Lokasi Pengambilan	M3	1,64	0,10	-	-	-	-	-	-
dan Lokasi Pengambilan	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON									
dan Lokasi Pengambilan	M2	15,68	0,66	-	-	-	-	-	-
dan Lokasi Pengambilan	M3	1,68	0,64	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKAIAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM									
dan Lokasi Pengambilan	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
dan Lokasi Pengambilan	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-
dan Lokasi Pengambilan	M	64,00	0,47	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AKHIR									
dan Lokasi Pengambilan	Tdk	4,00	1,15	-	-	-	-	-	-
JUMLAH									
		3.864,87	100,00						
		(A) Realisasi (%)		3.666,99	90,71	87,04	4,30	3.754,03	95,01
		(B) Rencana (%)		1.670,99	92,50	87,04	4,30	3.758,03	96,80
		Deviasi		-1,00	-1,79	0,00	0,00	-4,00	-1,79

Disetujui Oleh:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002


Dibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector


: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, S)					LAPORAN MINGGUAN					
: PAKET 11 NABIRE 2					KEMAJUAN PEKERJAAN					
: 003.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESOM/2023					MINGGU KE VIII (DELAPAN)					
: 26 Oktober 2023					PERIODE 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023					
: OTSU/DTI TA 2023					KONSULTAN PENGAWAS CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN					
: 2023										
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN										
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		MINGGU LALU		PRESTASI PEKERJAAN DLM MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENDAHULUAN										
peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personal dari	Kali	4,00	1,79	4,00	1,79			4,00	1,79	
di peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personal dari	Kali	4,00	1,79	-	-	4,00	1,79	4,00	1,79	
di Pipe dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Kali	4,00	2,91	4,00	1,91			4,00	1,91	
terbuka										
dan Promosi K3 terdiri atas:										
	BH	1,00	0,04	1,00	0,04			1,00	0,04	
	Bh	6,00	0,65	6,00	0,65			6,00	0,65	
	Bh	6,00	0,17	6,00	0,17			6,00	0,17	
	Pgg	6,00	0,04	6,00	0,04			6,00	0,04	
	Pgg	6,00	1,81	6,00	1,81			6,00	1,81	
	BH	6,00	0,43	6,00	0,43			6,00	0,43	
PENGEDARAN SUMUR EKSPLORASI										
an Lokasi Pengedaran	La	4,00	0,57	4,00	0,57			4,00	0,57	
an kepala Formasi diameter 4"	M	200,00	34,27	200,00	34,27			200,00	34,27	
an perapian dinding lubang bor	M	200,00	2,65	200,00	2,65			200,00	2,65	
AN DAN ANALISA SAMPEL TANAH										
an Sample dan Analisis Sample	Tdk	4,00	1,72	4,00	1,72			4,00	1,72	
an Coring	Tdk	4,00	5,74	4,00	5,74			4,00	5,74	
an Idrologi	tkk	4,00	2,87	4,00	2,87			4,00	2,87	
an Akhir	La	1,00	1,43	1,00	1,43			1,00	1,43	
PIPA KONSTRUKSI SUMUR										
an diameter 4"	M	200,00	6,02	200,00	6,02			200,00	6,02	
an	BH	4,00	0,06	4,00	0,06			4,00	0,06	
BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR										
an dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	3,43	0,51			3,43	0,51	
PUMPING TES										
an bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71			24,00	1,71	
an	Jam	24,00	1,71	24,00	1,71			24,00	1,71	
PENYELESAIAN										
an Bor Sumur	La	4,00	0,57	4,00	0,57			4,00	0,57	
DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE										
BAKU										
anversible Phase	Unit	4,00	7,02	4,00	7,02			4,00	7,02	
an Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	184,00	0,68	184,00	0,68			184,00	0,68	
TOWER TANDON AIR										
PERSIAPAN										
an Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	100,00	0,31			100,00	0,31	
an	M3	0,22	0,01	0,22	0,01			0,22	0,01	
an	M3	0,06	0,00	0,06	-			0,06	-	
BETON FONDASI TOWER										
an Beton Sloof	Kg	168,80	0,53	168,80	0,53			168,80	0,53	
an Beton Sloof	M2	13,44	0,56	13,44	0,56			13,44	0,56	
an Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,28	3,52	1,28			3,52	1,28	
an										
an Beton Pondasi Titik	Kg	71,00	0,22	71,00	0,22			71,00	0,22	
an Beton Pondasi Titik	M2	17,28	0,73	17,28	0,73			17,28	0,73	
an Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,75	4,64	1,75			4,64	1,75	
RANGKA DAN TANGGA TOWER										
an 50 50 3 Tiang Utama	Kg	1958,88	3,60	1958,88	3,60			1958,88	3,60	
an 40 40 4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	352,80	1,00			352,80	1,00	
an 10 10 10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	0,92	0,16			0,92	0,16	
an M16	Bh	64,00	0,46	64,00	0,46			64,00	0,46	
an Tangga Tower Tandon	tb	4,00	1,43	4,00	1,43			4,00	1,43	
an dan Pengelasan	Unit	4,00	4,30	4,00	4,30			4,00	4,30	
PENGECATAN RANGKA TOWER										
an Bas Sika Rangka Tower	M2	28,00	0,56	28,00	0,56			28,00	0,56	
LANTAI DUDUKAN TANDON										
an Papan Lantai Kayu Bas 2 cm	M2	23,04	1,20	23,04	1,20			23,04	1,20	
PERPILAHAN DARI SUMUR MASUK TANDON										
an Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	32,00	0,24			32,00	0,24	
an Profilasi Tank 2200 L	Bh	4,00	2,30	4,00	2,30			4,00	2,30	
PEMASANGAN KRAN UMUM										
PERSIAPAN										
an Lokasi Kran umum	M	10,00	0,04	-	-	10,00	0,04	10,00	0,04	
TANAH										
an	M3	1,84	0,10	-	-	1,84	0,10	1,84	0,10	
an	M3	1,44	0,02	-	-	1,44	0,02	1,44	0,02	
BETON										
an Pas beton	M2	15,68	0,66	-	-	15,68	0,66	15,68	0,66	
an Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,64	-	-	1,88	0,64	1,88	0,64	
AN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM										
an 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	4,00	0,08	4,00	0,08	
PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	4,00	0,04	4,00	0,04	
PVC 3/4"	M	64,00	0,47	-	-	64,00	0,47	64,00	0,47	
an AKHIR										
an Akhir	Tdk	4,00	1,15	-	-	4,00	1,15	4,00	1,15	
J U M L A H		3.864,87	100,00							
(A) Realisasi (%)				3.754,03	95,01	110,84	4,99	3.864,87	100,00	
(B) Rencana (%)				3.758,03	96,80	110,84	4,99	3.864,87	100,00	
Deviasi				-4,00	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Disetujui Oleh:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Disetujui Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



SPION RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN BULANAN

OKTOBER

2023

: Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakmur 3, Ororodo, Jaya Mukti, Simbokeri)
: PAKET 11 NABIRE 2
: 000.3.2/65/SPK/5.BOR.PKT.11/PPE/ESDM/2023
: 24 Oktober 2023
: OTSUS/DTI TA 2023
: 2023

LAPORAN BULANAN

KEMAJUAN PEKERJAAN


BULAN
PERIODE
KONSULTAN PENGAWAS

: OKTOBER
: 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023
: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN


REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN				
				BULAN LALU		DALAM BULAN INI		S/D BULAN INI
		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PEKERJAAN								
1.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79			4,00	1,79	4,00
1.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79					
1.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,79			2,00	0,96	2,00
PEKERJAAN								
2.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	BH	1,00	0,04			1,00	0,04	1,00
2.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	6,00	0,65			6,00	0,65	6,00
2.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	6,00	0,17			6,00	0,17	6,00
2.4 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Pap	6,00	0,04			6,00	0,04	6,00
2.5 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Pap	6,00	1,81			6,00	1,81	6,00
2.6 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	BH	6,00	0,43			6,00	0,43	6,00
PEKERJAAN								
3.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	La	4,00	0,57					
3.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	200,00	34,27					
3.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	200,00	2,65					
3.4 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Tik	4,00	1,72					
3.5 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Tik	4,00	5,74					
3.6 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	ek	4,00	2,87					
3.7 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	La	1,00	1,43					
PEKERJAAN								
4.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	200,00	6,02					
4.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	IRI	4,00	0,06					
PEKERJAAN								
5.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	3,43	0,51					
5.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Jam	24,00	1,71					
5.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Jam	24,00	1,71					
PEKERJAAN								
6.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	La	4,00	0,57					
PEKERJAAN								
7.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Unit	4,00	7,02					
7.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	184,00	0,68					
PEKERJAAN								
8.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	100,00	0,31					
8.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	0,22	0,01					
8.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	0,06	0,00					
PEKERJAAN								
9.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kg	168,80	0,53					
9.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	13,44	0,56					
9.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	3,52	1,28					
PEKERJAAN								
10.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kg	71,00	0,22					
10.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	17,28	0,73					
10.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	4,64	1,75					
PEKERJAAN								
11.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kg	1968,88	3,60					
11.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kg	352,80	1,00					
11.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	0,52	0,16					
11.4 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	64,00	0,46					
11.5 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	4,00	1,43					
11.6 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Unit	4,00	4,30					
PEKERJAAN								
12.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	28,00	0,56					
12.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	23,04	1,20					
12.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	32,00	0,24					
12.4 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	bb	4,00	2,30					
PEKERJAAN								
13.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	10,00	0,04					
13.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	1,64	0,10					
13.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	1,44	0,02					
PEKERJAAN								
14.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M2	15,68	0,66					
14.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M3	1,88	0,64					
PEKERJAAN								
15.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	4,00	0,08					
15.2 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Bh	4,00	0,04					
15.3 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	M	64,00	0,47					
PEKERJAAN								
16.1 (revisi) unit dan alat bantu serta team personil dari	Tik	4,00	1,15					
PEKERJAAN								
JUMLAH		3.864,87	100,00					
(A) Realisasi (%)						37,00	5,89	37,00
(B) Rencana (%)						43,00	8,63	43,00
Deviasi					0,00	0,00	-6,00	-6,00

Disetujui Oleh :
BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Disetujui Oleh :
CV ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspector

LAPORAN BULANAN


NOVEMBER

2023


Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Yaromakur 3, Ororodo, Jaya Mukti, Simboken) PAKET 11 NABIRE 2 000.3.2/65/SPK/S.BOR.PKT.11/PPK/ESDM/2023 24 Oktober 2023 OTSUS/DTT TA 2023 2023	LAPORAN BULANAN	
	KEMAJUAN PEKERJAAN	
BULAN : NOVEMBER		PERIODE : 24 Oktober 2023 s/d 13 Desember 2023
KONSULTAN PENGAWAS		: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN									
URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		TREK JARI PEKERJAAN					
				BULAN LALU		DALAM BULAN INI		S/D BULAN INI	
		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JAN									
1 (setu) unit dan alat bantu kerja serta team personal dari	Kal	4,00	1,79		4,00	1,79			4,00
2 1 (setu) unit dan alat bantu kerja serta team personal dari	Kal	4,00	1,79		-	-			
3 team untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran	Kal	4,00	1,91		4,00	1,91			4,00
K3 terdiri atas:									
5	BH	1,00	0,04		1,00	0,04			1,00
6	Bh	6,00	0,65		6,00	0,65			6,00
7 (safety shoes)	Bh	6,00	0,17		6,00	0,17			6,00
8 (sweat)	Pap	6,00	0,04		6,00	0,04			6,00
9 Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pap	6,00	1,81		6,00	1,81			6,00
10 Safety Vest)	BH	6,00	0,43		6,00	0,43			6,00
11 SUMUR EKSPLORASI									
12	La	4,00	0,57		4,00	0,57	-	-	4,00
13	M	200,00	34,27		200,00	34,27	-	-	200,00
14	M	200,00	2,65		200,00	2,65	-	-	200,00
15 ALISA SAMPEL TANAH									
16	Tik	4,00	1,72		4,00	1,72	-	-	4,00
17	Tik	4,00	5,74		4,00	5,74	-	-	4,00
18	rk	4,00	2,87		4,00	2,87	-	-	4,00
19	La	1,00	1,43		1,00	1,43	-	-	1,00
20 STRUKSI SUMUR									
21	M	200,00	6,02		200,00	6,02			200,00
22	BH	4,00	0,06		4,00	0,06			4,00
23 TAN KONSTRUKSI SUMUR									
24	M3	3,43	0,51		3,43	0,51			3,43
25									
26	Jam	24,00	1,71				24,00	1,71	24,00
27	Jam	24,00	1,71				24,00	1,71	24,00
28 ALAN									
29	La	4,00	0,57				4,00	0,57	4,00
30 BANGUN POMPA SUMBERSTRIK									
31	Unit	4,00	7,02		-	-	4,00	7,02	4,00
32	M	164,00	0,68						
33 NDON AIR									
34									
35	M2	100,00	0,31		-	-	100,00	0,31	100,00
36	M3	0,22	0,01		-	-	0,22	0,01	0,22
37	M3	0,05	0,01		-	-	0,05	-	0,05
38 NDASI TOWER									
39									
40	Kg	168,80	0,53		-	-	168,80	0,53	168,80
41	M2	13,44	0,56		-	-	13,44	0,56	13,44
42	M3	3,52	1,28		-	-	3,52	1,28	3,52
43	Kg	71,00	0,22		-	-	71,00	0,22	71,00
44	M2	17,28	0,73		-	-	17,28	0,73	17,28
45	M3	4,64	1,75		-	-	4,64	1,75	4,64
46 TAN TANGGA TOWER									
47	Kg	1968,88	3,66		-	-	-	-	-
48	Kg	362,80	1,00		-	-	-	-	-
49	M2	0,92	0,16		-	-	-	-	-
50	Bh	64,00	0,46		-	-	-	-	-
51	bh	4,00	1,43		-	-	-	-	-
52	Unit	4,00	4,30		-	-	-	-	-
53 TAN RANGKA TOWER									
54	M2	28,00	0,56		-	-	-	-	-
55 UDUKAN TANDON									
56	M2	23,04	1,20		-	-	-	-	-
57 N DARI SUMUR MASUK TANDON									
58	M	32,00	0,24		-	-	-	-	-
59	bh	4,00	7,30		-	-	-	-	-
60 TAN KRAN UMUM									
61					-	-	-	-	-
62	M	10,00	0,04		-	-	-	-	-
63	M3	1,84	0,10		-	-	-	-	-
64	M3	1,44	0,02		-	-	-	-	-
65	M2	15,68	0,66		-	-	-	-	-
66	M3	1,68	0,61		-	-	-	-	-
67 TAN TANDON KE KRAN UMUM									
68	Bh	4,00	0,08		-	-	-	-	-
69	Bh	4,00	0,01		-	-	-	-	-
70	M	64,00	0,47		-	-	-	-	-
71	Tik	4,00	1,13		-	-	-	-	-
J U M L A H			3.864,87		100,00				
		[A] Realisasi (%)			663,43	62,68	434,96	16,40	1.098,39
		[B] Rencana (%)			667,43	64,47	614,32	15,33	1.286,39
Deviasi					4,00	-1,79	-179,36	-1,07	-188,00

Disetujui Oleh :
AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



GUNAWAN ISKANDAR
NIP. 197711172010041002

Cibuat Oleh
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Inspetor

LAPORAN BULANAN


DESEMBER

2023


0.721 0.725 0.727
 0.729 0.731 0.733
 0.735 0.737 0.739
 0.741 0.743 0.745
 0.747 0.749 0.751
 0.753 0.755 0.757
 0.759 0.761 0.763
 0.765 0.767 0.769
 0.771 0.773 0.775
 0.777 0.779 0.781
 0.783 0.785 0.787
 0.789 0.791 0.793
 0.795 0.797 0.799
 0.801 0.803 0.805
 0.807 0.809 0.811
 0.813 0.815 0.817
 0.819 0.821 0.823
 0.825 0.827 0.829
 0.831 0.833 0.835
 0.837 0.839 0.841
 0.843 0.845 0.847
 0.849 0.851 0.853
 0.855 0.857 0.859
 0.861 0.863 0.865
 0.867 0.869 0.871
 0.873 0.875 0.877
 0.879 0.881 0.883
 0.885 0.887 0.889
 0.891 0.893 0.895
 0.897 0.899 0.901
 0.903 0.905 0.907
 0.909 0.911 0.913
 0.915 0.917 0.919
 0.921 0.923 0.925
 0.927 0.929 0.931
 0.933 0.935 0.937
 0.939 0.941 0.943
 0.945 0.947 0.949
 0.951 0.953 0.955
 0.957 0.959 0.961
 0.963 0.965 0.967
 0.969 0.971 0.973
 0.975 0.977 0.979
 0.981 0.983 0.985
 0.987 0.989 0.991
 0.993 0.995 0.997
 0.999 1.001 1.003
 1.005 1.007 1.009
 1.011 1.013 1.015
 1.017 1.019 1.021
 1.023 1.025 1.027
 1.029 1.031 1.033
 1.035 1.037 1.039
 1.041 1.043 1.045
 1.047 1.049 1.051
 1.053 1.055 1.057
 1.059 1.061 1.063
 1.065 1.067 1.069
 1.071 1.073 1.075
 1.077 1.079 1.081
 1.083 1.085 1.087
 1.089 1.091 1.093
 1.095 1.097 1.099
 1.101 1.103 1.105
 1.107 1.109 1.111
 1.113 1.115 1.117
 1.119 1.121 1.123
 1.125 1.127 1.129
 1.131 1.133 1.135
 1.137 1.139 1.141
 1.143 1.145 1.147
 1.149 1.151 1.153
 1.155 1.157 1.159
 1.161 1.163 1.165
 1.167 1.169 1.171
 1.173 1.175 1.177
 1.179 1.181 1.183
 1.185 1.187 1.189
 1.191 1.193 1.195
 1.197 1.199 1.201
 1.203 1.205 1.207
 1.209 1.211 1.213
 1.215 1.217 1.219
 1.221 1.223 1.225
 1.227 1.229 1.231
 1.233 1.235 1.237
 1.239 1.241 1.243
 1.245 1.247 1.249
 1.251 1.253 1.255
 1.257 1.259 1.261
 1.263 1.265 1.267
 1.269 1.271 1.273
 1.275 1.277 1.279
 1.281 1.283 1.285
 1.287 1.289 1.291
 1.293 1.295 1.297
 1.299 1.301 1.303
 1.305 1.307 1.309
 1.311 1.313 1.315
 1.317 1.319 1.321
 1.323 1.325 1.327
 1.329 1.331 1.333
 1.335 1.337 1.339
 1.341 1.343 1.345
 1.347 1.349 1.351
 1.353 1.355 1.357
 1.359 1.361 1.363
 1.365 1.367 1.369
 1.371 1.373 1.375
 1.377 1.379 1.381
 1.383 1.385 1.387
 1.389 1.391 1.393
 1.395 1.397 1.399
 1.401 1.403 1.405
 1.407 1.409 1.411
 1.413 1.415 1.417
 1.419 1.421 1.423
 1.425 1.427 1.429
 1.431 1.433 1.435
 1.437 1.439 1.441
 1.443 1.445 1.447
 1.449 1.451 1.453
 1.455 1.457 1.459
 1.461 1.463 1.465
 1.467 1.469 1.471
 1.473 1.475 1.477
 1.479 1.481 1.483
 1.485 1.487 1.489
 1.491 1.493 1.495
 1.497 1.499 1.501
 1.503 1.505 1.507
 1.509 1.511 1.513
 1.515 1.517 1.519
 1.521 1.523 1.525
 1.527 1.529 1.531
 1.533 1.535 1.537
 1.539 1.541 1.543
 1.545 1.547 1.549
 1.551 1.553 1.555
 1.557 1.559 1.561
 1.563 1.565 1.567
 1.569 1.571 1.573
 1.575 1.577 1.579
 1.581 1.583 1.585
 1.587 1.589 1.591
 1.593 1.595 1.597
 1.599 1.601 1.603
 1.605 1.607 1.609
 1.611 1.613 1.615
 1.617 1.619 1.621
 1.623 1.625 1.627
 1.629 1.631 1.633
 1.635 1.637 1.639
 1.641 1.643 1.645
 1.647 1.649 1.651
 1.653 1.655 1.657
 1.659 1.661 1.663
 1.665 1.667 1.669
 1.671 1.673 1.675
 1.677 1.679 1.681
 1.683 1.685 1.687
 1.689 1.691 1.693
 1.695 1.697 1.699
 1.701 1.703 1.705
 1.707 1.709 1.711
 1.713 1.715 1.717
 1.719 1.721 1.723
 1.725 1.727 1.729
 1.731 1.733 1.735
 1.737 1.739 1.741
 1.743 1.745 1.747
 1.749 1.751 1.753
 1.755 1.757 1.759
 1.761 1.763 1.765
 1.767 1.769 1.771
 1.773 1.775 1.777
 1.779 1.781 1.783
 1.785 1.787 1.789
 1.791 1.793 1.795
 1.797 1.799 1.801
 1.803 1.805 1.807
 1.809 1.811 1.813
 1.815 1.817 1.819
 1.821 1.823 1.825
 1.827 1.829 1.831
 1.833 1.835 1.837

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN SUMUR EKSPLORASI DI KABUPATEN NABIRE
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023


KONTRAKTOR PENGAWAS : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
 KABUPATEN : NABIRE
 DISTRIK : YARO dan WANGGAR

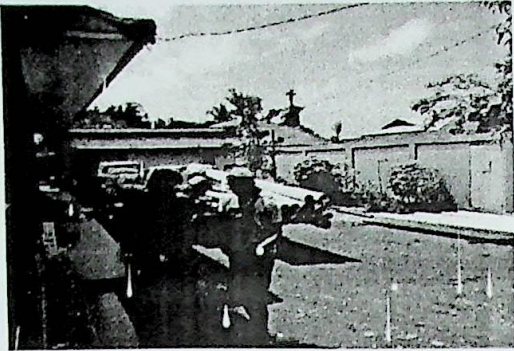


MOBILISASI

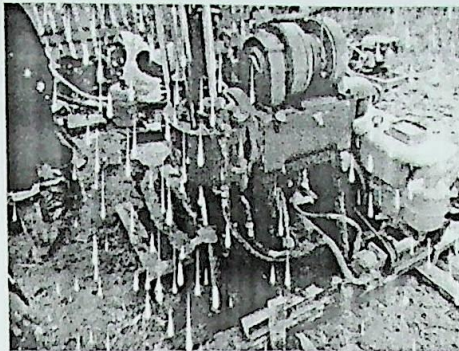


PROGRES 15 %

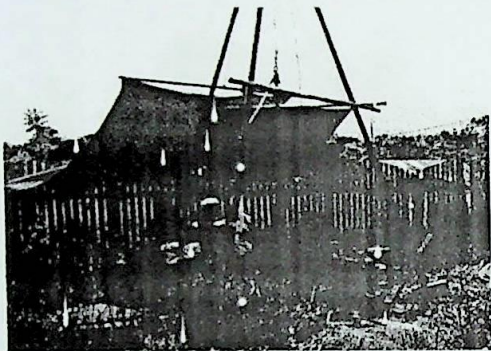


PROGRES 35 %

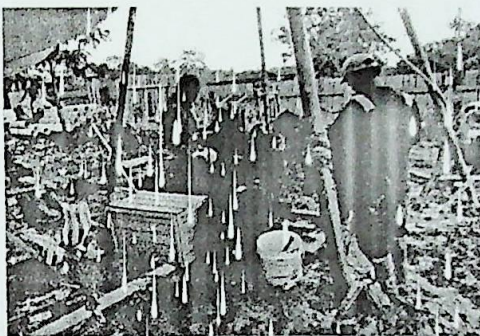

PROGRES 48 %

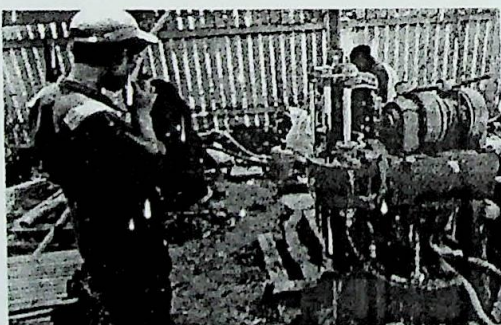

PROGRES 55 %

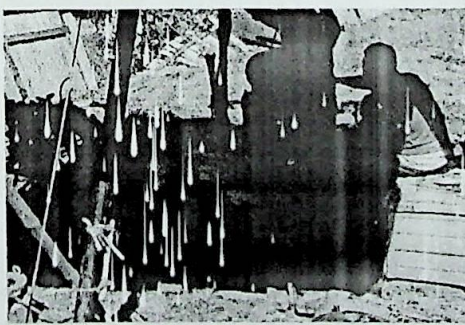


PROGRES 55 %

FOTO DOKUMENTASI

**PEMBANGUNAN SUMUR EKSPLORASI DI KABUPATEN NABIRE
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**


KONTRAKTOR PENGAWAS : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
KABUPATEN : NABIRE

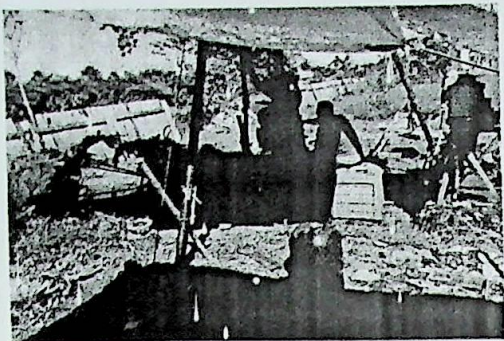


PROGRES 68 %




PROGRES 79 %

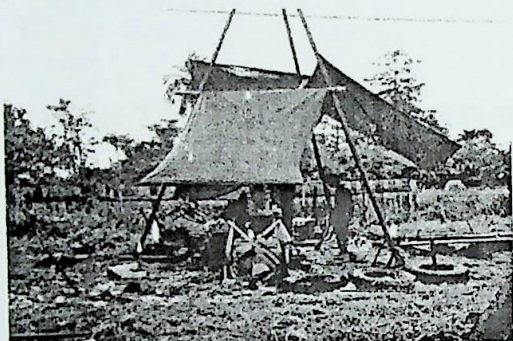


PROGRES 85 %

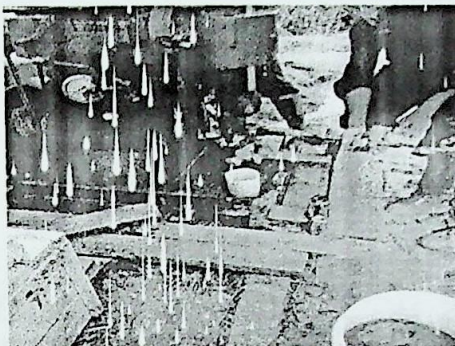

PROGRES 85 %

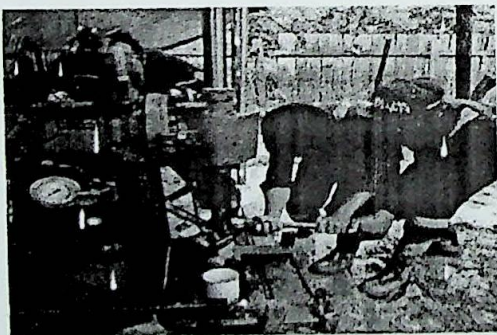

PROGRES 98 %

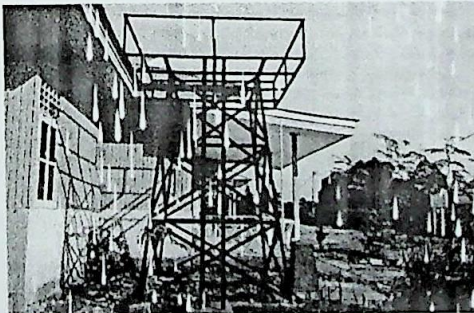

PROGRES 100 %



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN PEKERJAAN

BOBOT 0% - 100%

PERIODE 24 OKTOBER 2023 S/D 13 DESEMBER 2023

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR
TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo,
Karang Tumaritis, Wadio)

LOKASI :

Nabire II PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadio)

KONSULTAN PENGAWAS




CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI
JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023

KURVA S

Bulan Ke : Satu
Periode : 24 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan Data Zona Eksplorasi dan Pengolahan Data
LOKASI : Wonelejo, Karang Tumantilis, Wadilo
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA / REALISASI	BOBOT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KET.
Minggu ke													
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74		1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35	100,00
				1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-	90,00
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39		10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00
				9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78		-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	60,00
				-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86		-	-	1,36	3,85	5,21	-	5,21	1,36	3,85	40,00
				-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00
E	PEKERJAAN PEMASANGAN TIRAN UMUM	2,07		-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52	20,00
				-	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	10,00
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16		-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	-	0,29	0,00
				-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	0,00
Jumlah													
	RENCANA	100,00		11,80	3,08	15,93	8,47	20,73	3,95	20,73	6,13	7,19	
	REALISASI			11,80	14,83	30,80	39,27	60,00	63,95	84,89	92,81	100,00	
	BOBOT KUMULATIF			10,39	3,12								
	REALISASI KUMULATIF			10,39	13,51								

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTANKLASINA YANSEMA
DIREKTIS

KONSULTAN

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanda - Nabire 98816

KURVA S

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi

PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi

LOKASI : Woneajo, Karang Tumartilis, Wadjo)

TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Dua

Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

TAHUN ANGGARAN : 2023										Minggu ke										KET.
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74	RENCANA	1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35								
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-								
			10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18									
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-								
			REALISASI	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-								
			7,78	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-									
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	3,85	5,21	-	5,21	1,36	3,85								
			REALISASI	-	-	1,36	3,85	5,21	-	5,21	1,36	-								
			2,07	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52									
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	-	0,29								
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-								
			100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	RENCANA	BOBOT KUMULATIF	11,80	3,08	15,93	8,47	20,73	3,95	20,73	8,13	7,19									
			11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00									
			10,39	3,12	14,52	3,42	22,27	12,98	-	-	-									
	REALISASI	BOBOT KUMULATIF	10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69	-	-	-									
			10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69	-	-	-									
			10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69	-	-	-									

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANDER H. PAPIA KONSULTAN

KASINA YANSEMA
DIREKTIRIS

KONSULTAN

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi

PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi

Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadio)

LOKASI : PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadio)

TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Tiga

Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

KURVA S

TAHUN ANGGARAN : 2023				Minggu ke									KET.
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74	RENCANA	1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35	100,00
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-	90,00
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00
			REALISASI	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78	RENCANA	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	60,00
			REALISASI	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	3,85	5,21	-	5,21	1,36	3,85	40,00
			REALISASI	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KIAN UMUM	2,07	RENCANA	-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52	20,00
			REALISASI	-	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	10,00
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	-	0,29	10,00
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	0,00
	JUMLAH	100,00											
	RENCANA			11,80	3,08	15,93	8,47	20,73	3,95	20,73	8,13	7,19	
	KUMULATIF			11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00	
	BOBOT			10,39	3,12	14,52	3,42	22,27	12,98	23,30	10,00		
	REALISASI			10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69	90,00	100,00		

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KLASINA YANSEMA
DIREKTIRIS

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 - 2

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis,
Wadio)



: Peneleapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyeha, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadjo)
: PAKET 7 (Oyeha, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadjo)

LAPORAN MINGGUAN

NGGARAN

: 2023

Minggu Ke

: Satu

KE- 1

Periode

: 24 Oktober 2023 - 28 Oktober 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LULU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari shop ke job site	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil workshop ke job site	Kali	4,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	-	-	1,00	0,48	1,00	0,48	1,00	0,48	-	-
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PROMOSI K3 terdapat atas:													
Penyediaan	BH	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
Penyediaan (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	-	-	0,75	0,08	0,75	0,08	0,67	0,07	0,08	0,01
Penyediaan mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	-	-	0,75	0,02	0,75	0,02	0,67	0,02	0,08	0,00
Penyediaan tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	-	-	0,75	0,01	0,75	0,01	0,67	0,00	0,03	0,00
Penyediaan keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	-	-	0,75	0,23	0,75	0,23	0,67	0,20	0,08	0,03
Penyediaan keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	-	-	0,75	0,05	0,75	0,05	0,67	0,05	0,08	0,01
PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
Penyediaan Lokasi Pengeboran	Ls	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
Pengeboran segala format diameter 6"	M	195,00	33,73	-	-	48,75	8,43	48,75	8,43	48,75	8,43	-	-
Pengadanan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAMBIKAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Gambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,74	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
Uji hasil Coring	Ttk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,00)	(1,45)
Uji Hidrologi	Ttk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uji Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Plug	BH	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Pengurangan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENYELESAIAN													
Pemindahan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
PEKERJAAN AIR BAKU													
Pipa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERSIAPAN :													
Pemindahan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemindahan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemindahan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER													
PEKERJAAN PEMBERSAN STAF													
Pemindahan Bekerjaan Staf	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran Beton Staf K-175	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PEMBERSAN PONDASI TITIK													
Pemindahan Bekerjaan Pondasi Titik	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemindahan Bekerjaan Pondasi Titik	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Struktur 5,50.5 Tangga Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Struktur 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Struktur Batas M16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
Pengukuran Besi Struktur Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
Pengadaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAH UMUM													
PEKERJAAN PERSIAPAN													
Pemindahan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH													
Pemindahan Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemindahan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON													
Pengadaan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAH UMUM													
Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kran PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AKHIR													
Pengukuran Akhir	Ttk	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00	-	-	10,39	-	10,39	-	11,60	-	(1,41)	-

PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M. Si

NIP. 19791117 201004 1 002

28 Oktober 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SMO LUMBOWAS, ST
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samarinda-Banah 8 PPT Sarawak - Nabire 99216

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

: Penerapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartis, Wadjo)

: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartis, Wadjo)

LAPORAN MINGGUAN

Ingganan

: 2023

Minggu Ke : Dua

KE- 2

Periode : 30 Oktober 2023 - 04 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KERJAAN PENDAHULUAN													
liberat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-	1,00	0,45	-	-	-	-
mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil ke workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
pasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	-	-	1,00	0,48	-	-	-	-
K3 Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terditi atas:													
Induk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	0,75	0,08	0,75	0,08	1,50	0,16	0,67	0,07	0,08	0,01
Indung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	0,75	0,02	0,75	0,02	1,50	0,04	0,67	0,02	0,08	0,00
ung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	0,75	0,01	0,75	0,01	1,50	0,01	0,67	0,00	0,08	0,00
utu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	0,75	0,23	0,75	0,23	1,50	0,46	0,67	0,20	0,08	0,03
upi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	0,75	0,05	0,75	0,05	1,50	0,11	0,67	0,05	0,08	0,01
KERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI													
mbenthan Lokasi Pergeboran	LS	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-	1,00	0,15	-	-	-	-
geboran segala format diameter 6"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	-	-	48,75	8,43	-	-	-	-
madatan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
GAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
gambilan Sample dan Analisis Sample	TK	4,00	1,74	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44	-	-	-	-
alisis hasil Coring	TK	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alisis Hidrologi	TK	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poran Akhir	LS	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
pa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,48	-	-
Item Plug	BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
PGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
ngurungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park bertentu	M3	3,43	0,51	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
KERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN PENYELESAIAN													
mbuatan Box Sumur	LS	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
MPA AIR BAKU													
mpa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
masangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN TOWER TANDON AIR													
KERJAAN PERSIAPAN :													
mbenthan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ilan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN BETON PONDASI TOWER													
kerjaan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mbuatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ngecoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ndasi TIK													
kerjaan Pembesian Pondasi TIK	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mbuatan Bekisting Pondasi TIK	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ngecoran Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
il Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
il Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
il manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gatur Batang M16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ngadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sa Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
ngecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
ngadaan papan lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
masangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ngadaan Profile Tank 2'00 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
KERJAAN PERSIAPAN													
mbenthan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN TANAH													
Ban Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN BETON													
kerjaan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kerjaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
pa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERJAAN AKHIR													
kerjaan Akhir	TK	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H				100,00		10,39		3,12		13,51		3,08	0,04

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire 04 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

M. SUMBAWA, ST.
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 3 - 4

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis,
Wadio)



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wado)
: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wado)

LAPORAN MINGGUAN

: 2023

Minggu Ke

KE- 3

Periode : 06 November 2023 - 11 November 2023

URAIAN PEKERJAAN

KONTRAK

MINGGU LALU

MINGGU INI

S/D MINGGU INI

RENCANA

DEVIASI

SAT. VOLUME BOBOT

VOLUME BOBOT

VOLUME BOBOT

VOLUME BOBOT

VOLUME BOBOT

VOLUME BOBOT

3 4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

2

PEKERJAAN PENDAHULUAN

Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.
Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.
Pasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya

K3 Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:

Induk
Pelindung (Safety Helmet)
Indung mata (Goggles, Spectacles)
Sarung tangan (Safety Gloves)
Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
Tali keselamatan (Safety Vest)

PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI

Pembersihan Lokasi pengeboran
Pengeboran segala formasi diameter 6"
Pasangan/ perapian dinding lubang bor

PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH

Pengambilan Sample dan Analisis Sample
Analisa hasil Coring
Analisa Hidrologi
Pencoran Akhir

PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR

Pipa PVC AW diameter 4"
Beton Plug

PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR

Pengurungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu

PEKERJAAN PUMPING TES

Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap
Pemulihan

PEKERJAAN PENYELESAIAN

Pembuatan Box Sumur

PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE

PMPA AIR BAKU

Pompa Submersible Phase
Pasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa

PEKERJAAN TOWER TANDON AIR

PEKERJAAN PERSIAPAN :

Pembersihan Lokasi Tower
Pilihan Tanah
Pengisian Tanah

PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER

Pondasi
Pekerjaan Pembesian Scaff
Pembuatan Beldrilling Scaff
Pengcoran Beton Scaff K-175

Pondasi Tiik

Pekerjaan Pembesian Pondasi Tiik
Pembuatan Beldrilling Pondasi Tiik
Pengcoran Beton Pondasi Tiik K-175

PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER

Material Siku 50.50.5 Tiang Utama
Material Siku 40.40.4 (Pagar)
Pilihan manhole lebar 1 cm
Pagar Batul M16
Pengadaan Tangga Tower Tandon

Pada Perakitan dan Pengelasan

PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER

Pengecatan Besi Siku Rangka Tower

PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON

Pengadaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm

PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON

Pasangan Pipa PVC dia. 3/4"
Pengadaan Profile Tank 2200 L

PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pembersihan Lokasi Kran umum

PEKERJAAN TANAH

Pilihan tanah
Pengisian Kembali

PEKERJAAN BETON

Pekerjaan Pas bekisting

Pekerjaan Cor Blok Beton Kran Air

PASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM

Pipa Kran 3/4"
Pipa Air PVC Ø 3/4"
Pipa Air PVC Ø 3/4"

PEKERJAAN AKHIR

Pekerjaan Akhir

100,00 13,51 14,52 28,03 15,93 (1,41)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, S.T., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 11 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
Perwakilan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samarapura-Buruh - P.O. Kotamadya Nabire 99814

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartilis, Wadio)
: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartilis, Wadio)

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 : Empat

KE- 4

Periode : 13 November 2023 - 18 November 2023

: 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KERJAAN PENDAHULUAN													
Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	-	-	2,00	0,91	-	-	-	-
Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	1,00	0,45	2,00	0,91	1,00	0,45	-	-
Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	2,00	0,97	-	-	2,00	0,97	-	-	-	-
K3 Konstruksi Keselamatan dan Promosi K3 terdiri atas:													
Induk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
Perlindungan (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	2,25	0,25	0,75	0,08	3,00	0,33	0,67	0,07	0,08	0,01
Indung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	2,25	0,07	0,75	0,02	3,00	0,09	0,67	0,02	0,08	0,00
Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	2,25	0,02	0,75	0,01	3,00	0,02	0,57	0,00	0,08	0,00
Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	2,75	0,69	0,75	0,23	3,00	0,92	0,67	0,20	0,08	0,03
Tas keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	2,25	0,16	0,75	0,05	3,00	0,22	0,67	0,05	0,08	0,01
KERJAAN PENGEBORAN SUMUR: EKSPLORASI													
Pembersihan Lokal Pengeboran	Ls	4,00	0,58	2,00	0,29	-	-	2,00	0,29	-	-	-	-
Pengeboran segala Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	97,50	16,87	-	-	97,50	16,87	-	-	-	-
Madapan/perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,65	48,75	0,65	97,50	1,31	48,75	0,65	-	-
NGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Ngambilan Sample dan Analisis Sample	Itk	4,00	1,74	2,00	0,87	-	-	2,00	0,87	-	-	-	-
Analisa hasil Coring	Itk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisa Hidrologi	Itk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	1,00	0,73	(1,00)	(0,73)
Poran Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	48,75	1,48	97,50	2,96	48,75	1,48	-	-
Item Plug	BH	4,00	0,06	1,00	0,01	1,00	0,01	2,00	0,03	1,00	0,01	-	-
NGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Ngurungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	0,85	0,13	0,86	0,13	1,72	0,26	0,86	0,13	-	-
KERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	-	-	6,00	0,43	-	-	-	-
Pemulhan	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	-	-	6,00	0,43	-	-	-	-
KERJAAN PENYELESAIAN													
Pembuatan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
PIPA AIR BAKU													
Pipa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	1,00	1,78	-	-	1,00	1,78	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	44,75	0,17	-	-	44,75	0,17	-	-	-	-
KERJAAN TOWER TANDON AIR													
KERJAAN PERSIAPAN :													
Pembersihan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	25,00	0,08	-	-	25,00	0,08	-	-	-	-
Pelatan Tanah	M3	0,22	0,01	0,06	0,00	-	-	0,06	0,00	-	-	-	-
Pelatan Tanah	M3	0,06	0,00	0,02	0,00	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-
KERJAAN BETON PONDASI TOWER													
SLOOF													
Kerjakan Pembesian Sloof	Kg	168,80	0,54	42,20	0,13	-	-	42,20	0,13	-	-	-	-
Pembuatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,57	3,36	0,14	-	-	3,36	0,14	-	-	-	-
Ngacoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,29	0,88	0,32	-	-	0,88	0,32	-	-	-	-
Instal Itik	Kg	71,00	0,23	17,75	0,06	-	-	17,75	0,06	-	-	-	-
Kerjakan Pembesian Pondasi Itik	M2	17,28	0,73	4,32	0,18	-	-	4,32	0,18	-	-	-	-
Pembuatan Bekisting Pondasi Itik	M3	4,64	1,76	1,16	0,44	-	-	1,16	0,44	-	-	-	-
Ngacoran Beton Pondasi Itik K-175													
KERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Itik Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	489,72	0,91	(489,72)	(0,91)
Itik Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	88,20	0,25	(88,20)	(0,25)
Itik Manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	0,23	0,04	(0,23)	(0,04)
Itik Manhole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	16,00	0,12	(16,00)	(0,12)
Itik Bantol M16	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	1,00	0,36	(1,00)	(0,36)
Ngadaan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	1,00	1,09	(1,00)	(1,09)
Itik Perakitan dan Pengelasan													
KERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
Pemecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	7,00	0,14	(7,00)	(0,14)
KERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
Ngadaan Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	5,76	0,30	(5,76)	(0,30)
KERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	8,00	0,06	(8,00)	(0,06)
Ngadaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	1,00	0,58	(1,00)	(0,58)
KERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
KERJAAN PERSIAPAN													
Pembersihan Lokal Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	2,50	0,01	(2,50)	(0,01)
KERJAAN TANAH													
Pelatan Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	0,46	0,02	(0,46)	(0,02)
Pelatan Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	0,36	0,01	(0,36)	(0,01)
KERJAAN BETON													
Kerjakan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	3,92	0,17	(3,92)	(0,17)
Kerjakan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	0,47	0,16	(0,47)	(0,16)
Pemasangan Pipa Dari Tandon ke Kran Umum													
Pipa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02	(1,00)	(0,02)
Pipa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	1,00	0,01	(1,00)	(0,01)
Pipa Kran 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	16,00	0,12	(16,00)	(0,12)
KERJAAN AKHIR													
Kerjakan Akhir	Itk	4,00	1,16	-	-	1,00	0,29	1,00	0,29	1,00	0,29	-	-
Itik				100,00		23,03		3,42		31,44		8,47	(5,05)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPPK)

GUNAWAN ISKANDAR, S.T., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 18 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON WUREWAS, ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 5 - 6

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis,
Wadio)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samudra, Wamena - PPT Samarapura - Wamena - 99511

KONTRAK PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadio)
: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadio)

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : Lima
Periode : 20 November 2023 - 25 November 2023

KE- 5

Anggaran

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KERJAAN PENDAHULUAN													
Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari ekshap ke job site.	Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	1,00	0,45	3,00	1,36	1,00	0,45	-	-
Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil di workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	-	-	2,00	0,91	-	-	-	-
Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat katok ukur beserta alat perengkapannya	Kali	4,00	1,93	2,00	0,97	1,00	0,48	3,00	1,45	1,00	0,48	-	-
K3 Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
Banduk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
Alat pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	3,00	0,35	0,75	0,08	3,75	0,41	0,67	0,07	0,08	0,01
Alat pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	3,00	0,09	0,75	0,02	3,75	0,11	0,67	0,02	0,08	0,00
Alat pelindung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	3,00	0,02	0,75	0,01	3,75	0,03	0,67	0,00	0,08	0,00
Alat pelindung kaki (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	3,00	0,92	0,75	0,23	3,75	1,14	0,67	0,20	0,08	0,03
Alat pelindung badan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	3,00	0,22	0,75	0,05	3,75	0,27	0,67	0,05	0,08	0,01
KERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
Pembersihan Lokasi Pengeboran	Is	4,00	0,58	2,00	0,29	1,00	0,15	3,00	0,44	1,00	0,15	-	-
Pengeboran segala Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	97,50	16,87	48,75	8,43	146,25	25,30	48,75	8,43	-	-
Madat/ peraplan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	97,50	1,31	-	-	97,50	1,31	-	-	-	-
NGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Ngambilan Sample dan Analisis Sample	Itk	4,00	1,74	2,00	0,87	1,00	0,44	3,00	1,31	1,00	0,44	-	-
Analisa hasil Coring	Itk	4,00	5,81	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-
Analisa Hidrologi	Itk	4,00	2,91	-	-	1,00	0,73	1,00	0,73	-	-	1,00	0,73
Peran Akhir	Is	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	97,50	2,96	-	-	97,50	2,96	-	-	-	-
Item Plug	BH	4,00	0,06	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03	-	-	-	-
NGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Pengurungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	1,72	0,26	-	-	1,72	0,26	-	-	-	-
KERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-
KERJAAN PENYELESAIAN													
Pembuatan Box Sumur	Is	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
NGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	1,00	1,78	1,00	1,78	2,00	3,55	1,00	1,78	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	44,75	0,17	44,75	0,17	89,50	0,34	44,75	0,17	-	-
KERJAAN TOWER TANDON AIR													
KERJAAN PERSIAPAN :													
Pembersihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	25,00	0,08	25,00	0,08	50,00	0,16	25,00	0,08	-	-
Pangan Tanah	M3	0,22	0,01	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,01	0,06	0,00	-	-
Pangan Tanah	M3	0,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-	-
KERJAAN BETON PONDASI TOWER													
Rebar	Kg	168,80	0,54	42,20	0,13	42,20	0,13	84,40	0,27	42,20	0,13	-	-
Kerangka Pembesian Sloof	M2	13,44	0,57	3,36	0,14	3,36	0,14	6,72	0,29	3,36	0,14	-	-
Pembesian Bekisting Sloof	M3	3,52	1,29	0,88	0,32	0,88	0,32	1,76	0,65	0,88	0,32	-	-
Pengacoran Beton Sloof K-175													
Rebar Titik	Kg	71,00	0,23	17,75	0,06	17,75	0,06	35,50	0,11	17,75	0,06	-	-
Kerangka Pembesian Pondasi Titik	M2	17,28	0,73	4,32	0,18	4,32	0,18	8,64	0,37	4,32	0,18	-	-
Pembesian Bekisting Pondasi Titik	M3	4,64	1,76	1,16	0,44	1,16	0,44	2,32	0,88	1,16	0,44	-	-
Pengacoran Beton Pondasi Titik K-175													
KERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Rebar Siku 50.50.5 Tangg Utama	Kg	1.950,88	3,63	-	-	652,96	1,21	652,96	1,21	489,72	0,91	163,24	0,30
Rebar Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	117,60	0,33	117,60	0,33	88,20	0,25	29,40	0,08
Rebar Siku 25.25.25 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01
Rebar manhole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	-	-	21,33	0,15	21,33	0,15	16,00	0,12	5,33	0,04
Rebar Baut M16	Bh	4,00	1,45	-	-	1,33	0,48	1,33	0,48	1,00	0,36	0,33	0,12
Pengadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,45	-	-	1,33	0,48	1,33	0,48	1,00	0,36	0,33	0,12
Pipa Peraklan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	1,33	1,45	1,33	1,45	1,00	1,09	0,33	0,36
KERJAAN PENGECAIAN RANGKA TOWER													
Pengelasan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	9,33	0,19	9,33	0,19	7,00	0,14	2,33	0,05
KERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
Pengadaan Papan Lantai Kayu Besi 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	7,68	0,40	7,68	0,40	5,76	0,30	1,92	0,10
KERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	10,67	0,08	10,67	0,08	8,00	0,06	2,67	0,02
Pengadaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	1,33	0,77	1,33	0,77	1,00	0,58	0,33	0,19
KERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
KERJAAN PERSIAPAN													
Pembersihan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	2,50	0,01	(2,50)	(0,01)
KERJAAN TANAH													
Pangan Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	0,46	0,02	(0,46)	(0,02)
Pangan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	0,36	0,01	(0,36)	(0,01)
KERJAAN BETON													
Kerangka Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	3,92	0,17	(3,92)	(0,17)
Pengacoran Pas bekisting	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	0,47	0,16	(0,47)	(0,16)
KERJAAN CAR BLOCK BETON KRAN AIR													
Pemasangan Pipa DARI TANDON KE KRAN UMUM	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02	(1,00)	(0,02)
Pipa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	1,00	0,01	(1,00)	(0,01)
Pipa Kran 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	16,00	0,12	(16,00)	(0,12)
KERJAAN AKHIR													
Kerangka Akhir	Itk	4,00	1,16	1,00	0,29	1,00	0,29	2,00	0,58	1,00	0,29	-	-
KERJAAN AKHIR													
			100,00		31,44		22,27		53,71		20,73		1,54

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPT)

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M. Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Mabes, 25 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M. Si
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samarinda-Berambai - PO. Kotabaru - Kabupaten Kutubara

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadia)
: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadia)

LAPORAN MINGGUAN

: 2023

Minggu Ke : Enam

KE- 6

Periode : 27 November 2023 - 02 Desember 2023

URAIAN PEKERJAAN

KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12 November 2023 - 02 Desember 2023												
Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	-	-	3,00	1,36	-	-	-	-
Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	1,00	0,45	3,00	1,36	1,00	0,45	-	-
Kali	4,00	1,93	3,00	1,45	-	-	3,00	1,45	-	-	-	-
BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
Bh	6,00	0,65	3,75	0,41	0,75	0,08	4,50	0,49	0,67	0,07	0,08	0,01
Bh	6,00	0,17	3,75	0,11	0,75	0,02	4,50	0,13	0,67	0,02	0,08	0,00
Psg	6,00	0,04	3,75	0,03	0,75	0,01	4,50	0,03	0,67	0,00	0,08	0,00
Psg	6,00	1,83	3,75	1,14	0,75	0,23	4,50	1,37	0,67	0,20	0,08	0,03
BH	6,00	0,44	3,75	0,27	0,75	0,05	4,50	0,33	0,67	0,05	0,08	0,01
Ls	4,00	0,58	3,00	0,44	-	-	3,00	0,44	-	-	-	-
M	195,00	33,73	146,25	25,30	-	-	146,25	25,30	-	-	-	-
M	195,00	2,62	97,50	1,31	48,75	0,65	146,25	1,96	48,75	0,65	-	-
Tik	4,00	1,74	3,00	1,31	-	-	3,00	1,31	-	-	-	-
Tik	4,00	5,81	1,00	1,45	1,00	1,45	2,00	2,91	-	-	1,00	1,45
Tik	4,00	2,91	1,00	0,73	1,00	0,73	2,00	1,45	1,00	0,73	-	-
Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	195,00	5,93	97,50	2,96	48,75	1,48	146,25	4,45	48,75	1,48	-	-
BH	4,00	0,06	2,00	0,03	1,00	0,01	3,00	0,04	1,00	0,01	-	-
M3	3,43	0,51	1,72	0,26	0,36	0,13	2,57	0,38	0,66	0,13	-	-
Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	-	-	12,00	0,87	-	-	-	-
Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	-	-	12,00	0,87	-	-	-	-
Ls	4,00	0,58	1,00	0,15	1,00	0,15	2,00	0,29	1,00	0,15	-	-
Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	-	-	2,00	3,55	-	-	-	-
M'	179,00	0,67	89,50	0,34	-	-	89,50	0,34	-	-	-	-
M2	100,00	0,31	50,00	0,16	25,00	0,08	75,00	0,24	-	-	25,00	0,08
M3	0,22	0,01	0,11	0,01	0,06	0,00	0,17	0,01	-	-	0,06	0,00
M3	0,06	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-	-	0,02	0,00
Kg	168,80	0,54	84,40	0,27	42,20	0,13	126,60	0,40	-	-	42,20	0,13
M2	13,44	0,57	6,72	0,29	3,36	0,14	10,08	0,43	-	-	3,36	0,14
M3	3,52	1,29	1,76	0,65	0,88	0,32	2,64	0,97	-	-	0,88	0,32
Kg	71,00	0,23	35,50	0,11	17,75	0,06	53,25	0,17	-	-	17,75	0,06
M2	17,28	0,73	8,64	0,37	4,32	0,18	12,96	0,55	-	-	4,32	0,18
M3	4,64	1,76	2,32	0,88	1,16	0,44	3,48	1,32	-	-	1,16	0,44
Kg	1.958,88	3,63	652,96	1,21	652,96	1,21	1.305,92	2,42	-	-	652,96	1,21
Kg	352,80	1,00	117,60	0,33	117,60	0,33	235,20	0,67	-	-	117,60	0,33
M2	0,92	0,16	0,31	0,05	0,31	0,05	0,61	0,10	-	-	0,31	0,05
Bh	64,00	0,46	21,33	0,15	21,33	0,15	42,67	0,31	-	-	21,33	0,15
Bh	4,00	1,45	1,33	0,48	1,33	0,48	2,67	0,97	-	-	1,33	0,48
Unit	4,00	4,36	1,33	1,45	1,33	1,45	2,67	2,91	-	-	1,33	1,45
M2	28,00	0,57	9,33	0,19	9,33	0,19	18,67	0,38	-	-	9,33	0,19
M2	23,04	1,21	7,68	0,40	7,68	0,40	15,36	0,81	-	-	7,68	0,40
M	32,00	0,24	10,67	0,08	10,67	0,08	21,33	0,16	-	-	10,67	0,08
Bh	4,00	2,31	1,33	0,77	1,33	0,77	2,67	1,54	-	-	1,33	0,77
M'	10,00	0,03	-	-	5,00	0,02	5,00	0,02	-	-	5,00	0,02
M3	1,84	0,10	-	-	0,92	0,05	0,92	0,05	-	-	0,92	0,05
M3	1,44	0,02	-	-	0,72	0,01	0,72	0,01	-	-	0,72	0,01
M2	15,68	0,67	-	-	7,84	0,33	7,84	0,33	-	-	7,84	0,33
M3	1,88	0,65	-	-	0,94	0,33	0,94	0,33	-	-	0,94	0,33
Bh	4,00	0,08	-	-	2,00	0,04	2,00	0,04	-	-	2,00	0,04
Bh	4,00	0,04	-	-	2,00	0,02	2,00	0,02	-	-	2,00	0,02
M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-	32,00	0,24
Tik	4,00	1,16	2,00	1,58	-	-	2,00	0,58	-	-	-	-
100,00			53,71		12,98		66,69		3,95		9,03	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

GUHANAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 02 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

PELAKSANA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 7 - 8

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis,
Wadio)



1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
2. Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadia)
3. PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadia)

LAPORAN MINGGUAN

09/01/2023

2023

Minggu Ke : 7

Periode : 04 Desember 2023 - 09 Desember 2023

KE- 7

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
Berat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari shop ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-
Bobot peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	-	-	3,00	1,36	-	-	-	-
Isangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	3,00	1,45	1,00	0,48	4,00	1,93	1,00	0,48	-	-
1. Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
duk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	4,50	0,47	0,75	0,08	5,25	0,57	0,67	0,07	0,08	0,01
goggles mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	4,50	0,13	0,75	0,02	5,25	0,15	0,67	0,02	0,08	0,00
gloves tangan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	4,50	0,03	0,75	0,01	5,25	0,04	0,67	0,00	0,08	0,00
shoes keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,83	4,50	1,37	0,75	0,23	5,25	1,60	0,67	0,20	0,08	0,03
vest keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	4,50	0,33	0,75	0,05	5,25	0,38	0,67	0,05	0,08	0,01
PEKERJAAN PENGEBOARAN SUMUR EKSPLORASI													
bersih Lokasi pengeboran	Is	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-
boran segara formal diameter 6"	M	195,00	33,73	146,25	25,30	48,75	8,43	195,00	33,73	48,75	8,43	-	-
gatal/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,96	-	-	146,25	1,96	-	-	-	-
SAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
ambilan Sample dan Analisis Sample	Tik	4,00	1,74	3,00	1,31	1,00	0,44	4,00	1,74	1,00	0,44	-	-
hasil Coring	Tik	4,00	5,81	2,00	2,91	1,00	1,45	3,00	4,36	1,00	1,45	-	-
isa Hidrologi	Tik	4,00	2,91	2,00	1,45	1,00	0,73	3,00	2,18	-	-	1,00	0,73
an Akhir	Is	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,45	-	-	146,25	4,45	-	-	-	-
in Plug	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	-	-	3,00	0,04	-	-	-	-
PEKERJAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
urungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	-	-	2,57	0,38	-	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES													
ompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	6,00	0,43	18,00	1,30	6,00	0,43	-	-
emulsi	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	6,00	0,43	18,00	1,30	6,00	0,43	-	-
PEKERJAAN PENYELESAIAN													
buatan Box Sumur	Is	4,00	0,58	2,00	0,29	1,00	0,15	3,00	0,44	1,00	0,15	-	-
PEKERJAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
IPA AIR BAKU													
pa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	1,00	1,78	3,00	5,33	1,00	1,78	-	-
asangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	89,50	0,34	44,75	0,17	134,25	0,50	44,75	0,17	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERSIAPAN :													
bersihan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	75,00	0,24	25,00	0,08	100,00	0,31	25,00	0,08	-	-
an Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,06	0,00	-	-
an Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	-	-
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER													
PEKERJAAN PEMBEKASTAN SLOOF													
buatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,57	10,08	0,43	3,36	0,14	13,44	0,57	3,36	0,14	-	-
tecoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	0,88	0,32	-	-
PEKERJAAN PEMBEKASTAN PONDASI TITIK													
buatan Bekisting Pondasi Titik	M2	71,00	0,23	53,25	0,17	17,75	0,06	71,00	0,23	17,75	0,06	-	-
tecoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	17,28	0,73	12,96	0,55	4,32	0,18	17,28	0,73	4,32	0,18	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Siku 50,50,5 Tiang Utama	Kg	1,958,88	3,63	1,305,92	2,42	652,96	1,21	1,958,88	3,63	489,72	0,91	1,63,24	0,30
Siku 40,40,4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	235,20	0,67	117,60	0,33	352,80	1,00	88,20	0,25	29,40	0,08
manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	0,61	0,10	0,31	0,05	0,92	0,16	0,23	0,04	0,08	0,01
kur Baut M16	Bh	64,00	0,46	42,67	0,31	21,33	0,15	64,00	0,46	16,00	0,12	5,33	0,04
gadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,45	2,67	0,97	1,33	0,48	4,00	1,45	1,00	0,36	0,33	0,12
Perakitan dan Penyelesaian	Unit	4,00	4,36	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,36	1,00	1,09	0,33	0,36
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
ecatan Basal Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	18,67	0,36	9,33	0,19	28,00	0,57	7,00	0,14	2,33	0,05
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
gadaan Papan Lantai Kayu Basal T= 2 cm	M2	23,04	1,21	15,36	0,81	7,68	0,40	23,04	1,21	5,76	0,30	1,92	0,10
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
asangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	21,33	0,16	10,67	0,08	32,00	0,24	8,00	0,06	2,67	0,02
gadaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	2,67	1,54	1,33	0,77	4,00	2,31	1,00	0,58	0,33	0,19
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
PEKERJAAN PERSIAPAN													
bersihan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	5,00	0,02	5,00	0,02	10,00	0,03	2,50	0,01	2,50	0,01
PEKERJAAN TANAH													
an Tanah	M3	1,84	0,10	0,92	0,05	0,92	0,05	1,84	0,10	0,46	0,02	0,46	0,02
an Kembali	M3	1,44	0,02	0,72	0,01	0,72	0,01	1,44	0,02	0,36	0,01	0,36	0,01
PEKERJAAN BETON													
erakitan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	7,84	0,33	7,84	0,33	15,68	0,67	3,92	0,17	3,92	0,17
asangan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	0,94	0,33	0,94	0,33	1,88	0,65	0,47	0,16	0,47	0,16
PEKERJAAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
erakitan 3/4"	Bh	4,00	0,08	2,00	0,04	2,00	0,04	4,00	0,08	1,00	0,02	1,00	0,02
erakitan 3/4"	Bh	4,00	0,04	2,00	0,02	2,00	0,02	4,00	0,04	1,00	0,01	1,00	0,01
erakitan 3/4"	M	64,00	0,48	32,00	0,24	32,00	0,24	64,00	0,48	16,00	0,12	16,00	0,12
PEKERJAAN AKHIR													
erakitan Akhir	Tik	4,00	1,16	2,00	0,58	1,00	0,29	3,00	0,87	1,00	0,29	-	-
TOTAL													
			100,00		66,67		23,30		90,00		20,73		2,57

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si

NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 09 Desember 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMJEWAS, ST

Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Bontomatene Kecamatan, PTP, Kabupaten, Mamberi

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartila, Wado)
: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumartila, Wado)

LAPORAN MINGGUAN

: 2023

Minggu Ke : Delapan

KE- 8

Periode : 11 Desember 2023 - 13 Desember 2023

Anggaran

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KERJAAN PENDAHULUAN													
biaya peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-	4,00	1,81	-	-	-	-
mobilitas peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil di workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-
pasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	4,00	1,93	-	-	4,00	1,93	-	-	-	-
K3 Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
Induk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	5,25	0,57	0,75	0,08	6,00	0,65	0,67	0,07	0,08	0,01
indung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	5,25	0,15	0,75	0,02	6,00	0,17	0,67	0,02	0,08	0,00
ung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	5,25	0,04	0,75	0,01	6,00	0,04	0,67	0,00	0,08	0,00
atu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	5,25	1,60	0,75	0,23	6,00	1,83	0,67	0,20	0,08	0,03
api keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	5,25	0,38	0,75	0,05	6,00	0,44	0,67	0,05	0,08	0,01
KERJAAN PENGEBOREAN SUMUR EKSPLORASI													
mbenthan Lokasi Pengeboran	Is	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-	4,00	0,58	-	-	-	-
geboran segala Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	19,00	33,73	-	-	195,00	33,73	-	-	-	-
nodatan/ peraplan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,76	48,75	0,65	195,00	2,62	48,75	0,65	-	-
GAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
gambilan Sample dan Analisis Sample	Itk	4,00	1,74	4,00	1,74	-	-	4,00	1,74	-	-	-	-
alisis hasil Coring	Itk	4,00	5,81	3,00	4,36	1,00	1,45	4,00	5,81	-	-	1,00	1,45
alisa Hidrologi	Itk	4,00	2,91	3,00	2,18	1,00	0,73	4,00	2,91	1,00	0,73	-	-
oran Akhir	Is	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45
PGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
a PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	48,75	1,48	-	-
tem Plug	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	1,00	0,01	-	-
PGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
ngurungan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park lentenu	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	0,86	0,13	3,43	0,51	0,86	0,13	-	-
KERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,73	18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-	-
KERJAAN PENYELESAIAN													
mbuatan Box Sumur	Is	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-
PGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
MPA AIR BAKU													
mpa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	3,00	5,33	1,00	1,78	4,00	7,10	1,00	1,78	-	-
masangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	134,25	0,50	44,75	0,17	179,00	0,67	44,75	0,17	-	-
KERJAAN TOWER TANDON AIR													
KERJAAN PERSIAPAN :													
mbenthan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-	100,00	0,31	25,00	0,08	(25,00)	(0,08)
ilan Tanah	M3	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01	0,06	0,00	(0,06)	(0,00)
gan Tanah	M3	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-	0,06	0,00	0,02	0,00	(0,02)	(0,00)
KERJAAN BETON PONDASI TOWER													
ot	Kg	168,80	0,54	168,80	0,54	-	-	168,80	0,54	42,20	0,13	(42,20)	(0,13)
erjaan Pambesian Sloop	M2	13,44	0,57	13,44	0,57	-	-	13,44	0,57	3,36	0,14	(3,36)	(0,14)
mbuatan Bekisting Sloop	M3	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-	3,52	1,29	0,88	0,32	(0,88)	(0,32)
ngacoran Beton Sloop K-175													
ndasi Itik	Kg	71,00	0,23	71,00	0,23	-	-	71,00	0,23	7,75	0,06	(17,75)	(0,06)
erjaan Pambesian Pondasi Itik	M2	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-	17,28	0,73	4,32	0,18	(4,32)	(0,18)
mbuatan Bekisting Pondasi Itik	M3	4,64	1,76	4,64	1,76	-	-	4,64	1,76	1,16	0,44	(1,16)	(0,44)
KERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
il Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,63	1.958,88	3,63	-	-	1.958,88	3,63	-	-	-	-
il Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	352,80	1,00	-	-	352,80	1,00	-	-	-	-
il manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	0,92	0,16	-	-	0,92	0,16	-	-	-	-
gkur Batil M16	Bh	64,00	0,46	64,00	0,46	-	-	64,00	0,46	-	-	-	-
ngadaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,45	4,00	1,45	-	-	4,00	1,45	-	-	-	-
sa Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	4,00	4,36	-	-	4,00	4,36	-	-	-	-
KERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
ngacoran Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	28,00	0,57	-	-	28,00	0,57	-	-	-	-
KERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
ngadaan Papan Lantai Kayu Besi 1" 2 cm	M2	23,04	1,21	23,04	1,21	-	-	23,04	1,21	-	-	-	-
KERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
masangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-	32,00	0,24	-	-	-	-
ngadaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,31	4,00	2,31	-	-	4,00	2,31	-	-	-	-
KERJAAN PEMASANGAN KRAH UMUM													
KERJAAN PERSIAPAN													
mbenthan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	-	-	-	-
KERJAAN TANAH													
ilan tanah	M3	1,84	0,10	1,84	0,10	-	-	1,84	0,10	-	-	-	-
rgan Kembali	M3	1,44	0,02	1,44	0,02	-	-	1,44	0,02	-	-	-	-
KERJAAN BETON													
ngadaan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	15,68	0,67	-	-	15,68	0,67	-	-	-	-
erjaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	1,88	0,65	-	-	1,88	0,65	-	-	-	-
MASANGAN PIPA DI RI TANDON KE KRAH UMUM													
ap Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	4,00	0,08	-	-	4,00	0,08	-	-	-	-
ap Kran 3/4	Bh	4,00	0,04	4,00	0,04	-	-	4,00	0,04	-	-	-	-
an Air PVC Ø 3/4"	M	64,00	0,48	64,00	0,48	-	-	64,00	0,48	-	-	-	-
il Pipa PVC 3/4"													
KERJAAN AKHIR													
erjaan Akhir	Itk	4,00	1,16	3,00	0,87	1,00	0,29	4,00	1,16	-	-	1,00	0,29
erjaan Akhir				100,00		90,00		10,00		100,00		8,13	1,88

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PTK)

SUNAWAN ISKANDAR, ST, M. Si
NIP. 19791117 201004 1 002

13 Desember 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON BUMBAWAS, ST
Pelaksana

LAPORAN BULANAN

OKTOBER

2023



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabre II (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadof)

: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wonorejo, Karang Tumaritis, Wadof)

LAPORAN BULANAN

Bulan Ke : Satu

Hal. 1

: 2023

Periode : 24 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
Penyediaan peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari lapangan ke job site.	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Penyediaan peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alatengkapannya	Kali	4,00	1,93	-	-	1,00	0,48	1,00	0,48	1,00	0,48	-	-
PEKERJAAN KONSERVASI DAN PROMOSI K3 TERDAPAT:													
Penyediaan	BH	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
Penyediaan (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	-	-	1,50	0,16	1,50	0,16	1,33	0,15	0,17	0,02
Penyediaan (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	-	-	1,50	0,04	1,50	0,04	1,33	0,04	0,17	0,00
Penyediaan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	-	-	1,50	0,01	1,50	0,01	1,33	0,01	0,17	0,00
Penyediaan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	-	-	1,50	0,46	1,50	0,46	1,33	0,41	0,17	0,05
Penyediaan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	-	-	1,50	0,11	1,50	0,11	1,33	0,10	0,17	0,01
PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI													
Penyediaan Lokasi Pengambilan	Ls	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
Pengambilan segala format diameter 6"	M	195,00	33,73	-	-	48,75	8,43	48,75	8,43	48,75	8,43	-	-
Pengambilan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Itk	4,00	1,74	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
Penyediaan hasil Coring	Itk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,00)	(1,45)
Penyediaan Hidrologi	Itk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
Pengadaan PIPA diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,48	-	-
Pipa Plug	BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Pengisian dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Part tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES													
Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemulihan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENYELESAIAN													
Pembuatan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
PMPA AIR BAKU	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Submersible Phase	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERSIAPAN :													
Penyediaan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER													
Pondasi	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembesian Pondasi	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembesian Pondasi	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pondasi Pondasi	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembesian Pondasi Pondasi	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pondasi Pondasi Pondasi	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Pipa Siku 50,50,5 Triang Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Siku 40,40,4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Batil M16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa bh	bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Unil	Unil	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
Pengcatan Batil Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
Pengadaan Papan Lantai Kayu Batil 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
PEKERJAAN PERSIAPAN													
Penyediaan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH													
Pan tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON													
Pondasi Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pondasi Cor Block Beton Kran Air	M3	1,68	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGADAAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
Pipa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Kran 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa Air PVC 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AKHIR													
Penyediaan Akhir	Itk	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			100,00			13,51		13,51		14,88		(1,37)	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

GUNAWAN ISKANDAR, S.T., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabre, 31 Oktober 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

WINON RUMBEWAS, ST
Pelaksana

LAPORAN BULANAN

NOVEMBER

2023



Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat : Jalan Raya Samudra Bawah - PPI Nabire - Nabire 99811

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Oyehe, Bumi Wororejo, Karang Tumaritis, Wado)

: PAKET 7 (Oyehe, Bumi Wororejo, Karang Tumaritis, Wado)

LAPORAN BULANAN

Daftar

: 2023

Bulan Ke : Dua

KE- 2

Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URAIAN PENDAHULUAN													
Beral peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari shop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36	-	-
Substansi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36	-	-
Pengisian Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat makapennya	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	2,00	0,97	3,00	1,45	3,00	1,45	-	-
1. Konstruksi Satisfasasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
Induk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,45	1,00	0,15	3,00	0,33	4,50	0,49	4,00	0,44	0,50	0,05
goggles mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	1,50	0,04	3,00	0,09	4,50	0,13	4,00	0,12	0,50	0,01
gloves tangan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	1,50	0,01	3,00	0,02	4,50	0,03	4,00	0,03	0,50	0,00
shoes keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,83	1,50	0,41	3,00	0,92	4,50	1,37	4,00	1,22	0,50	0,15
vest keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	1,50	0,11	3,00	0,22	4,50	0,33	4,00	0,29	0,50	0,04
URAIAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
bersihan Lokal pengeboran	Ls	4,00	0,58	1,00	0,15	2,00	0,29	3,00	0,44	3,00	0,44	-	-
boran segala Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	97,50	16,87	146,25	25,30	146,25	25,30	-	-
adatan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,65	97,50	1,31	146,25	1,96	146,25	1,96	-	-
PAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
pambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,74	1,00	0,44	2,00	0,87	3,00	1,31	3,00	1,31	-	-
hasil hasil Coring	Ttk	4,00	5,81	-	-	2,00	2,91	2,00	2,91	3,00	4,36	(1,00)	(1,45)
isa Hidrologi	Ttk	4,00	2,91	-	-	2,00	1,45	2,00	1,45	2,00	1,45	-	-
ran Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	97,50	2,96	146,25	4,45	146,25	4,45	-	-
tm Plug	BH	4,00	0,06	1,00	0,01	2,00	0,03	3,00	0,04	3,00	0,04	-	-
PADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
urungan dinding Lubang Bor (Material Filter) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	0,66	0,13	1,72	0,26	2,57	0,38	2,57	0,38	-	-
URAIAN PUMPING TES													
ompaan bertahap dan uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-
emulhan	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-
URAIAN PENYELESAIAN													
buatan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	2,00	0,29	2,00	0,29	2,00	0,29	-	-
PADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
IPA AIR BAKU													
pa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	2,00	3,55	2,00	3,55	2,00	3,55	-	-
asangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	-	-	89,50	0,34	89,50	0,34	89,50	0,34	-	-
URAIAN TOWER TANDON AIR													
URAIAN PERSIAPAN :													
bersihan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	-	-	75,00	0,24	75,00	0,24	50,00	0,16	25,00	0,08
an Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	0,17	0,01	0,17	0,01	0,11	0,01	0,06	0,00
an Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00
URAIAN BETON FONDASI TOWER													
rfan Pembesian Sloop	Kg	168,80	0,54	-	-	126,60	0,40	126,60	0,40	84,40	0,27	42,20	0,13
buatan Bekisting Sloop	M2	13,44	0,57	-	-	10,08	0,43	10,08	0,43	6,72	0,29	3,36	0,14
ecoran Beton Sloop K-175	M3	3,52	1,29	-	-	2,64	0,97	2,64	0,97	1,76	0,65	0,88	0,32
asal Ttk													
rfan Pembesian Pondasi Ttk	Kg	71,00	0,23	-	-	53,25	0,17	53,25	0,17	35,50	0,11	17,75	0,06
buatan Bekisting Pondasi Ttk	M2	17,28	0,73	-	-	12,96	0,55	12,96	0,55	8,64	0,37	4,32	0,18
ecoran Beton Pondasi Ttk K-175	M3	4,64	1,76	-	-	3,48	1,32	3,48	1,32	2,32	0,88	1,16	0,44
URAIAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Siku 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,63	-	-	1.305,92	2,42	1.305,92	2,42	979,44	1,82	326,48	0,61
Siku 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	235,20	0,67	235,20	0,67	176,40	0,50	58,80	0,17
manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	0,61	0,10	0,61	0,10	0,46	0,08	0,15	0,03
kur Baut M16	Bh	64,00	0,46	-	-	47,67	0,31	47,67	0,31	32,00	0,23	10,67	0,08
gadaan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,45	-	-	2,67	0,97	2,67	0,97	2,00	0,73	0,67	0,24
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	2,67	2,91	2,67	2,91	2,00	2,18	0,67	0,73
URAIAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
ecatan Bas Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	18,67	0,38	18,67	0,38	14,00	0,29	4,67	0,09
URAIAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
gadaan Papan Lantai Kayu Bas T= 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	15,36	0,81	15,36	0,81	11,52	0,61	3,84	0,20
URAIAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
asangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	21,33	0,16	21,33	0,16	16,00	0,12	5,33	0,04
gadaan Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,31	-	-	2,67	1,54	2,67	1,54	2,00	1,16	0,67	0,39
URAIAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
URAIAN PERSIAPAN :													
bersihan Lokal Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	5,00	0,02	5,00	0,02	5,00	0,02	-	-
URAIAN TANAH													
an Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	0,92	0,05	0,92	0,05	0,92	0,05	-	-
an Kembali	M3	1,44	0,02	-	-	0,72	0,01	0,72	0,01	0,72	0,01	-	-
URAIAN BETON													
rfan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	9,94	0,33	9,94	0,33	7,84	0,33	-	-
rfan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	-	-	0,94	0,33	0,94	0,33	0,94	0,33	-	-
ASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	2,00	0,04	2,00	0,04	2,00	0,04	-	-
Alir PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	2,00	0,02	2,00	0,02	2,00	0,02	-	-
Pipa PVC Ø 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-
URAIAN AKHIR													
rfan Akhir	Ttk	4,00	1,16	-	-	2,00	0,58	2,00	0,58	2,00	0,58	-	-
JUMLAH				100,00	13,51		53,18		65,69		63,95		2,74

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTG)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si

NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 10 November 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBOWAS, ST

Pelaksana

LAPORAN BULANAN

DESEMBER

2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samudra Banih - PPN Lonsada, Kabupaten Paniai

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengelolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Naha II (Oyeh, Bumi Wonorejo, Korang Tumartis, Wado)

LAPORAN BULANAN

: 2023

Bulan Ke : Tiga

KE - 3

Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023													
BAHAN PENDAHULUAN													
alat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari top ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-
bilas alat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil arkapap ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-
angan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk angkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat gikapannya	Kali	4,00	1,93	3,00	1,45	1,00	0,48	4,00	1,93	4,00	1,93	-	-
Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
duk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
elindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	4,50	0,49	1,50	0,16	6,00	0,65	5,33	0,58	0,67	0,07
ung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	4,50	0,13	1,50	0,04	6,00	0,17	5,33	0,16	0,67	0,02
angan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	4,50	0,03	1,50	0,01	6,00	0,04	5,33	0,04	0,67	0,00
keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	4,50	1,37	1,50	0,46	6,00	1,83	5,33	1,63	0,67	0,20
keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	4,50	0,33	1,50	0,11	6,00	0,44	5,33	0,39	0,67	0,05
BAHAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
erlahan Lokal Penggeboran	Ls	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-
boran segala Format diameter 6"	M	195,00	33,73	146,25	25,30	48,75	8,43	195,00	33,73	195,00	33,73	-	-
atan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,96	48,75	0,65	195,00	2,62	195,00	2,62	-	-
AMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
ambilan Sample dan Analisa Sample	Itk	4,00	1,74	3,00	1,31	1,00	0,44	4,00	1,74	4,00	1,74	-	-
is hasil Coring	Itk	4,00	5,81	2,00	2,91	2,00	2,91	4,00	5,81	4,00	5,81	-	-
ia Hidrologi	Itk	4,00	2,91	2,00	1,45	1,00	1,45	4,00	2,91	3,00	2,18	1,00	0,73
an Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45
ADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	195,00	5,93	-	-
Plug	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	4,00	0,06	-	-
ADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
angan dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	0,86	0,13	3,43	0,51	3,43	0,51	-	-
UJIAN PUMPING TES													
ompompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-
mulihan	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-
UJIAN PENYELESAIAN													
latan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	2,00	0,29	2,00	0,29	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-
ADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
PA AIR BAKU													
ia Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	2,00	3,55	4,00	7,10	4,00	7,10	-	-
angan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	89,50	0,34	89,50	0,34	179,00	0,67	179,00	0,67	-	-
UJIAN TOWER TANDON AIR													
UJIAN PERSIAPAN :													
erlahan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	75,00	0,24	25,00	0,08	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-
in Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-
in Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-
UJIAN BETON PONDASI TOWER													
Ujian Pembesian Stool													
uatian Bekisting Stool	M2	13,44	0,57	10,08	0,43	3,36	0,14	13,44	0,57	13,44	0,57	-	-
ecoran Beton Stool K-175	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-
ial Titik	Kg	71,00	0,23	53,25	0,17	17,75	0,06	71,00	0,23	71,00	0,23	-	-
Ujian Pembesian Pondasi Titik	M2	17,28	0,73	12,76	0,55	4,52	0,18	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-
ecoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,76	3,48	1,32	1,16	0,44	4,64	1,76	4,64	1,76	-	-
UJIAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Stuk 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1,958,88	3,63	1,305,92	2,17	652,96	1,21	1,958,88	3,63	1,469,16	2,73	489,72	0,91
Stuk 352.80	Kg	352,80	1,00	235,20	0,7	117,60	0,33	352,80	1,00	264,60	0,75	88,20	0,25
Stuk 40.40.4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	0,61	0,10	0,31	0,05	0,92	0,16	0,69	0,12	0,23	0,04
manhole lebar 1 cm	Bh	64,00	0,46	42,67	0,31	21,33	0,15	64,00	0,46	48,00	0,35	16,00	0,12
ur Baut M16	Bh	4,00	1,45	2,67	0,97	1,33	0,48	4,00	1,45	3,00	1,09	1,00	0,36
adaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	4,36	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,36	3,00	3,27	1,00	1,09
Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,36	3,00	3,27	1,00	1,09
UJIAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
ecatan Bas Stuk Rangka Tower	M2	28,00	0,57	18,67	0,38	9,33	0,19	28,00	0,57	21,00	0,43	7,00	0,14
UJIAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
adaan Papan Lantai Kayu Bas 2 cm	M2	23,04	1,21	15,36	0,81	7,68	0,40	23,04	1,21	17,28	0,91	5,76	0,30
UJIAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
angan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	21,33	0,16	10,67	0,08	32,00	0,24	24,00	0,18	8,00	0,06
adaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	2,67	1,54	1,33	0,77	4,00	2,31	3,00	1,74	1,00	0,58
UJIAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
UJIAN PERSIAPAN													
erlahan Lokal Kran umum	M'	10,00	0,03	5,00	0,02	5,00	0,02	10,00	0,03	7,50	0,02	2,50	0,01
UJIAN TANAH													
in Tanah	M3	1,84	0,10	0,92	0,05	0,92	0,05	1,84	0,10	1,38	0,07	0,46	0,02
in Tanah	M3	1,44	0,02	0,72	0,01	0,72	0,01	1,44	0,02	1,08	0,02	0,36	0,01
in Kembali													
UJIAN BETON													
adaan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	7,84	0,33	7,84	0,33	15,68	0,67	11,76	0,50	3,92	0,17
adaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	0,94	0,33	0,94	0,33	1,88	0,65	1,41	0,49	0,47	0,16
ASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
Kran 3/4	Bh	4,00	0,08	2,00	0,04	2,00	0,04	4,00	0,08	3,00	0,06	1,00	0,02
Alat PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	2,00	0,02	2,00	0,02	4,00	0,04	3,00	0,03	1,00	0,01
Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,48	32,00	0,24	32,00	0,24	64,00	0,48	48,00	0,36	16,00	0,12
UJIAN AKHIR													
Ujian Akhir	Itk	4,00	1,16	2,00	0,58	2,00	0,58	4,00	1,16	3,00	0,87	1,00	0,29
JUMLAH													
			100,00		66,69		33,31		100,00		92,81		7,19

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M. SI
NIP. 19791117 201004 1 002

Notaris, 13 Desember 2023
KORPUS PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBOWAS, ST
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN PEKERJAAN

BOBOT 0% - 100%

PERIODE 25 OKTOBER 2023 S/D 12 DESEMBER 2023

KEGIATAN :

**PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR
TANAH DALAM DAERAH PROVINSI**

PEKERJAAN :

**Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona
Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar
Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)**

LOKASI :

Nabire II PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)

KONSULTAN PENGAWAS



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI
JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAL DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023



KURVA S													
Bulan Ke :Satu													
Periode : 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023													
Minggu ke													
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KET.
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74	RENCANA	1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35	100,00
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-	90,00
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00
			REALISASI	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78	RENCANA	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	60,00
			REALISASI	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	3,85	5,21	-	5,21	1,36	3,85	40,00
			REALISASI	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,07	RENCANA	-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52	20,00
			REALISASI	-	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	10,00
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	-	0,29	10,00
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	0,00
JUMLAH		100,00											
RENCANA				11,80	3,08	15,93	8,47	20,73	3,95	20,73	8,13	7,19	
KUMULATIF				11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00	
REALISASI				10,39	3,12								
KUMULATIF				10,39	13,51								

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTK)

[Signature]

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002



KONSULTAN PENGAWAS
ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KLASINA YANSEMA
DIREKTORIS

KURVA S

Bulan Ke : Dua
Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wonggar,
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi
Wonggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
LOKASI : PAKET 12 (Wonggar, Wonggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
TAHUN ANGGARAN : 2023

LOKASI : PAKET 12 (Wonggar, Wanggar Makmur, Bumi Kaya, Tugu Makmur)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8.74	RENCANA	1.33	0.80	1.28	0.80	1.28	0.80	1.28	0.80	1.28	0.80	1.28	0.80	1.28	0.35	100.00
			REALISASI	1.37	0.85	1.33	0.85	1.33	0.85	1.33	0.85	1.33	0.85	1.33	0.85	1.33	0.85	-
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59.39	RENCANA	10.47	2.28	11.33	3.01	11.48	3.15	11.48	3.15	11.48	4.02	2.18	80.00			80.00
			REALISASI	9.01	2.28	9.88	2.28	12.21	4.60	12.21	6.92	-	70.00					70.00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7.78	RENCANA	-	-	1.94	-	1.94	-	1.94	-	1.94	1.94	-	60.00			60.00
			REALISASI	-	-	1.94	-	1.94	-	1.94	1.94	-	50.00					50.00
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20.86	RENCANA	-	-	1.36	3.85	5.21	-	5.21	-	5.21	1.36	3.85	40.00			40.00
			REALISASI	-	-	1.34	-	6.50	6.50	6.50	-	-	30.00					30.00
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2.07	RENCANA	-	-	-	0.52	0.52	-	0.52	-	0.52	-	0.52	20.00			20.00
			REALISASI	-	-	-	-	-	1.04	1.04	-	-	10.00					10.00
F	PEKERJAAN AKHIR	1.16	RENCANA	-	-	-	0.29	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	0.00			0.00
			REALISASI	-	-	-	0.49	0.29	-	0.29	0.29	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	100.00		11.80	3.08	15.93	8.47	20.73	3.95	20.73	8.13	7.19						
	RENCANA			11.80	14.88	30.80	39.27	60.00	63.95	84.69	92.81	100.00						
	KUMULATIF			10.39	3.12	14.52	3.42	22.27	12.98									
	REALISASI			10.39	13.51	28.03	31.44	53.71	66.69									

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTK)

[Signature]

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SJ
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



KASINA YANSEMA
DIREKTIRIS

KURVA S

Bulan Ke : Tiga
Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar,
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar,
Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
LOKASI : PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
TAHUN ANGGARAN : 2023

LOKASI : PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Kaya, Tadu Mambau)														
TAHUN ANGGARAN : 2023														
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74		1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35	100,00	
			RENCANA											
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00	
			REALISASI	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00	
			RENCANA	-	-	1,94	-	1,74	-	1,94	1,94	-	60,00	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78	RENCANA	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00	
			REALISASI	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00	
			RENCANA	-	-	1,36	3,55	5,21	6,50	5,21	1,36	3,85	40,00	
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00	
			REALISASI	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00	
			RENCANA	-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	0,52	0,52	20,00	
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,07	REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	
			RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	0,29	0,00	
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	0,29	0,00	
			RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH				11,80	3,08	15,93	8,47	20,73	3,95	20,73	8,13	7,19		
BOBOT KUMULATIF				11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00		
BOBOT KUMULATIF				10,39	3,12	14,52	3,42	22,27	12,98	23,30	10,00	100,00		
REALISASI				10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69	90,00	100,00	100,00		

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

[Signature]

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
[Signature]
KASINA YANSEMA
DIREKTIS

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 - 2

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya,
Yaro Makmur)



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yara Makmur)
: PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yara Makmur)
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

NO

Minggu Ke : Satu
Periode : 25 Oktober 2023 - 28 Oktober 2023

KE- 1

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URAHAN PENDAHULUAN													
Penetapan alat peralat bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Penetapan alat peralat bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan alat peralat bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	1,93	-	-	1,00	0,48	1,00	0,48	1,00	0,48	-	-
Penetapan alat peralat bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	1,93	-	-	1,00	0,48	1,00	0,48	1,00	0,48	-	-
Konstruksi Sertifikasi dan Promosi K3 terdapat atas:													
Buku	BH	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
Penutup (Safety Helmet)	BH	6,00	0,65	-	-	0,75	0,08	0,75	0,08	0,67	0,07	0,08	0,01
Kacamata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	-	-	0,75	0,02	0,75	0,02	0,67	0,02	0,08	0,00
Sarung tangan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	-	-	0,75	0,01	0,75	0,01	0,67	0,00	0,08	0,00
Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,83	-	-	0,75	0,23	0,75	0,23	0,67	0,20	0,08	0,03
Rompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	-	-	0,75	0,05	0,75	0,05	0,67	0,05	0,08	0,01
URAHAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI													
Penetapan Lokasi Pengeboran	Is	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
Pengeboran sedala Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	-	-	48,75	8,43	48,75	8,43	48,75	8,43	-	-
Pengaturan/ perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Trk	4,00	1,74	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
Hasil hasil Coring	Trk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,00)	(1,45)
Hasil hidrologi	Trk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil akhir	Is	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plug	BH	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Pengaturan dinding lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PUMPING TES													
Pengaturan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PENYELESAIAN													
Pengaturan Box Sumur	Is	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
URAHAN AIR BAKU													
Pengaturan Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN TOWER TANDON AIR													
URAHAN PERSIAPAN:													
Pengaturan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN BETON FONDASI TOWER													
Pengaturan Pembesian Sloop	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Bekisting Sloop	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Beton Sloop K-175	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Titi	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Pembesian Pondasi Titi	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Bekisting Pondasi Titi	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
Batu 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batu 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batu 40.40.4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manhole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batu 40.40.4	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
Pengaturan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
Pengaturan Papan Lantai Kayu Besi 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pengaturan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Profil Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
URAHAN PERSIAPAN													
Pengaturan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN TANAH													
Pengaturan Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN BETON													
Pengaturan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Pas bekisting	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN COR BLOCK BETON KRAN AIR													
Pengaturan Cor Block Beton Kran Air	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
Pengaturan Kran 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Kran 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengaturan Kran 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAHAN AKHIR													
Pengaturan Akhir	Trk	4,00	1,16	-	-	-	-	10,39	-	10,39	-	11,80	(1,41)
			100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M. Si

NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 28 Oktober 2023
KONSULTAN PENGAWAS
ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS, ST
Pelaksana



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
: PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)

LAPORAN MINGGUAN

: 2023

Minggu Ke : Dua

KE- 2

Periode : 30 Oktober 2023 - 04 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BAHAN PENDAHULUAN													
1. Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-	1,00	0,45	-	-	-	-
2. Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil ke job site.	Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
3. Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pengkalan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	-	-	1,00	0,48	-	-	-	-
4. Konstruksi Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
4.1. Helm (Safety Helmet)	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
4.2. Kacamata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,65	0,75	0,08	0,75	0,08	1,50	0,16	0,67	0,07	0,08	0,01
4.3. Sarung tangan (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	0,75	0,01	0,75	0,01	1,50	0,01	0,67	0,00	0,08	0,00
4.4. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,83	0,75	0,23	0,75	0,23	1,50	0,46	0,67	0,20	0,08	0,03
4.5. Rompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	0,75	0,05	0,75	0,05	1,50	0,11	0,67	0,05	0,08	0,01
5. BAHAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI													
5.1. Persiapan Lokasi Pengambilan	Ls	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-	1,00	0,15	-	-	-	-
5.2. Boran segitiga Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	-	-	48,75	8,43	-	-	-	-
5.3. Papan/ peraplan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
6. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAJAPET TANAH													
6.1. Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Itk	4,00	1,74	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44	-	-	-	-
6.2. Hasil Coring	Itk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Hidrologi	Itk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Hasil Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. BAHAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
7.1. Pemasangan PIPA AW diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,43	-	-
7.2. Plug	BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
8. BAHAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
8.1. Pemasangan dinding Lubang Bor (Material Pihon) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
9. BAHAN PUMPING TES													
9.1. Pemasangan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2. Pemasangan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. BAHAN PENYELESAIAN													
10.1. Pemasangan Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. BAHAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
11.1. AIR BAKU													
11.2. Pemasangan Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. BAHAN TOWER TANDON AIR													
12.1. BAHAN PERSIAPAN :													
12.2. Persiapan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3. Persiapan Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4. Persiapan Tanah	M3	0,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. BAHAN BETON PONDASI TOWER													
13.1. Pemasangan Scaffolding	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2. Pemasangan Bekisting Scaffolding	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3. Pemasangan Beton Pondasi K-175	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4. Pemasangan TIKK	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5. Pemasangan Pondasi TIKK	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6. Pemasangan Bekisting Pondasi TIKK	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. BAHAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
14.1. Rangka 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. Rangka 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3. Rangka 20.20.2 Tiang	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4. Rangka 10.10.10 Tiang	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5. Rangka 10.10.10 Tiang	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6. Rangka 10.10.10 Tiang	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. BAHAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
15.1. Pemasangan Cat Biru Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. BAHAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
16.1. Pemasangan Papan Lantai Kayu Berl. 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. BAHAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
17.1. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2. Pemasangan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. BAHAN PEMASANGAN KRAM UMUM													
18.1. BAHAN PERSIAPAN													
18.2. Persiapan Lokasi Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3. BAHAN TANAH													
18.4. Persiapan Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.5. Persiapan Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.6. BAHAN BETON													
18.7. Pemasangan Pas bekisting	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.8. Pemasangan Pas bekisting	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.9. Pemasangan Cor Block Beton Kran Air	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10. Pemasangan PIPA DARI TANDON KE KRAM UMUM	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11. Rangka 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.12. Rangka 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.13. Rangka 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.14. BAHAN AKHIR													
18.15. Hasil Akhir	Itk	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.16. Hasil Akhir				100,00	10,39		3,12		3,51		3,08		0,04

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(Tanda Tangan)
SUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Eng

NIP. 19791117 201004 1 002

04 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
SIMON RUFABEWA, ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 3 - 4

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya,
Yaro Makmur)



• Perencanaan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabeli II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yora Makmur)

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke

: 06 November 2023 - 11 November 2023

KE- 3

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	LOBOT	VOLUME	BOBOT	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MAN PENDAHULUAN														
Sal peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari sip ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	1,00	0,45	2,00	0,91	1,00	0,45	-	-	
Sal peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil pindah ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-	1,00	0,45	-	-	-	-	
Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pengkangan dan pendudukan alat kotak ukur L serta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	1,00	0,48	2,00	0,97	1,00	0,48	-	-	
Struktur Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:														
BH	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-	
Endung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	1,50	0,16	0,75	0,08	2,25	0,25	0,67	0,07	0,08	0,01	
Maska mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	1,50	0,04	0,75	0,02	2,25	0,07	0,67	0,02	0,08	0,00	
Sarung tangan (Safety Gloves)	Prsg	6,00	0,04	1,50	0,01	0,75	0,01	2,25	0,02	0,67	0,00	0,08	0,00	
Keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Prsg	6,00	1,83	1,50	0,46	0,75	0,23	2,25	0,69	0,67	0,20	0,08	0,03	
Keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	1,50	0,11	0,75	0,05	2,25	0,16	0,67	0,05	0,08	0,01	
BAHAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI														
Penyediaan Lokal Pengboran	LS	4,00	0,58	1,00	0,15	1,00	0,15	2,00	0,29	1,00	0,15	-	-	
Pipa segitiga Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	48,75	8,43	97,50	16,87	48,75	8,43	-	-	
Latan/ peraplan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,65	-	-	48,75	0,65	-	-	-	-	
AMBILAN DAN ANALISA SAMPELTANAH														
Analisa Sample can Analisa Sample	Ttk	4,00	1,74	1,00	0,44	1,00	0,44	2,00	0,87	1,00	0,44	-	-	
Hasil Coring	Ttk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,00)	(1,45)	
Hasil Hidrologi	Ttk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hasil Akhir	LS	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	-	-	48,75	1,48	-	-	-	-	
Plug	BH	4,00	0,06	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	-	-	
BAHAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR														
Pengisian dinding Lubang Bor (Material PIRhan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	0,86	0,13	-	-	0,86	0,13	-	-	-	-	
BAHAN PUMPING TES														
Pompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	5,00	0,43	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-	
Waktu	Jam	24,00	1,73	-	-	6,00	0,43	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-	
BAHAN PENTELESAIAN														
Pipa Box Sumur	LS	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE														
AIR BAKU														
Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	1,00	1,78	1,00	1,78	1,00	1,78	-	-	
Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	-	-	44,75	0,17	44,75	0,17	44,75	0,17	-	-	
BAHAN TOWER TANDON AIR														
BAHAN PERSIAPAN :														
Penyediaan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	-	-	25,00	0,08	25,00	0,08	25,00	0,08	-	-	
di Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-	
di Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-	-	
BAHAN BETON PONDASI TOWER														
Pipa Pemberian Sloof	Kg	168,80	0,54	-	-	42,20	0,13	42,20	0,13	42,20	0,13	-	-	
Pipa Bekisting Sloof	M2	13,44	0,57	-	-	3,36	0,14	3,36	0,14	3,36	0,14	-	-	
Reoran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,29	-	-	0,88	0,32	0,88	0,32	0,88	0,32	-	-	
Sal Titik														
Pipa Pemberian Pondasi Titik	Kg	71,00	0,23	-	-	17,75	0,06	17,75	0,06	17,75	0,06	-	-	
Pipa Bekisting Pondasi Titik	M2	17,28	0,73	-	-	4,32	0,18	4,32	0,18	4,32	0,18	-	-	
Reoran Beton Pondasi Titik K-175	M3	4,64	1,76	-	-	1,16	0,44	1,16	0,44	1,16	0,44	-	-	
BAHAN RANGKA DAN TANGGA TOWER														
Batu 50.50.5 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Batu 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Batu 40.40.4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manhole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Batu Bata M16	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Struktur Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perakitan dan Pengelasan														
BAHAN PENGECATAN RANGKA TOWER														
Reoran Besi Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN LANTAI DUDUKAN TANDON														
Struktur Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON														
Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pipa Profil Tank 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN PEMASANGAN KRAN UMUM														
BAHAN PERSIAPAN														
Penyediaan Lokal Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAHAN TANAH														
di Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
di Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														
di Tanah														

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

(P/19)



DEWAN ISKANDAR, ST., M.SI

NIP. 19791117 201004 1 002

MR. 19791117 201004 1 002

28.03 15.93

November 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CEKILAN PAPIA KONSULTAN

[Signature]

MOY KUMBEWAS ST

Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KE- 4


 Tanggal: 18 November 2023
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. MINDIGERAN PAPUA KONSULTAN

 SIWON BUMREWAS, ST
 Pelaksana

19791117 201004 1 002

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 5 - 6

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Burni Raya,
Yaro Makmur)



1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
2. Pengawasan Pembentukan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
3. PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : Lima

КФ. 5

: 20 November 2023 - 25 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
AAN PENDAHULUAN														
alat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari job ke job site.	Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	-	-	1,00	0,45	3,00	1,36	1,00	0,45	
alat peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	2,00	0,91	-	-	-	-	2,00	0,91	-	-	
angan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pengkalan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93	2,00	0,97	-	-	1,00	0,48	3,00	1,45	1,00	0,48	
Struktural Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:														
Bk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	-	-	1,00	0,04	-	-	
Bndung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	3,00	0,13	-	-	0,75	0,08	3,75	0,41	0,67	0,07	
Glas mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	3,00	0,09	-	-	0,75	0,02	3,75	0,11	0,67	0,02	
Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,04	3,00	0,02	-	-	0,75	0,01	3,75	0,03	0,67	0,00	
Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83	3,00	0,92	-	-	0,75	0,23	3,75	1,14	0,67	0,20	
Vest keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	3,00	0,22	-	-	0,75	0,05	3,75	0,27	0,67	0,05	
AAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI														
Perencanaan Lokasi Pengeboran	Ls	4,00	0,58	2,00	0,29	-	-	1,00	0,15	3,00	0,44	1,00	0,15	
Borasi segala Format diameter 6"	M	195,00	33,73	97,50	16,87	-	-	48,75	8,43	146,25	25,30	48,75	8,43	
Lubang/ peraplan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	97,50	1,31	-	-	-	-	97,50	1,31	-	-	
AMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH														
Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Ttk	4,00	1,74	2,00	0,87	-	-	1,00	0,44	3,00	1,31	1,00	0,44	
Pengambilan hasil Coring	Ttk	4,00	5,81	-	-	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	1,00	1,45	
Pengambilan Hidrologi	Ttk	4,00	2,91	-	-	-	-	1,00	0,73	1,00	0,73	-	-	
Pengambilan Akhir	Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
VC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	97,50	2,96	-	-	-	-	97,50	2,96	-	-	
Plug	BH	4,00	0,06	2,00	0,03	-	-	-	-	2,00	0,03	-	-	
DAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR														
Pengisian dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	1,72	0,26	-	-	-	-	1,72	0,26	-	-	
JAAN PUMPING TES														
Pengambilan data bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-	
Pengambilan data	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-	
JAAN PENYELESAIAN														
Pengisian Box Sumur	Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	
DAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE														
AIR BAKU														
Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	1,00	1,78	1,00	1,78	2,00	3,55	1,00	1,78	-	-	
Pengisian Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	44,75	0,17	44,75	0,17	89,50	0,34	44,75	0,17	-	-	
JAAN TOWER TANDON AIR														
JAAN PERSIAPAN :														
Perencanaan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	25,00	0,08	25,00	0,08	50,00	0,16	25,00	0,08	-	-	
Pengambilan Tanah	M3	0,22	0,01	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,01	0,06	0,00	-	-	
Pengambilan Tanah	M3	0,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-	-	
JAAN BETON PONDASI TOWER														
Bahan Pembesian Sloop	Kg	168,80	0,54	42,20	0,13	42,20	0,13	84,40	0,27	42,20	0,13	-	-	
Pengisian Bekisting Sloop	M2	13,44	0,57	3,36	0,14	3,36	0,14	6,72	0,29	3,36	0,14	-	-	
Pengisian Beton Sloop K-175	M3	3,52	1,29	0,88	0,32	0,88	0,32	1,76	0,65	0,88	0,32	-	-	
Bahan Beton Sloop K-175														
Bahan TTK	Kg	71,00	0,23	17,75	0,06	17,75	0,06	35,50	0,11	17,75	0,06	-	-	
Bahan Pembesian Pondasi TTK	M2	17,28	0,73	4,32	0,18	4,32	0,18	8,64	0,37	4,32	0,18	-	-	
Pengisian Bekisting Pondasi TTK	M3	4,64	1,76	1,16	0,44	1,16	0,44	2,32	0,88	1,16	0,44	-	-	
Pengisian Beton Pondasi TTK K-175														
JAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER														
Bahan 50.50.5 Tangga Utama	Kg	1.958,88	3,63	-	-	652,96	1,21	652,96	1,21	489,72	0,91	163,24	0,30	
Bahan 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	117,66	0,33	117,60	0,33	88,20	0,25	29,40	0,08	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.10 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01	
Bahan 10.10.1														

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

(PPTK)

GUANAWAN ISKANDAR, ST. M.S.

NIP. 19791117 201004 1 002

Noted: 25 November 2023

KONSULTAN PENGAWAS

ANDUEN & PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBOW
Polysar

LAPORAN MINGGUAN

KF. 6

06.07

02 November 2023

KONSULSIAN PENGAWAS

CATATAN KAPPA KONSULTAN

[Signature]

DINA ATRI WIRAWAS, ST

Poliklinik

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 7 - 8

KEGIATAN :

PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN
AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN :

Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya,
Yaro Makmur)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

CHANDAN KANDAR H. M.S.
NP. 19791117 201004 1 002

NW, 1979:117 201004 1 002

KON

LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(tu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,81		4,00	1,81	-	-	4,00	1,81	-	-	-
(satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	1,81		3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	1,00	0,45	-
untuk uji pemompaan sumur termasuk bahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	1,93		4,00	1,93	-	-	4,00	1,93	-	-	-
dan Promotil K3 terdiri atas:	BH	1,00	0,04		1,00	0,14	-	-	1,00	0,04	-	-	-
el)	Bh	6,00	0,65		5,25	0,57	0,75	0,08	6,00	0,65	0,67	0,07	0,08
pectacles)	Bh	6,00	0,17		5,25	0,15	0,75	0,02	6,00	0,17	0,67	0,02	0,08
es)	Psg	6,00	0,04		5,25	0,04	0,75	0,01	6,00	0,04	0,67	0,00	0,08
Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,83		5,25	1,60	0,75	0,23	6,00	1,83	0,67	0,20	0,08
(Vest)	BH	6,00	0,44		5,25	0,38	0,75	0,05	6,00	0,44	0,67	0,05	0,08
UMUR EKSPLORASI													
oran	Ls	4,00	0,58		4,00	0,58	-	-	4,00	0,58	-	-	-
diameter 6"	M	195,00	33,73		195,00	33,73	-	-	195,00	33,73	-	-	-
ing lubang bor	M	195,00	2,62		146,25	1,96	48,75	0,65	195,00	2,62	48,75	0,65	-
A SAMPEL TANAH													
Analisis Sample	Itk	4,00	1,74		4,00	1,74	-	-	4,00	1,74	-	-	-
	Itk	4,00	5,81		3,00	4,36	1,00	1,45	4,00	5,81	-	-	1,00
	Itk	4,00	2,91		3,00	2,18	1,00	0,73	4,00	2,91	1,00	0,73	-
	Ls	1,00	1,45		-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00
UKSI SUMUR													
	M	195,00	5,93		146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	48,75	1,48	-
	BH	4,00	0,06		3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	1,00	0,01	-
KONSTRUKSI SUMUR													
ang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51		2,57	0,38	0,86	0,13	3,43	0,51	0,86	0,13	-
dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73		18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-
	Jam	24,00	1,73		18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-
	Ls	4,00	0,58		3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	1,00	0,15	-
ANGAN POMPA SUBMERISABLE													
	Unit	4,00	7,10		3,00	5,33	1,00	1,78	4,00	7,10	1,00	1,78	-
a, 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67		134,25	0,50	44,75	0,17	179,00	0,67	44,75	0,17	-
ON AIR													
	M2	100,00	0,31		100,00	0,31	-	-	100,00				

(PPE)

 SUHAWAN ISKANDAR ST. M.S.
 NF. 19791117 201004 1 002

SIMON KUMELWAS II
Palaikota

LAPORAN BULANAN

OKTOBER


2023

LAPORAN BULANAN

KE. 1

KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Kali	4,00	1,81	-	-	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
Kali	4,00	1,93	-	-	1,00	0,48	1,00	0,48	1,00	0,48	-	-
BH	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
Bh	6,00	0,65	-	-	1,50	0,16	1,50	0,16	1,33	0,15	0,17	0,00
Bh	6,00	0,17	-	-	1,50	0,04	1,50	0,04	1,33	0,04	0,17	0,00
Psg	6,00	0,04	-	-	1,50	0,01	1,50	0,01	1,33	0,01	0,17	0,00
Psg	6,00	1,83	-	-	1,50	0,46	1,50	0,46	1,33	0,41	0,17	0,00
BH	6,00	0,44	-	-	1,50	0,11	1,50	0,11	1,33	0,10	0,17	0,00
Ls	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
M	195,00	33,73	-	-	48,75	8,43	48,75	8,43	48,75	8,43	-	-
M	195,00	2,62	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
Ttk	4,00	1,74	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
Ttk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,00)	(1,45)
Ttk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ls	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,48	-	-
BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
M3	3,43	0,51	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ls	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M'	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bh	4,00	2,31	-									

NOVIAN KANDAS, ET. AL
NIP. 19791117 201004 1 002



LAPORAN BULANAN

NOVEMBER

2023



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nisibre II (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)
: PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)

LAPORAN BULANAN

: 2023

Bulan Ke : Dua

KE- 2

Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAHULUAN													
Penetapan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil di	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36	-	-
Penetapan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil di	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36	-	-
Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	1,00	0,97	3,00	1,45	3,00	1,45	-	-
Penetapan alat kotak ukur beserta alat													
Kontrol keselamatan dan Promosi K3 terdapat atas:													
Head (Safety Helmet)	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
Goggles (Safety Goggles)	Bh	6,00	0,65	1,50	0,16	3,00	0,33	4,50	0,49	4,00	0,44	0,50	0,05
Gloves (Safety Gloves)	Psq	6,00	0,04	1,50	0,01	3,00	0,02	4,50	0,03	4,00	0,03	0,50	0,00
Shoes (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psq	6,00	1,83	1,50	0,46	3,00	0,92	4,50	1,37	4,00	1,22	0,50	0,15
Vest (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	1,50	0,11	3,00	0,22	4,50	0,33	4,00	0,29	0,50	0,04
PEMBERAN SUMUR EKSPLOKASI													
Penetapan Lokasi Pemberan	LS	4,00	0,58	1,00	0,15	2,00	0,29	3,00	0,44	1,00	0,14	-	-
Penetapan Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	97,50	16,87	146,25	25,30	146,25	25,30	-	-
Penetapan perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,65	97,50	1,31	146,25	1,96	146,25	1,96	-	-
ANALISA DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Penetapan Sample dan Analisis Sample	Tik	4,00	1,74	1,00	0,44	2,00	0,87	3,00	1,31	3,00	1,31	-	-
Penetapan Coring	Tik	4,00	5,81	-	-	2,00	2,91	2,00	2,91	3,00	4,36	(1,00)	(1,45)
Penetapan Gravel	Tik	4,00	2,91	-	-	2,00	1,45	2,00	1,45	2,00	1,45	-	-
Penetapan Ls	LS	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
AN diameter 6"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	97,50	2,96	146,25	4,45	146,25	4,45	-	-
AN	BH	4,00	0,06	1,00	0,01	2,00	0,03	3,00	0,04	3,00	0,04	-	-
AN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
AN dinding Lubang Bor (Material Pijihan) Gravel Part tertentu	M3	3,43	0,51	0,86	0,13	1,72	0,26	2,57	0,38	2,57	0,38	-	-
AN PUMPING TES													
AN bertahap dan uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-
AN	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-
AN PENYELESAIAN													
AN Box Sumur	LS	4,00	0,58	-	-	2,00	0,29	2,00	0,29	2,00	0,29	-	-
AN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
AN BAKU													
AN Instalasi Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	2,00	3,55	2,00	3,55	2,00	3,55	-	-
AN Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	89,50	0,34	89,50	0,34	89,50	0,34	-	-
AN TOWER TANDON AIR													
AN PERSIAPAN :													
AN Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	75,00	0,24	75,00	0,24	50,00	0,16	25,00	0,08
AN	M3	0,22	0,01	-	-	0,17	0,01	0,17	0,01	0,11	0,01	0,06	0,00
AN	M3	0,06	0,00	-	-	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
AN BETON FONDASI TOWER													
AN	Kg	168,80	0,54	-	-	126,60	0,40	126,60	0,40	84,40	0,27	42,20	0,13
AN Pembesian Sloof	M2	13,44	0,57	-	-	10,08	0,43	10,08	0,43	6,72	0,29	3,36	0,14
AN Bekisting Sloof	M3	3,52	1,29	-	-	2,54	0,97	2,54	0,97	1,76	0,65	0,88	0,32
AN Beton Sloof K-175													
AN	Kg	71,00	0,23	-	-	53,25	0,17	53,25	0,17	35,50	0,11	17,75	0,06
AN Pembesian Pondasi TIRI:	M2	17,28	0,73	-	-	12,96	0,55	12,96	0,55	8,64	0,37	4,32	0,18
AN Bekisting Pondasi TIRI	M3	4,64	1,76	-	-	3,48	1,32	3,48	1,32	2,32	0,88	1,16	0,44
AN Beton Pondasi TIRI K-175													
AN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
AN 80.80.8 Tangg Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	1,305,92	2,42	1,305,92	2,42	979,44	1,82	326,48	0,61
AN 80.80.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	235,20	0,67	235,20	0,67	174,40	0,50	58,80	0,17
AN 80.40.4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	0,61	0,10	0,61	0,10	0,46	0,08	0,15	0,03
AN tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	-	-	42,67	0,31	42,67	0,31	32,00	0,23	10,67	0,08
AN M16	Bh	4,00	1,45	-	-	2,67	0,97	2,67	0,97	2,00	0,73	0,67	0,24
AN Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	4,36	-	-	2,67	2,91	2,67	2,91	2,00	2,18	0,67	0,73
AN dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	2,67	2,91	2,67	2,91	2,00	2,18	0,67	0,73
AN PENGECATAN RANGKA TOWER													
AN Batil Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	18,67	0,38	18,67	0,38	14,00	0,28	4,67	0,09
AN LANTAI DUDUKAN TANDON													
AN Papan Lantai Kayu Batil 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	15,36	0,81	15,36	0,81	11,52	0,61	3,84	0,20
AN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
AN Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	21,33	0,16	21,33	0,16	16,00	0,12	5,33	0,04
AN Profile Tank 2300 L	Bh	4,00	2,31	-	-	2,67	1,54	2,67	1,54	2,00	1,16	0,67	0,39
AN PEMASANGAN KRAM UMUM													
AN PERSIAPAN	M'	10,00	0,03	-	-	5,00	0,02	5,00	0,02	5,00	0,02	-	-
AN Lokasi Kram umum													
AN TANAH	M3	1,84	0,10	-	-	0,92	0,05	0,92	0,05	0,72	0,05	-	-
AN	M3	1,44	0,02	-	-	0,72	0,01	0,72	0,01	0,72	0,01	-	-
AN Beton	M2	15,68	0,67	-	-	7,84	0,33	7,84	0,33	7,84	0,33	-	-
AN Pas Isolasi	M3	1,88	0,65	-	-	0,94	0,33	0,94	0,33	0,94	0,33	-	-
AN Cor. Block Beton Kram Air													
AN PIPA DARI TANDON KE KRAM UMUM													
AN 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	2,00	0,04	2,00	0,04	2,00	0,04	-	-
AN 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	2,00	0,02	2,00	0,02	2,00	0,02	-	-
AN 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-
AN 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-
AN AKHIR	Tik	4,00	1,16	-	-	2,00	0,58	2,00	0,58	2,00	0,58	-	-
AN Akhir													
JUMLAH				100,00		53,18		66,67		63,95			2,74

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPK)

GUNAWAN HIKANDAR, ST, M.Eng.
NP. 19791117 201004 1 002

01 November 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

PELAKSANA

LAPORAN BULANAN

DESEMBER

2023



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nihaha II Wampaner Wampaner Makmur Bumi Raya Yaro Makmur
: PAKET 12 (Wanggar, Wanggar Makmur, Bumi Raya, Yaro Makmur)

LAPORAN BULANAN

: 2023

Bulan Ke : Tiga

KE - 3

Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAHULUAN													
1. Instalasi bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-
2. Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-
3. Instalasi Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk bahan dan pemindahan alat ke lokasi ukur beserta alat bantu.	Kali	4,00	1,93	3,00	1,45	1,00	0,48	4,00	1,93	4,00	1,93	-	-
4. Instalasi Scaffolding dan Promal K3 terdiri atas:													
5. Helm (Safety Helmet)	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-
6. Goggles (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,65	4,50	0,49	1,50	0,16	6,00	0,65	5,33	0,58	0,67	0,07
7. Safety Gloves (Safety Gloves)	PSG	6,00	0,17	4,50	0,13	1,50	0,04	6,00	0,17	5,33	0,15	0,67	0,02
8. Safety Shoes (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	PSG	6,00	0,04	4,50	0,03	1,50	0,01	6,00	0,04	5,33	0,04	0,67	0,00
9. Safety Vest (Safety Vest)	PSG	6,00	1,83	4,50	1,37	1,50	0,46	6,00	1,83	5,33	1,63	0,67	0,20
10. Safety Vest (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	4,50	0,33	1,50	0,11	6,00	0,44	5,33	0,39	0,67	0,05
PEMBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
1. Lokasi Pemboran	LS	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-
2. Material Formasi diameter 6"	M	195,00	33,73	146,25	25,30	48,75	8,43	195,00	33,73	195,00	33,73	-	-
3. Material perapian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,96	48,75	0,65	195,00	2,62	195,00	2,62	-	-
ILAH DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1. Sample dan Analisa Sample	TK	4,00	1,74	3,00	1,31	1,00	0,44	4,00	1,74	4,00	1,74	-	-
2. Coring	TK	4,00	5,81	2,00	2,91	2,00	2,91	4,00	5,81	4,00	5,81	-	-
3. Analisa	TK	4,00	2,91	2,00	1,43	2,00	1,45	4,00	2,91	3,00	2,18	1,00	0,73
4. Labor	LS	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45
AN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
1. Material diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	195,00	5,93	-	-
2. Labor	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	4,00	0,06	-	-
AN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
1. Material dinding Lubang Bor (Material PIRHAN) Gravel Park kerentu	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	0,86	0,13	3,43	0,51	3,43	0,51	-	-
AN PUMPING TES													
1. Material bertahap dan uji debit tetap	Jam	21,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-
2. Labor	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-
AN PENYELESAIAN													
1. Material Box Sumur	LS	4,00	0,58	2,00	0,29	2,00	0,29	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-
AN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
1. Labor BAKU													
2. Material Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	2,00	3,55	4,00	7,10	4,00	7,10	-	-
3. Material Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	89,50	0,34	89,50	0,34	179,00	0,67	179,00	0,67	-	-
AN TOWER TANDON AIR													
1. Material Persiapan :													
2. Material Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	75,00	0,24	25,00	0,08	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-
3. Material	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-
4. Material	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-
AN BETON FONDASI TOWER													
1. Material Pembesian Scaff	Kg	168,80	0,54	126,60	0,40	42,20	0,13	168,80	0,54	168,80	0,54	-	-
2. Material Bekisting Scaff	M2	13,44	0,57	10,08	0,43	3,36	0,14	13,44	0,57	13,44	0,57	-	-
3. Material Beton Scaff K-175	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-
4. Material	TK												
5. Material Pembesian Pondasi TIKK	Kg	71,00	0,23	53,25	0,17	17,75	0,06	71,00	0,23	71,00	0,23	-	-
6. Material Bekisting Pondasi TIKK	M2	17,28	0,73	12,96	0,53	4,32	0,18	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-
7. Material Beton Pondasi TIKK K-175	M3	4,64	1,76	3,48	1,32	1,16	0,44	4,64	1,76	4,64	1,76	-	-
AN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
1. Material 80-50-5 Tangg Utama	Kg	1,958,88	3,63	1,305,92	2,42	652,96	1,21	1,958,88	3,63	1,489,16	2,73	489,72	0,91
2. Material 40-40-4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	235,20	0,67	117,60	0,33	352,80	1,00	264,60	0,75	88,20	0,25
3. Material	M2	0,92	0,16	0,61	0,10	0,31	0,05	0,92	0,16	0,69	0,12	0,23	0,04
4. Material tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	42,67	0,31	21,33	0,15	64,00	0,46	48,00	0,35	16,00	0,12
5. Material M16	Bh	4,00	1,45	2,67	0,97	1,33	0,48	4,00	1,45	3,00	1,09	1,00	0,36
6. Material Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,36	3,00	3,27	1,00	1,09
7. Material dan Pengekasan													
AN PENGECATAN RANGKA TOWER													
1. Material Bodi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	18,67	0,38	9,33	0,19	28,00	0,57	21,00	0,43	7,00	0,14
2. Material													
AN LANTAI DUDUKAN TANDON													
1. Material Papan Lantai Kayu Bodi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	15,36	0,81	7,68	0,40	23,04	1,21	17,28	0,91	5,76	0,30
2. Material PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON	M	32,00	0,24	21,33	0,16	10,67	0,08	32,00	0,24	24,00	0,18	8,00	0,06
3. Material Pipa PVC dia. 3/4"	Bh	4,00	2,31	2,67	1,54	1,33	0,77	4,00	2,31	3,00	1,74	1,00	0,58
4. Material Profile Tancu 2200 L													
AN PEMASANGAN KRAM UJUM													
1. Material Persiapan	M	10,00	0,03	5,00	0,02	5,00	0,02	10,00	0,03	7,50	0,02	2,50	0,01
2. Material Lokasi Kram umum													
3. Material TANAH	M3	1,84	0,10	0,92	0,05	0,92	0,05	1,84	0,10	1,38	0,07	0,46	0,02
4. Material	M3	1,44	0,02	0,72	0,01	0,72	0,01	1,44	0,02	1,08	0,02	0,36	0,01
5. Material													
6. Material BETON	M2	15,68	0,67	7,84	0,33	7,84	0,33	15,68	0,67	11,76	0,50	3,92	0,17
7. Material Pas bekisting	M3	1,88	0,65	0,94	0,33	0,94	0,33	1,88	0,65	1,41	0,49	0,47	0,16
8. Material Cor Block Beton Kram Air													
9. Material PIPA DARI TANDON KE KRAM UMUM	Bh	4,00	0,08	2,00	0,04	2,00	0,04	4,00	0,08	3,00	0,06	1,00	0,02
10. Material 3/4"	Bh	4,00	0,04	2,00	0,02	2,00	0,02	4,00	0,04	3,00	0,03	1,00	0,01
11. Material 3/4"	M	64,00	0,48	32,00	0,24	32,00	0,24	64,00	0,48	48,00	0,36	16,00	0,12
12. Material 3/4"													
13. Material 3/4"	TK	4,00	1,16	2,00	0,50	2,00	0,58	4,00	1,16	3,00	0,87	1,00	0,29
14. Material Abdi													
Jumlah			100,00		66,89		33,31		100,00		92,81		7,19

Jumlah

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTK)

CHANDRA KANDAR ET AL

NIP. 19791117 201004 1 002

12 Desember 2023
KORAN PENGAWAS
ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Supervisor
NIP. 19791117 201004 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

Laporan akhir

(PEKERJAAN)

**Survei Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Eksplorasi Dalam
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah**

Nabire II (Karadiri 1, Karadiri 2, Wanggar sari, Bumi Mulia)

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI
JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

CONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. FLORENCIA PAPUA DRILL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat: Jalan Raya Tembakua Selatan - PT Sorobika - Distrik TMBL

KONSULTAN PENGAWAS:

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Regio: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pekerjaan: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabile II (Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli)
Lokasi: Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli
Tahun Anggaran: 2023
Minggu Ke: Dua
Periode: 30 Oktober 2023 - 04 November 2023
K/E: 2

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Mobilisasi peralatan bar 1 (vahu) unit dan alat bantu serta team personel dari waduhup ke job site.	Kal	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-	1,00	0,45	-	-	-	-
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (vahu) unit dan alat bantu serta team personel dari waduhup ke job site.	Kal	4,00	1,81	-	-	1,10	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45	-	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembangunan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perangkanya	Kal	4,00	1,93	1,00	0,8	-	-	1,00	0,48	-	-	-	-
SMK3 Kontrolasi Keselamatan dan Pemasar K3 terdiri atas:														
1	Spanduk	BH	1,00	3,04	1,00	0,14	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
2	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,65	0,75	0,08	0,75	0,08	1,50	0,16	0,67	0,07	0,08	0,01
3	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	0,75	0,02	0,75	0,02	1,50	0,04	0,67	0,02	0,06	0,00
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pig	6,00	0,04	0,75	0,01	0,75	0,01	1,50	0,01	0,67	0,00	0,03	0,00
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pig	6,00	1,83	0,75	0,23	0,75	0,23	1,50	0,46	0,67	0,20	0,08	0,03
6	Kapel keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	0,75	0,05	0,75	0,05	1,50	0,11	0,67	0,05	0,08	0,01
B. PEKERJAAN PENGBOSON SUMUR EKSPLORASI														
1	Pembuatan Lokasi Pemompaan	Li	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-	1,00	0,15	-	-	-	-
2	Pengaliran segala Pemasal diameter 4"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	-	-	48,75	8,43	-	-	-	-
3	Pemasangan / pemasangan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPLER TANAH														
1	Pengambilan Sample dan Analisa Sample	Itk	4,00	1,24	1,00	0,4	-	-	1,00	0,44	-	-	-	-
2	Analisa hasil Coran	Itk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Analisa Hidrostat	Itk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,48	-	-
2	Bottom Plug	BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
D. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pengurangan dinding lubang Bor (Material Pitan) Gravel Part terleny	M3	3,43	0,51	-	-	0,16	0,13	0,36	0,13	0,86	0,13	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES														
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. PEKERJAAN PENYERAPAN														
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE														
POMPA AIR BAKU														
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR														
PEKERJAAN PERIAPAN :														
1	Pembangunan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Unggan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER														
a. Bood														
1	Pekerjaan Pambesian Bood	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembuatan Belding Bood	M2	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengacoran Beton Bood K-175	M3	3,52	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pondasi TIK														
1	Pekerjaan Pambesian Pondasi TIK	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembuatan Belding Pondasi TIK	M2	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengacoran Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,64	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER														
1	Besi 80x80x8 Tiang Utama	Kg	1.958,88	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Besi 80x40x4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Plat m anahel 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Angkur Besi M16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelasan Tangga Tower Tandon	th	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jasa Pasokan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER														
1	Pengecatan Besi 80x80x8 Tiang Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON														
1	Pengadaan Papan Lantai Kayu Besi 7x 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PERIAPAN DARI SUMUR MASUK TANDON														
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Profile To k 2300 L	th	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. PEKERJAAN PEMASANGAN KRAM UMUM														
PEKERJAAN PERIAPAN														
1	Pembangunan Lokasi Kram umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH														
1	Galian tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Unggan Krambol	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON														
1	Pekerjaan Pori beton	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Cor Block Beton Kram Air	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAM UMUM														
1	Pipa Kram 3/4	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kram Air PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa PVC 3/4"	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AISIR														
1	Pekerjaan AISIR	Itk	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				100,00		10,39		3,12		13,51		3,48		0,04

PELAKSANA TUGAS KEGIATAN

(PPT)

SIMON RUMBAY
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabile, 04 November 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBAY
Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Puncakbuna - Puncakbuna - Puncakbuna 66014

KONSULTAN PENGANTAR :
CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembukaan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
wilayah Nabbia II (Koradit 1, Koradit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli)

LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		3/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIAN		
	BAT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PERSIAPAN													
1. Pembersihan lokasi pekerjaan	Km	4,00	1,81	1,00	0,43	-	-	1,00	0,43	-	-	-	-
2. Pengalihan lokasi pekerjaan	Km	4,00	1,81	-	-	1,00	0,43	1,00	0,43	1,00	0,43	-	-
3. Pengalihan lokasi pekerjaan	Km	4,00	1,93	1,00	0,48	-	-	1,30	0,48	-	-	-	-
PEKERJAAN KONSTRUKSI													
1. Pemasangan tiang pancang	Bh	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Bh	6,00	0,45	0,75	0,08	0,75	0,08	1,50	0,16	0,67	0,07	0,08	0,01
3. Pemasangan tiang pancang	Bh	6,00	0,17	0,75	0,02	0,75	0,02	1,50	0,04	0,67	0,02	0,08	0,10
4. Pemasangan tiang pancang	Pg	6,00	0,04	0,75	0,01	0,75	0,01	1,50	0,01	0,67	0,00	0,08	0,03
5. Pemasangan tiang pancang	Pg	6,00	1,83	0,75	0,23	0,75	0,23	1,50	0,46	0,67	0,70	0,08	0,13
6. Pemasangan tiang pancang	Bh	6,00	0,44	0,75	0,05	0,75	0,05	1,50	0,11	0,67	0,23	0,08	0,01
PEKERJAAN PENGURAIAN SUMBUH RESPIRASI													
1. Pemasangan tiang pancang	Li	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-	1,00	0,15	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M	195,00	23,73	48,75	8,43	-	-	48,75	8,43	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M	195,00	2,82	-	-	48,75	0,65	48,75	0,65	48,75	0,65	-	-
PEKERJAAN DUKUNGAN SAMPAH TANAH													
1. Pemasangan tiang pancang	Tr	4,00	1,74	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Tr	4,00	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	Tr	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pemasangan tiang pancang	Li	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PAKS KONSTRUKSI SUMBUH													
1. Pemasangan tiang pancang	M	195,00	5,93	-	-	48,75	1,48	48,75	1,48	48,75	1,48	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Bh	4,00	0,06	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-
PEKERJAAN BAHAN BAKU KONSTRUKSI SUMBUH													
1. Pemasangan tiang pancang	M3	3,43	0,51	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Jam	24,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	Li	4,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	Unit	4,00	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M	179,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
1. Pemasangan tiang pancang	M3	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BONGKOR FONDASI TOWER													
1. Pemasangan tiang pancang	Kg	168,00	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M3	13,44	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M3	3,32	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pemasangan tiang pancang	Kg	71,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pemasangan tiang pancang	M3	17,28	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pemasangan tiang pancang	M3	4,44	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BANGKOR DAN TANGGA TOWER													
1. Pemasangan tiang pancang	Kg	1,738,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Kg	352,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M3	0,92	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pemasangan tiang pancang	Bh	64,00	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pemasangan tiang pancang	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pemasangan tiang pancang	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	M3	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	M3	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BONGKOR													
1. Pemasangan tiang pancang	M3	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemasangan tiang pancang	M	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PANGKAS TER													
1. Pemasangan tiang pancang	Tr	4,00	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pemasangan tiang pancang													
3. Pemasangan tiang pancang													
4. Pemasangan tiang pancang													
5. Pemasangan tiang pancang													
6. Pemasangan tiang pancang													
7. Pemasangan tiang pancang													
8. Pemasangan tiang pancang													
9. Pemasangan tiang pancang													
10. Pemasangan tiang pancang													
11. Pemasangan tiang pancang													
12. Pemasangan tiang pancang													
13. Pemasangan tiang pancang													
14. Pemasangan tiang pancang													
15. Pemasangan tiang pancang													
16. Pemasangan tiang pancang													
17. Pemasangan tiang pancang													
18. Pemasangan tiang pancang													
19. Pemasangan tiang pancang													
20. Pemasangan tiang pancang													
21. Pemasangan tiang pancang													
22. Pemasangan tiang pancang													
23. Pemasangan tiang pancang													
24. Pemasangan tiang pancang													
25. Pemasangan tiang pancang													
26. Pemasangan tiang pancang													
27. Pemasangan tiang pancang													
28. Pemasangan tiang pancang													
29. Pemasangan tiang pancang													
30. Pemasangan tiang pancang													
31. Pemasangan tiang pancang													
32. Pemasangan tiang pancang													
33. Pemasangan tiang pancang													
34. Pemasangan tiang pancang													
35. Pemasangan tiang pancang													
36. Pemasangan tiang pancang													
37. Pemasangan tiang pancang													
38. Pemasangan tiang pancang													
39. Pemasangan tiang pancang													
40. Pemasangan tiang pancang													
41. Pemasangan tiang pancang													
42. Pemasangan tiang pancang													
43. Pemasangan tiang pancang													
44. Pemasangan tiang pancang													
45. Pemasangan tiang pancang													
46. Pemasangan tiang pancang													
47. Pemasangan tiang pancang													
48. Pemasangan tiang pancang													
49. Pemasangan tiang pancang													
50. Pemasangan tiang pancang													
51. Pemasangan tiang pancang													
52. Pemasangan tiang pancang													
53. Pemasangan tiang pancang													
54. Pemasangan tiang pancang													
55. Pemasangan tiang pancang													
56. Pemasangan tiang pancang													
57. Pemasangan tiang pancang													
58. Pemasangan tiang pancang													
59. Pemasangan tiang pancang													

KONTAKTOR PELAKSANA :

CV. FLORENCIA PAPUA DRILL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TRIAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samudra Beach - P. Samudra - Nabire 98114

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Kejelasan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sari, Bumi Mula)
Lokasi : Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sari, Bumi Mula
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu ke :

Periode :

04 November 2023 - 11 November 2023


KE- 3

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEKAT		
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Mobilisasi peralatan bar 1 (set) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	1,00	0,45	1,00	0,45	2,00	0,91	1,00	0,45	-	-
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (set) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kol	4,00	,81	1,00	0,45	-	-	1,00	0,45	-	-	-	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembenangan dan pemidahan alat katrol ukur beserta alat penyangga lainnya	Kol	4,00	1,93	1,00	0,48	1,00	0,48	2,00	0,97	1,00	0,48	-	-
B. KEGIATAN KEMUKATAN DAN PEMERIKSAAN KESIMPULAN														
1	Isamul	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
2	Test pelindungan (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,45	1,50	0,16	0,75	0,08	2,25	0,25	0,67	0,07	0,08	0,01
3	Pelindungan mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	1,50	0,04	0,75	0,02	2,25	0,07	0,67	0,02	0,08	0,00
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pig	6,00	0,04	1,50	0,01	0,75	0,01	2,25	0,02	0,67	0,00	0,08	0,00
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pig	6,00	1,83	1,50	0,46	0,75	0,23	2,25	0,69	0,67	0,20	0,08	0,03
6	Rantai keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	1,50	0,11	0,75	0,05	2,25	0,16	0,67	0,05	0,08	0,01
C. PEKERJAAN PENGECATAN SUMUR EKSPLORASI														
1	Pembangunan Lokal Pengecatan	Li	4,00	0,58	1,00	0,15	1,00	0,15	2,00	0,29	1,00	0,15	-	-
2	Pengecatan sebagai format diameter 4"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	48,75	8,43	97,50	16,87	48,75	8,43	-	-
3	Pemadatan / pengaliran dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,65	-	-	48,75	0,65	-	-	-	-
D. PENGALIRAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH														
1	Pengambilan sampel dan Analisa sampel	Trk	4,00	1,74	1,00	0,44	1,00	0,44	2,00	0,87	1,00	0,44	-	-
2	Analisa hasil Coring	Trk	4,00	5,81	-	-	-	-	-	-	1,00	1,45	(1,03)	(1,45)
3	Analisa Hidrologi	Trk	4,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	-	-	48,75	1,48	-	-	-	-
2	Bottom Pipe	BH	4,00	0,06	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	-	-
F. PENGADAAN BAHAN ISAN KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pengurangan dinding Lubang Bor (Material Pile) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	0,84	0,13	-	-	0,84	0,13	-	-	-	-
G. PEKERJAAN PUMPING TES														
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	6,00	0,43	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-
2	Uji Pemompaan	Jam	24,00	1,73	-	-	6,00	0,43	6,00	0,43	6,00	0,43	-	-
H. PEKERJAAN PENYERAHAN														
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE														
POMPA AIR BAKU														
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	1,00	1,78	1,00	1,78	1,00	1,78	-	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	-	-	44,75	0,17	44,75	0,17	44,75	0,17	-	-
J. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR														
PEKERJAAN PERSEKIPAN														
1	Pembangunan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	-	-	25,00	0,08	25,00	0,08	25,00	0,08	-	-
2	Galon Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-
3	Uraian Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-	-
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER														
1	Roof	Kg	168,80	0,54	-	-	42,20	0,13	42,20	0,13	42,20	0,13	-	-
2	Pelaksanaan Pambesian Roof	M2	13,44	0,57	-	-	3,36	0,14	3,36	0,14	3,36	0,14	-	-
3	Pembuatan Scaffolding Roof	M3	3,52	1,29	-	-	0,88	0,22	0,88	0,32	0,88	0,32	-	-
4	Pengaliran Beton Roof K-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pondasi TIKK	Kg	71,00	0,23	-	-	17,75	0,06	17,75	0,06	17,75	0,06	-	-
6	Pelaksanaan Penarikan Pondasi TIKK	M2	17,28	0,73	-	-	4,32	0,18	4,32	0,18	4,32	0,18	-	-
7	Pembuatan Scaffolding Pondasi TIKK	M3	4,64	1,76	-	-	1,16	0,44	1,16	0,44	1,16	0,44	-	-
8	Pengaliran Beton Pondasi TIKK K-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K. PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER														
1	Besi Baja 80 80.8 Teras Utama	Kg	1,958,88	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Besi Baja 40.40.4 (Pagar)	Kg	332,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	M2 0,92 0,16	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	M2 0,92 0,16	Bh	64,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Analisa Besi M16	Bh	4,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengaliran Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jasa Perbaikan dan Pemasangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER														
1	Pengaliran Besi Baja Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON														
1	Pengaliran Papan Lantai Kayu Besi 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. PEKERJAAN PERSEKIPAN DARI SUMUR MASUK TANDON														
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengaliran Pemasangan Pipa PVC 2200 L	Bh	4,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O. PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM														
PEKERJAAN PERSEKIPAN														
1	Pembangunan Lokal Kran umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TAMAH														
1	Saluran tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Uraian tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON														
1	Pelaksanaan Perbaikan	M2	15,68	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM														
1	Pipa Besi 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran Air PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa Besi 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q. PEKERJAAN AKHIR														
1	Pelaksanaan Akhir	Trk	4,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				100,00		13,51		14,52		28,03		15,93		(1,41)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


DINAS BANGUNAN, ST. MJI
NIP. 19791117 201004 1 002

04 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN


DINAS BANGUNAN
NIP. 19791117 201004 1 002



Kegiatan

Pekerjaan

Uraian

Tahun Anggaran

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembiayaan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wayah Mabile II (Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sor, Bumi Mula)
: Karadit 1, Karadit 2, Wanggar Sor, Bumi Mula

: 2023

Minggu Ke

: Lima


Periode : 23 November 2023 - 25 November 2023

KE- 5

LAPORAN MINGGUAN

		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI		
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Mobilisasi peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	2,00	0,91	1,00	0,45	3,00	1,36	1,00	0,45	-	-
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	2,00	0,91	-	-	2,00	0,91	-	-	-	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesh untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat pendukungnya.	Kol	4,00	1,93	2,00	0,97	1,00	0,48	3,00	1,45	1,00	0,48	-	-
UNIKS Koneksi ke alat ukur dan Premis K3 terdapat atas:														
1	Spanduk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
2	Topi pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,45	3,00	0,33	0,75	0,08	3,75	0,41	0,67	0,07	0,38	0,01
3	Penutup mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	3,00	0,09	0,75	0,02	3,75	0,11	0,67	0,02	0,08	0,00
4	Kantong tangan (Safety Gloves)	Pig	6,00	0,04	3,00	0,02	0,75	0,01	3,75	0,03	0,67	0,00	0,08	0,00
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pig	6,00	1,83	3,00	0,92	0,75	0,23	3,75	1,14	0,67	0,20	0,08	0,03
6	Rempi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	3,00	0,22	0,75	0,05	3,75	0,27	0,67	0,05	0,08	0,01
PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPORASI														
1	Pembangunan Lokasi Pemompaan	Li	4,00	0,58	2,00	0,29	1,00	0,15	3,00	0,44	1,00	0,15	-	-
2	Pembangunan pondasi Pondasi diameter 6"	M	195,00	33,73	97,50	16,87	48,75	8,43	146,25	25,30	48,75	8,43	-	-
3	Pembangunan/pemipaan didalam lubang bor	M	195,00	2,42	97,50	1,31	-	-	97,50	1,31	-	-	-	-
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH														
1	Pengambilan sampel dan Analisa sampel	TR	4,00	1,74	2,00	0,17	1,10	0,44	3,00	1,31	1,00	0,44	-	-
2	Analisa hasil Colna	TR	4,00	5,81	-	-	1,10	1,10	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-
3	Analisa Hidrologi	TR	4,00	2,91	-	-	1,10	0,73	1,00	0,73	-	-	1,00	0,73
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pipa PVC AW 1/2 inch 4"	M	195,00	5,93	97,50	2,96	-	-	97,50	2,96	-	-	-	-
2	Bottom Plug	BH	4,00	0,06	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03	-	-	-	-
PENGADAAN BAHAN RIAM KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pengurangan dinding Lubang Bor (Material Pihon) Gravel Park terentu	M3	3,43	0,51	1,72	0,16	-	-	1,72	0,26	-	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES														
1	Uji Pemompaan berkapas dan Uji debit kelap	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-
2	Uji Pemompaan	Jam	24,00	1,73	6,00	0,43	6,00	0,43	12,00	0,87	6,00	0,43	-	-
PEKERJAAN PENYERAPAN														
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,58	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA BUMBUKSI														
POMPA AIR BAKU														
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	1,00	1,78	1,00	1,78	2,00	3,55	1,00	1,78	-	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	44,75	0,17	44,75	0,17	89,50	0,34	44,75	0,17	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR														
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pembangunan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	25,00	0,08	25,00	0,08	50,00	0,16	25,00	0,08	-	-
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,01	0,06	0,00	-	-
3	Uraian Tanah	M3	0,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-	-
PEKERJAAN MITON PONDASI TOWER														
a. Batol														
1	Pekerjaan Pembuatan Batol	Kg	168,80	0,54	42,20	0,13	42,20	0,13	84,40	0,27	42,20	0,13	-	-
2	Pembuatan Belding Batol	M2	13,44	0,57	3,36	0,14	3,36	0,14	6,72	0,29	3,36	0,14	-	-
3	Pengadaan Beton Batol K-178	M3	3,32	1,29	0,88	0,32	0,88	0,32	1,76	0,65	0,88	0,32	-	-
b. Pondasi TRK														
1	Pekerjaan Pembuatan Pondasi TRK	Kg	71,00	0,23	17,75	0,06	17,75	0,06	35,50	0,11	17,75	0,06	-	-
2	Pembuatan Belding Pondasi TRK	M2	17,28	0,73	4,32	0,18	4,32	0,18	8,64	0,37	4,32	0,18	-	-
3	Pengadaan Beton Pondasi TRK K-178	M3	4,64	1,76	1,16	0,44	1,16	0,44	2,32	0,88	1,16	0,44	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER														
1	Bed Siku 80x80x6mm	Kg	1.958,08	3,63	-	-	652,96	1,21	652,96	1,21	487,72	0,91	163,24	0,30
2	Bed Siku 40x40x6mm	Kg	352,00	1,00	-	-	117,60	0,33	117,60	0,33	68,20	0,25	29,40	0,06
3	Bed Siku 40x40x6mm	M2	0,92	0,16	-	-	0,31	0,05	0,31	0,05	0,23	0,04	0,08	0,01
4	Bed Siku 40x40x6mm	BH	44,00	0,46	-	-	21,33	0,15	21,33	0,15	16,00	0,12	5,33	0,04
5	Analisa Bed M16	BH	4,00	1,45	-	-	1,33	0,48	1,33	0,48	1,00	0,36	0,33	0,12
6	Pengadaan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	-	-	1,33	1,45	1,33	1,45	1,00	1,09	0,33	0,36
Jasi Perakitan dan Pengecatan														
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER														
1	Pengecatan Bed Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	9,33	0,19	9,33	0,19	7,00	0,14	2,33	0,05
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON														
1	Pengadaan Papan Lantai Kayu Bed 2 cm	M2	23,04	1,21	-	-	7,68	0,40	7,68	0,40	5,76	0,30	1,92	0,10
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON														
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	10,67	0,08	10,67	0,08	8,00	0,06	2,67	0,02
2	Pengadaan Profile Tank 2200 L	BH	4,00	2,31	-	-	1,33	0,77	1,33	0,77	1,00	0,58	0,33	0,19
PEKERJAAN PEMASANGAN KIRAN UMUM														
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pembangunan Lokasi Kian umum	M	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	2,50	0,01	(2,50)	(0,01)
PEKERJAAN TANAH														
1	Galian Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	0,46	0,02	(0,46)	(0,02)
2	Uraian Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	-	-	-	-	0,36	0,01	(0,36)	(0,01)
PEKERJAAN MITON														
1	Pekerjaan Perakitan	M2	15,48	0,67	-	-	-	-	-	-	3,92	0,17	(3,92)	(0,17)
2	Pengadaan Perakitan	M3	1,88	0,65	-	-	-	-	-	-	0,47	0,16	(0,47)	(0,16)
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KIRAN UMUM														
1	Pipa Keras 3/4"	BH	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02	(1,00)	(0,02)
2	Pipa Keras 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	-	-	-	-	16,00	0,12	(16,00)	(0,12)
3	Pipa Keras 3/4"	TR	4,00	1,16	1,00	0,29	1,00	0,29	2,00	0,58	1,00	0,29	-	-
PEKERJAAN AKHIR														
1	Pelaksanaan Akhir			100,00		31,44		22,27		53,73		29,73		1,54

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


GURUWARUKANDOL, R. M.
NIP. 19791117 201004 1 002

Mabile, 25 November 2023
KONTRAKTOR PENCANAAN
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN


MURAHAN, A.
NIP. 19791117 201004 1 002



Objek : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cakupan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pengerjaan : Pengerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cakupan Air Tanah di Wilayah Nibele II (Koradit 1, Koradit 2, Wanggar Sari, Bumi Mula)
Koradit 1, Koradit 2, Wanggar Sari, Bumi Mula
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		MINGGU LULU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI		
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	3,00	1,36	-	-	3,00	1,36	-	-	-	-
2	Demobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	2,00	0,91	1,00	0,45	3,00	1,36	1,00	0,45	-	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pemasangan dan pemindahan alat katrol keur beserta alat pendukung lainnya.	Kol	4,00	1,93	3,00	1,45	-	-	3,00	1,45	-	-	-	-
MUKA Konsultasi Selesai dan Pemasangan K3 terdapat atas:														
1	Spandak	BH	1,00	0,04	1,00	0,01	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-
2	Topi pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,65	3,75	0,41	0,75	0,08	4,50	0,49	0,67	0,07	0,08	0,01
3	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	3,75	0,11	0,75	0,02	4,50	0,13	0,67	0,02	0,08	0,00
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Phg	6,00	0,04	3,75	0,03	0,75	0,01	4,50	0,03	0,67	0,01	0,08	0,00
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Phg	6,00	1,83	3,75	1,14	0,75	0,23	4,50	1,37	0,67	0,20	0,18	0,03
6	Rampai keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	3,75	0,27	0,75	0,05	4,50	0,33	0,67	0,05	0,08	0,01
PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI														
1	Pemboran Lantai Pengeboran	Li	4,00	0,58	3,00	0,44	-	-	3,00	0,44	-	-	-	-
2	Pengembangan segitiga format diameter 4"	M	195,00	3,173	146,25	23,30	-	-	146,25	23,30	-	-	-	-
3	Pemadatan/ pengapasan dinding lubang bor	M	195,00	2,42	97,50	1,31	48,75	0,65	146,25	1,96	48,75	0,65	-	-
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH														
1	Pengambilan Sampel dan Analisa Sampel	TK	4,00	1,74	3,00	1,31	-	-	3,00	1,31	-	-	-	-
2	Analisa hasil Corelog	TK	4,00	5,81	1,00	1,45	1,00	1,45	2,00	2,91	-	-	1,00	1,45
3	Analisa Hidrologi	TK	4,00	2,91	1,00	0,73	1,00	0,73	2,00	1,45	1,00	0,73	-	-
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR														
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	97,50	2,96	48,75	1,43	146,25	4,45	48,75	1,43	-	-
2	Bottom Pipe	BH	4,00	0,06	2,00	0,03	1,00	0,01	3,00	0,04	1,00	0,01	-	-
PENGADAAN BAHAN IRISAN KONSTRUKSI SUMUR														
1	Penggunaan dinding lubang bor (Material Pijihan) Gravel Park tertentu.	M3	3,43	0,51	1,72	0,26	0,86	0,13	2,57	0,38	0,86	0,13	-	-
PEKERJAAN PUMPING TEST														
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	-	-	12,00	0,87	-	-	-	-
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	-	-	12,00	0,87	-	-	-	-
PEKERJAAN PENYELISIHAN														
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,58	1,00	0,15	1,00	0,15	2,00	0,29	1,00	0,15	-	-
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA A SUBMERSIBEL														
POMPA AIR BAKU														
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	-	-	2,00	3,55	-	-	-	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	89,50	0,34	-	-	89,50	0,34	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR														
PEKERJAAN PERIAPAN :														
1	Pemboran Lantai Tower	M2	100,00	0,31	50,00	0,16	25,00	0,08	75,00	0,24	-	-	25,00	0,08
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,11	0,01	0,05	0,00	0,17	0,01	-	-	0,06	0,00
3	Unggan Tanah	M3	0,06	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER														
1	Skaf	Kg	168,80	3,54	84,40	0,27	42,20	0,13	126,60	0,40	-	-	42,20	0,13
2	Pelaksanaan Pemasangan Skaf	M2	13,44	0,57	6,72	0,29	3,36	0,14	10,08	0,43	-	-	3,36	0,14
3	Pembuatan Scaffolding Skaf	M3	3,52	1,29	1,76	0,65	0,88	0,32	2,64	0,97	-	-	0,88	0,32
4	Penggunaan Beton Skaf K-175													
1	Pondasi TIK	Kg	71,00	0,23	35,50	0,11	17,75	0,06	53,25	0,17	-	-	17,75	0,06
2	Pelaksanaan Pemasangan Pondasi TIK	M2	17,28	0,73	8,64	0,37	4,32	0,18	12,96	0,55	-	-	4,32	0,18
3	Pembuatan Scaffolding Pondasi TIK	M3	4,64	1,76	2,32	0,88	1,16	0,44	3,48	1,32	-	-	1,16	0,44
4	Penggunaan Beton Pondasi TIK K-175													
PEKERJAAN RANGKA DAYA TANGGA TOWER														
1	Besi Baja 80,80,8 Transi Utama	Kg	1,958,88	3,43	979,44	1,21	489,72	1,21	1,305,92	2,42	-	-	489,72	1,21
2	Besi Baja 40,40,4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	176,40	0,33	88,20	0,33	235,20	0,67	-	-	88,20	0,33
3	Besi Baja 40,40,4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	0,46	0,05	0,23	0,05	0,61	0,10	-	-	0,23	0,05
4	Plat manhole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	32,00	0,15	16,00	0,15	48,00	0,31	-	-	16,00	0,15
5	Analisa Besi M14	Bh	4,00	1,45	2,00	0,48	1,33	0,48	2,67	0,97	-	-	1,33	0,48
6	Penggunaan Tenaga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	2,00	4,36	2,00	4,36	2,00	4,36	-	-	2,00	4,36
7	Jasa Pemasangan dan Pengecatan													
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER														
1	Penggunaan Besi Baja Rangka Tower	M2	28,00	0,57	14,00	0,19	7,00	0,19	21,00	0,38	-	-	7,00	0,19
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON														
1	Penggunaan Papan Lantai Kayu Besi 1x2 cm	M2	23,04	1,21	11,52	0,40	5,76	0,40	17,28	0,81	-	-	5,76	0,40
PEKERJAAN PERIAPAN DARI SUMUR MASUK TANDON														
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	16,00	0,08	8,00	0,08	24,00	0,16	-	-	8,00	0,08
2	Penggunaan Profil Torsi 200x1	Bh	4,00	2,31	2,00	0,77	1,33	0,77	2,67	1,54	-	-	1,33	0,77
PEKERJAAN PEMASANGAN KIRAN UMUM														
PEKERJAAN PERIAPAN :														
1	Pemboran Lantai Kiri sumur	M	10,00	0,03	-	-	5,00	0,02	5,00	0,02	-	-	5,00	0,02
PEKERJAAN TANAH														
1	Galian Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	0,92	0,05	0,92	0,05	-	-	0,92	0,05
2	Unggan Tanah	M3	1,44	0,02	-	-	0,72	0,01	0,72	0,01	-	-	0,72	0,01
PEKERJAAN BETON														
1	Pelaksanaan Pemasangan Beton	M2	15,68	0,67	-	-	7,84	0,33	7,84	0,33	-	-	7,84	0,33
2	Pelaksanaan Cor Beton Beton Kiri Air	M3	1,88	0,63	-	-	0,94	0,33	0,94	0,33	-	-	0,94	0,33
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KIRAN UMUM														
1	Besi Baja 3/4"	Bh	4,00	0,08	-	-	2,00	0,04	2,00	0,04	-	-	2,00	0,04
2	Besi Air PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	-	-	2,00	0,02	2,00	0,02	-	-	2,00	0,02
3	Pipa Air PVC 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-	32,00	0,24
PEKERJAAN AIRBOR														
1	Pelaksanaan Airbor	TK	4,00	1,16	2,00	0,58	-	-	2,00	0,58	-	-	-	-
SUMILAH														
				100,00		53,71		13,90		66,69			9,03	

PEJABAT PELAKSANA TEORIS KEGIATAN

SUHAWAN BEANDAK, S. M. Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Notaris 22 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Notaris

KONTRAKTOR PELAKSANA:
CV. FLORENCIA PAPUA DRILL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samarinda-Berau - Pk. Berau - Nabire 98114

KONSULTAN PENGHAS:
CV. ANUGERAN PAPUA KONSULTAN

Lokasi: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pekerjaan: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Koradit 1, Koradit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli)
Lokasi: Koradit 1, Koradit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli
Tahun Anggaran: 2023

LAPORAN MINGGUAN

NO		URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		REVISI			
			SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Mobilisasi peralatan bar 1 (sepi) unit dan alat bantu serta team personel dan workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	3,00	1,34	1,00	0,45	4,00	1,81	1,00	0,45	-	-		
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (sepi) unit dan alat bantu serta team personel dan workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	3,00	1,34	-	-	3,00	1,34	-	-	-	-		
3	Pemasangan Pipa dan Mesh untuk uji permeabilitas sumur termasuk pembungkusan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat bantu lainnya.	Kol	4,00	1,93	3,00	1,45	1,00	0,48	4,00	1,93	1,00	0,48	-	-		
PEKERJAAN PENGALIHAN SUMUR EKSPLOKASI																
1	Isamduk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-	-		
2	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,45	4,50	0,49	0,75	0,08	5,25	0,57	0,47	0,07	0,08	0,07		
3	Pelindung muka (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	4,50	0,13	0,75	0,02	5,25	0,15	0,47	0,02	0,08	0,01		
4	Kantong tangan (Safety Gloves)	Pkg	6,00	0,04	4,50	0,03	0,75	0,01	5,25	0,04	0,47	0,01	0,08	0,01		
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pkg	6,00	1,83	4,50	1,37	0,75	0,23	5,25	1,60	0,47	0,20	0,08	0,03		
6	Ramp keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	4,50	0,33	0,75	0,05	5,25	0,38	0,47	0,05	0,08	0,01		
PEKERJAAN PENGECATAN SUMUR EKSPLOKASI																
1	Pembesian Lokal Pengalihan	Is	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	1,00	0,15	-	-		
2	Pengalihan setiap Formasi diameter 4"	M	195,00	33,73	146,25	25,30	48,75	14,43	195,00	33,73	48,75	8,43	-	-		
3	Pemasangan / perapian dinding lubang bor	M	195,00	1,62	146,25	1,96	-	-	146,25	1,96	-	-	-	-		
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPAH TANAH																
1	Pengambilan Sampel dan Analisa Sampel	Trk	4,00	1,74	3,00	1,31	1,00	0,44	4,00	1,74	1,00	0,44	-	-		
2	Analisa hasil Contour	Trk	4,00	5,81	2,00	2,91	1,00	1,45	3,00	4,34	1,00	1,45	-	-		
3	Analisa Hidrologi	Trk	4,00	2,91	2,00	1,45	1,00	0,73	3,00	2,18	-	-	1,00	0,73		
4	Laporan Akhir	Is	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PENGADAAN PIPA KONGKRESI SUMUR																
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,41	-	-	146,25	4,45	-	-	-	-		
2	Bottom Plug	BH	4,00	0,04	3,00	0,04	-	-	3,00	0,04	-	-	-	-		
PENGADAAN BAHAN ISIRAN KONGKRESI SUMUR																
1	Pengaliran dinding lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park berbeton	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	-	-	2,57	0,38	-	-	-	-		
PEKERJAAN PUMPING TR																
1	Uji Pemasangan berbeton dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	6,00	0,43	18,00	1,30	6,00	0,43	-	-		
2	Uji Perv. Ujian	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	6,00	0,43	18,00	1,30	6,00	0,43	-	-		
PEKERJAAN PENYERAPAN																
1	Pembuatan Box beton	Is	4,00	0,58	2,00	0,29	1,00	0,15	3,00	0,44	1,00	0,15	-	-		
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE																
POMPA AIR BAKU																
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	1,00	1,78	3,00	5,33	1,00	1,78	-	-		
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	89,50	0,34	44,75	0,17	134,25	0,50	44,75	0,17	-	-		
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR																
PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pembesian Lokal Tower	M2	100,00	0,31	75,00	0,24	25,00	0,08	100,00	0,31	25,00	0,08	-	-		
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,06	0,00	-	-		
3	Urutan Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	-	-		
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER																
1	Batu	Kg	168,80	0,54	126,60	0,40	42,20	0,13	168,80	0,54	42,20	0,13	-	-		
2	Pekerjaan Pembesian Beton	M2	13,44	0,57	10,08	0,43	3,36	0,14	13,44	0,57	3,36	0,14	-	-		
3	Pembesian Belding Beton	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	0,88	0,32	-	-		
4	Pengaliran Beton Beton K-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONDASI TRK																
1	Pekerjaan Pembesian Fondasi TRK	Kg	71,00	0,23	53,25	0,17	17,75	0,06	71,00	0,23	17,75	0,06	-	-		
2	Pembesian Belding Fondasi TRK	M2	17,28	0,73	12,96	0,55	4,32	0,18	17,28	0,73	4,32	0,18	-	-		
3	Pengaliran Beton Fondasi TRK K-175	M3	4,44	1,76	3,48	1,32	1,16	0,44	4,44	1,76	1,16	0,44	-	-		
PEKERJAAN RANGKAI DAN TANGGA TOWER																
1	Besi Baja 80.80.6 Tangga Utama	Kg	1,958,88	3,63	1,403,92	2,42	652,96	1,21	1,958,88	3,63	489,72	3,91	163,24	0,30		
2	Besi Baja 40.40.4 (Pondasi)	Kg	352,80	1,00	235,20	0,67	117,60	0,33	352,80	1,00	88,20	0,25	39,40	0,08		
3	Besi Baja 40.40.4 (Pondasi)	M2	0,92	0,16	0,61	0,10	0,31	0,05	0,92	0,16	0,23	0,04	0,08	0,01		
4	Plat marbete tebal 1 cm	Bh	64,00	0,46	42,67	0,31	21,33	0,15	64,00	0,46	16,00	0,12	5,33	0,04		
5	Amplas Besi M16	Bh	4,00	1,45	2,67	0,97	1,33	0,48	4,00	1,45	1,00	0,36	0,33	0,12		
6	Pengaliran Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,34	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,34	1,00	1,09	0,33	0,34		
JARU PERALIHAN DAN PENGALIHAN																
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKAI TOWER																
1	Pengaliran Besi Baja Rangka Tower	M2	28,00	0,57	18,67	0,38	9,33	0,19	28,00	0,57	7,00	0,14	2,33	0,05		
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON																
1	Pengaliran Besi Baja Rangka Tandon	M2	23,04	1,21	15,36	0,81	7,68	0,40	23,04	1,21	5,76	0,30	1,92	0,10		
PEKERJAAN PAPAN LANTAI KAYU BESI 2 cm																
1	Pengaliran Papan Lantai Kayu Besi 2 cm	M	32,00	0,24	21,33	0,16	10,67	0,08	32,00	0,24	8,00	0,06	2,67	0,02		
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	Bh	4,00	2,31	2,67	1,54	1,33	0,77	4,00	2,31	1,00	0,58	0,33	0,19		
PENGADAAN PROFIL TANGK 2200 L																
PEKERJAAN PEMASANGAN KANAL UMUM																
PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pembesian Lokal Kan. Umum	M	10,00	0,03	5,00	0,02	5,00	0,02	10,00	0,03	2,50	0,01	2,50	0,01		
PEKERJAAN TANAH																
1	Urutan Tanah	M3	1,84	0,10	0,92	0,05	0,92	0,05	1,84	0,10	0,46	0,02	0,46	0,02		
2	Urutan Kembali	M3	1,44	0,02	0,72	0,01	0,72	0,01	1,44	0,02	0,34	0,01	0,34	0,01		
URUTAN KAMBAL																
PEKERJAAN BETON																
1	Pekerjaan Pas. beton	M2	15,68	0,67	7,34	0,33	7,34	0,33	15,68	0,67	3,92	0,17	3,92	0,17		
2	Pekerjaan Pas. beton	M3	1,88	0,45	0,94	0,33	0,94	0,33	1,88	0,45	0,47	0,14	0,47	0,14		
PEKERJAAN COR BESI, BESI KEM. AIR																
PEMERANGKAIAN PIPA DARI TANDON KE KANAL UMUM																
1	Pipa Kant 3/4	Bh	4,00	0,01	2,00	0,04	2,00	0,04	4,00	0,08	1,00	0,01	1,00	0,01		
2	Kan. Air PVC 3/4"	Bh	4,00	0,04	2,00	0,02	2,00	0,02	4,00	0,04	1,00	0,01	1,00	0,01		
3	Pas. Air PVC 3/4"	M	64,00	0,48	32,00	0,24	32,00	0,24	64,00	0,48	16,00	0,12	16,00	0,12		
PEKERJAAN AIRBOR																
1	Pekerjaan Airbor	Trk	4,00	1,14	2,00	0,58	1,00	0,29	3,00	0,87	1,00	0,29	-	-		
Jumlah																
				100,00		66,65		23,30						2,57		

PEKERJA PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

SUBAHAN NIKANDAS, ST. M. S.
NIP. 19791117 201004 1 002

10 Desember 2023
KONSULTAN PENGHAS
CV. ANUGERAN PAPUA KONSULTAN

Fakhrudin

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. FLORENCIA PAPUA DTL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TEKNIK KERTAS, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samudra ke Bawak - P.N. Sarawak - Madoke 78816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Tahun Anggaran

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabine II (Koradri 1, Koradri 2, Wanggar Sor, Bura, Aulia)
: Koradri 1, Koradri 2, Wanggar Sor, Bura, Aulia
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : Delapan
Periode : 11 Desember 2023 - 17 Desember 2023
KE- 8

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
		EAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi pendirian bar 1 (valu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-	4,00	1,81	-	-	-
2	Demobilisasi pendirian bar 1 (valu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kol	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	1,00	0,45	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembangunan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat pertukangan lainnya.	Kol	4,00	1,93	4,00	1,93	-	-	4,00	1,93	-	-	-
B. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1	Standarisasi	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	-	-
2	Test pendulum (Safety Helmet)	BH	6,00	0,65	5,25	0,57	0,75	0,08	6,00	0,65	0,67	0,07	0,08
3	Refleksi mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	5,25	0,13	0,75	0,02	6,00	0,17	0,67	0,02	0,08
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pisg	6,00	0,04	5,25	0,04	0,75	0,01	6,00	0,04	0,67	0,00	0,09
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and low cap)	Pisg	6,00	1,83	5,25	1,60	0,75	0,23	6,00	1,83	0,67	0,20	0,21
6	Bompl keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	5,25	0,38	0,75	0,05	6,00	0,44	0,67	0,05	0,38
C. PEKERJAAN PENGBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
1	Pembuatan Lokal Pengaliran	Li	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-	4,00	0,58	-	-	-
2	Pengaliran sesat format diameter 6"	M	195,00	33,73	195,00	33,73	-	-	195,00	33,73	-	-	-
3	Pemadatan / pengisian dinding lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,96	48,75	0,65	195,00	2,62	48,75	0,65	-
D. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1	Pengambilan Sample dan Analisa Sample	TR	4,00	1,74	4,00	1,74	-	-	4,00	1,74	-	-	-
2	Analisa hasil Contour	TR	4,00	5,81	3,00	4,36	1,00	1,45	4,00	5,81	-	-	1,00
3	Analisa Hidrologi	TR	4,00	2,91	3,00	2,18	1,00	0,73	4,00	2,91	1,00	0,73	-
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00
E. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	48,75	1,45	-
2	Bottom Pipe	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	1,00	0,01	-
F. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pengisian dinding lubang Bor (Material Pihon) Gravel Park 100mm	M3	3,43	0,51	2,57	0,31	0,86	0,13	3,43	0,51	0,86	0,13	-
G. PEKERJAAN PUMPING TES													
1	Uji Pemompaan bekap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,73	18,00	1,30	6,00	0,43	24,00	1,73	6,00	0,43	-
H. PEKERJAAN PENYETELAHAN													
1	Pembuatan Bore Sumur	Li	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	1,00	0,15	-
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
POMPA AIR BAYU													
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	3,00	5,33	1,00	1,78	4,00	7,10	1,00	1,78	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	134,25	0,50	44,75	0,17	179,00	0,67	44,75	0,17	-
J. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERSIAPAN :													
1	Pembuatan Lokal Tower	M2	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-	100,00	0,31	25,00	0,08	(25,00)
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-	0,22	0,01	0,06	0,00	(0,16)
3	Urusan Tanah	M3	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-	0,06	0,00	0,02	0,00	(0,02)
K. PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER													
a. Roof													
1	Pekerjaan Pemasangan Blok	Kg	168,80	0,54	168,80	0,54	-	-	168,80	0,54	47,20	0,13	(121,60)
2	Pembuatan Beldinding Blok	M2	13,44	0,57	13,44	0,57	-	-	13,44	0,57	3,36	0,14	(10,08)
3	Pengacoran Beton Blok K-175	M3	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-	3,52	1,29	0,88	0,32	(0,88)
b. Pondasi TRK													
1	Pekerjaan Pemasangan Pondasi TRK	Kg	71,00	0,23	71,00	0,23	-	-	71,00	0,23	17,75	0,06	(53,25)
2	Pembuatan Beldinding Pondasi TRK	M2	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-	17,28	0,73	4,32	0,18	(12,96)
3	Pengacoran Beton Pondasi TRK K-175	M3	4,64	1,76	4,64	1,76	-	-	4,64	1,76	1,16	0,44	(3,48)
L. PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
1	Besi Stn 80,80.8 Tangga Utama	Kg	1,958,88	3,63	1,958,88	3,63	-	-	1,958,88	3,63	-	-	-
2	Besi Stn 40,40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	352,80	1,00	-	-	352,80	1,00	-	-	-
3	Pelat marbala tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	0,92	0,16	-	-	0,92	0,16	-	-	-
4	Andar besi M14	BH	64,00	0,46	64,00	0,46	-	-	64,00	0,46	-	-	-
5	Andar besi M16	BH	4,00	1,45	4,00	1,45	-	-	4,00	1,45	-	-	-
6	Pemasangan, Tension Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	4,00	4,36	-	-	4,00	4,36	-	-	-
M. PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
1	Pengacoran Besi Stn Rangka Tower	M2	28,00	0,57	28,00	0,57	-	-	28,00	0,57	-	-	-
N. PEKERJAAN LANTAI DINDING TANDON													
1	Pengacoran Rapan Lantai Kayu Besi" = 2 cm	M2	23,04	1,21	23,04	1,21	-	-	23,04	1,21	-	-	-
O. PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,21	32,00	0,24	-	-	32,00	0,24	-	-	-
2	Pemasangan Profil Tank 2200 L	BH	4,00	2,31	4,00	2,31	-	-	4,00	2,31	-	-	-
P. PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pembuatan Lokal Kran umum	Li	10,00	0,03	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	-	-	-
PEKERJAAN TANAH													
1	Galian Tanah	M3	1,84	0,10	1,84	0,10	-	-	1,84	0,10	-	-	-
2	Urusan Tanah	M3	1,44	0,02	1,44	0,02	-	-	1,44	0,02	-	-	-
Q. PEKERJAAN BETON													
1	Pekerjaan Per bekisting	M2	15,68	0,67	15,68	0,67	-	-	15,68	0,67	-	-	-
2	Pekerjaan Per bekisting	M3	1,88	0,65	1,88	0,65	-	-	1,88	0,65	-	-	-
R. PEMASANGAN PIPA DAN TANDON KE KRAN UMUM													
1	Pipa Stn 3/4	BH	4,00	0,08	4,00	0,08	-	-	4,00	0,08	-	-	-
2	Kran Air PVC B 3/4"	BH	4,00	0,04	4,00	0,04	-	-	4,00	0,04	-	-	-
3	Pipa PVC B 3/4"	M	64,00	0,48	64,00	0,48	-	-	64,00	0,48	-	-	-
PEKERJAAN Y ADHER													
1	Pekerjaan Akhir	TR	4,00	1,16	3,00	0,87	1,00	0,29	4,00	1,16	-	-	1,00
Jumlah				100,00		93,00		10,00		100,00			1,88

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

(Tanda Tangan)

GEMARAN BEKASIA, ST. M

NIP. 19791117 201004 1 002

Nabine, 12 Desember 2023

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

(Tanda Tangan)

ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



Kegabatan	: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	
Pelaksanaan	: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nalire II (Karadidi 1, Karadidi 2, Wonggar Sari, Bumi Mulla)	
Lokasi	: Karadidi 1, Karadidi 2, Wonggar Sari, Bumi Mulla	
Tahun Anggaran	: 2023	Bulan Ke : Dua

LAPORAN BULANAN

Tahun Anggaran : 2023	Bulan Ke : Dua
	Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	Periode :01 November 2023 - 30 November 2023														KE- 2
		KONTRAK		BULAN LAJU		BULAN INI		M/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI				
		IAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Mobilisasi peralatan bar 1 (setok) unit dan alat bantunya serta team personel dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36				
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (setok) unit dan alat bantunya serta team personel dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	1,00	0,45	2,00	0,91	3,00	1,36	3,00	1,36				
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk (g) pemampasan sumur termasuk pemasangan dan pemindahan alat katrol ukur beserta alat penarikapannya	Kali	4,00	1,93	1,00	0,48	2,00	0,97	3,00	1,45	3,00	1,45				
SMES Ketersediaan Sediakan dan Promosi K3 hardhat atau:																
1	Spanduk	BH	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-		
2	Tutup pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,65	1,50	0,15	3,00	0,33	4,50	0,49	4,00	0,44	0,50	0,05		
3	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,17	1,50	0,04	3,00	0,09	4,50	0,13	4,00	0,12	0,50	0,01		
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pkg	6,00	0,04	1,50	0,01	3,00	0,02	4,50	0,03	4,00	0,03	0,50	0,00		
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pkg	6,00	1,83	1,50	0,45	3,00	0,92	4,50	1,37	4,00	1,27	0,50	0,15		
6	Berat keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	1,50	0,11	3,00	0,22	4,50	0,33	4,00	0,29	0,50	0,04		
B	PEKERJAAN PENGABRIKAN SUMUR EKSPLORASI															
1	Pembastaran Lokal Pengaliran	Lt	4,00	0,58	1,00	0,13	2,00	0,29	3,00	0,44	3,00	0,44	-	-		
2	Pengaliran sebagai format diameter 4"	M	195,00	33,73	48,75	8,43	97,50	16,87	144,25	25,30	144,25	25,30	-	-		
3	Pemadaman/ peralatan dinding lubang bor	M	195,00	2,62	48,75	0,61	97,50	1,31	144,25	1,96	144,25	1,96	-	-		
C	PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH															
1	Pengambilan sampel dan Analisa Sample	TK	4,00	1,74	1,00	0,44	2,00	0,87	3,00	1,31	3,00	1,31	-	-		
2	Analisa hasil Coring	TK	4,00	5,81	-	-	2,00	2,91	2,00	2,91	3,00	3,36	(1,00)	(1,45)		
3	Analisa Hidrologi	TK	4,00	2,91	-	-	2,00	1,45	2,00	1,45	2,10	1,45	-	-		
4	Laporan Akhla	LS	1,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR															
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	195,00	5,93	48,75	1,48	97,50	2,96	144,25	4,45	144,25	4,45	-	-		
2	Bottom Plug	FH	4,00	0,06	1,00	0,01	2,00	0,03	3,00	0,04	3,00	0,04	-	-		
E	PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR															
1	Pemasangan dinding Lubang Bor (Material Filtered) Gravel Park beresnya	M3	3,43	0,51	0,86	0,13	1,72	0,26	2,57	0,38	2,57	0,38	-	-		
F	PEKERJAAN PUMPUNG TES															
1	Uji Pemompaan bertahap dan UI detail tetap	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-		
2	Uji Penurunan	Jam	24,00	1,73	-	-	12,00	0,87	12,00	0,87	12,00	0,87	-	-		
G	PEKERJAAN PENYERPLAAN															
1	Pembuatan Box Runtir	LS	4,00	0,58	-	-	2,00	0,29	2,00	0,29	2,00	0,29	-	-		
H	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSEBLE															
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,10	-	-	2,00	3,55	2,00	3,55	2,00	3,55	-	-		
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	179,00	0,67	-	-	89,50	0,31	89,50	0,34	89,50	0,34	-	-		
I	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR															
PEKERJAAN PERBAHAN :																
1	Pembastaran Lokal Tower	M2	100,00	0,31	-	-	75,00	0,24	75,00	0,24	50,00	0,16	25,00	0,08		
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	0,17	0,01	0,17	0,01	0,11	0,01	0,04	0,00		
3	Unsur Tanah	M3	0,04	0,00	-	-	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00		
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER																
a	Beef															
1	Pekerjaan Pembesian Beef	Kg	168,80	0,54	-	-	126,60	0,40	126,60	0,40	84,40	0,27	42,20	0,13		
2	Pembuatan Belditing Beef	M2	13,44	0,57	-	-	10,08	0,43	10,08	0,43	6,72	0,29	3,36	0,14		
3	Pemasangan Beton Beef K-175	M3	3,52	1,29	-	-	2,64	0,97	2,64	0,97	1,76	0,65	0,88	0,32		
b	Pendak TIK															
1	Pekerjaan Pembesian Pendak TIK	Kg	71,00	0,23	-	-	53,25	0,17	53,25	0,17	35,50	0,11	17,75	0,06		
2	Pembesian Belditing Pendak TIK	M2	17,28	0,73	-	-	12,96	0,55	12,96	0,55	8,64	0,37	4,32	0,18		
3	Pemasangan Beton Pendak TIK K-175	M3	4,44	1,74	-	-	3,48	1,32	3,48	1,32	2,32	0,98	1,16	0,44		
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER																
1	Beef 30x 60,50,4 Tiang Utama	Kg	1,958,88	3,43	-	-	1,305,92	2,42	1,305,92	2,42	979,44	1,82	324,48	0,61		
2	Beef 30x 40,50,4 (Pagar)	Kg	332,80	1,00	-	-	235,20	0,67	235,20	0,67	176,40	0,50	58,80	0,17		
3	Plat marhalah tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	0,71	0,10	0,61	0,10	0,44	0,08	0,15	0,03		
4	Anchur Beef M16	BH	64,00	0,46	-	-	42,67	0,31	42,67	0,31	32,00	0,23	10,67	0,08		
5	Pengaliran Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,45	-	-	2,67	0,97	2,67	0,97	2,00	0,73	0,67	0,24		
6	Jasa Perakitan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,36	-	-	2,67	2,91	2,67	2,91	2,00	2,18	0,67	0,73		
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER																
1	Pengecatan Beef 30x Rangka Tower	M2	28,00	0,57	-	-	18,67	0,38	18,67	0,38	14,00	0,28	4,67	0,09		
PEKERJAAN LANTAI DUKUKAN TANDON																
1	Pengaliran Lantai Dukukan Tandon	M2	23,04	1,21	-	-	15,36	0,81	15,36	0,81	11,52	0,61	3,84	0,20		
PEKERJAAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON																
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	-	-	21,33	0,16	21,33	0,16	16,00	0,12	5,33	0,04		
2	Pemasangan Profile Tank 2300 L	bh	4,00	2,31	-	-	2,67	1,54	2,67	1,54	2,00	1,16	0,67	0,36		
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM																
1	PEKERJAAN PERBAHAN															
1	Pembastaran Lokal Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	5,00	0,02	5,00	0,02	5,00	0,02	-	-		
PEKERJAAN TANAH																
1	Galian tanah	M3	1,84	0,10	-	-	0,92	0,05	0,92	0,05	0,72	0,01	-	-		
2	Unsur Kambit	M3	1,44	0,02	-	-	0,72	0,01	0,72	0,01	0,72	0,01	-	-		
PEKERJAAN BETON																
1	Pekerjaan Cor Belding	M2	15,48	0,67	-	-	7,84	0,33	7,84	0,33	7,84	0,33	-	-		
2	Pekerjaan Cor Belding Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	-	-	0,94	0,33	0,94	0,33	0,94	0,33	-	-		
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM																
1	Beef 30x 3/4	BH	4,00	0,08	-	-	2,60	0,04	2,60	0,04	2,00	0,04	-	-		
2	Beef Air PVC Ø 3/4"	BH	4,00	0,04	-	-	2,60	0,02	2,60	0,02	2,00	0,02	-	-		
3	Beef Air PVC Ø 3/4"	M	64,00	0,48	-	-	32,00	0,34	32,00	0,24	32,00	0,24	-	-		
PEKERJAAN AIRBIL																
1	Pekerjaan Akhla	TK	4,00	1,16	-	-	2,00	0,38	2,00	0,58	2,00	0,58	-	-		
2	Pekerjaan Akhla	TK	4,00	1,16	-	-	2,00	0,38	2,00	0,58	2,00	0,58	-	-		

Jumlah

PELABAY PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN


G. W. ISKANDAR, II, M. S.
NIP 19791117 201004 1 002

Negative, 30 November 2013

KONSULTAN PENGAWAS
CY ANUSIRAH PATIA KONSULTAN

CONCLUSIONS

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. FLORENCIA PAPUA DRILL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sorowakurik-Buruk - PT Sorowakurik - Nabun Nabun

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabun II Kecamatan 1, Kecamatan 2, Wewenur Sari, Bumi Muli
Lokasi : Korodit 1, Korodit 2, Wanggar Sari, Bumi Muli
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN BULANAN

KT - 3

Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023
Tgl dan Ke : Tigo

NO	URAIAN PEKERJAAN	Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023												REMARKS		
		KONTRAK		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI				
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Mobilisasi peralatan bor 1 (setu) unit dan alat bantu serta team person dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-		
2	Demobilisasi peralatan bor 1 (setu) unit dan alat bantu serta team person dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,81	3,00	1,36	1,00	0,45	4,00	1,81	4,00	1,81	-	-		
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pengangkutan dan pemindahan alat ke lokasi serta alat pendukung lainnya	Kali	4,00	1,93	3,00	1,45	1,00	0,48	4,00	1,93	4,00	1,93	-	-		
B. PEKERJAAN PENGBORAN DAN PEMOMPAAN																
1	Penyediaan dan Pemasangan Pompa Submersible	Unit	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-		
2	Test pumping (Safety Helmer)	Bh	6,00	0,65	4,50	0,49	1,50	0,16	6,00	0,65	6,00	0,65	0,47	0,07		
3	Penyediaan mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,17	4,50	0,11	1,50	0,04	6,00	0,17	6,00	0,17	0,67	0,02		
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pkg	6,00	0,04	4,50	0,03	1,50	0,01	6,00	0,04	6,00	0,04	0,67	0,00		
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and low cap)	Pkg	6,00	1,83	4,50	1,37	1,50	0,46	6,00	1,83	6,00	1,83	0,67	0,00		
6	Ramp keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	4,50	0,33	1,50	0,11	6,00	0,44	6,00	0,44	0,67	0,00		
C. PEKERJAAN PENGBORAN SUMUR EKSPLOASI																
1	Pembuatan Lokasi Pengambilan	Li	4,00	0,58	3,00	0,44	1,00	0,15	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-		
2	Pengambilan sampel Formasi diameter 4"	M	195,00	33,73	146,25	25,30	48,75	8,43	195,00	33,73	195,00	33,73	-	-		
3	Pemadaman / pengisian ulang lubang bor	M	195,00	2,62	146,25	1,96	48,75	0,65	195,00	2,62	195,00	2,62	-	-		
D. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH																
1	Pengambilan Sample dan Analisa Sample	TR	4,00	1,74	3,00	1,31	1,00	0,44	4,00	1,74	4,00	1,74	-	-		
2	Analisa hasil Coring	TR	4,00	5,81	2,00	2,91	2,00	2,91	4,00	5,81	4,00	5,81	-	-		
3	Analisa Hidrologi	TR	4,00	2,91	2,00	1,45	2,00	1,45	4,00	2,91	3,00	2,18	1,00	0,73		
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,43	-	-	1,00	1,45	1,00	1,45	-	-	1,00	1,45		
E. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR																
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	19,00	5,93	146,25	4,45	48,75	1,48	195,00	5,93	195,00	5,93	-	-		
2	Bottom Pipe	BH	4,00	0,06	3,00	0,04	1,00	0,01	4,00	0,06	4,00	0,06	-	-		
F. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR																
1	Pengisian ulang lubang Bor (Material Pijih) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,51	2,57	0,38	0,86	0,13	3,43	0,51	3,43	0,51	-	-		
G. PEKERJAAN PUMPUNG TES																
1	Uji Pemompaan berkapasitansi dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-		
2	Uji Pemompaan	Jam	24,00	1,73	12,00	0,87	12,00	0,87	24,00	1,73	24,00	1,73	-	-		
H. PEKERJAAN PENYERAPAN																
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,58	2,00	0,29	2,00	0,29	4,00	0,58	4,00	0,58	-	-		
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERGIBLE																
J. POMPA AIR BAKU																
1	Pompa 3 submersible Phase	Unit	4,00	7,10	2,00	3,55	2,00	3,55	4,00	7,10	4,00	7,10	-	-		
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	179,00	0,67	89,50	0,34	89,50	0,24	179,00	0,67	179,00	0,67	-	-		
K. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR																
L. PEKERJAAN PERISAPAN																
1	Pembuatan Lokasi Tower	M2	100,00	0,31	75,00	0,24	25,01	0,08	100,00	0,31	100,00	0,31	-	-		
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,22	0,01	-	-		
3	Unguan Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-		
M. PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER																
N. BESI																
1	Pekerjaan Pemasangan BESI	Eg	168,80	0,54	126,60	0,40	42,20	0,13	168,80	0,54	168,80	0,54	-	-		
2	Pekerjaan Pemasangan BESI	M2	13,44	0,57	10,08	0,43	3,36	0,14	13,44	0,57	13,44	0,57	-	-		
3	Pembuatan Bekisting BESI	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-		
4	Pengapuran Beton Bekisting K-175	M3	3,52	1,29	2,64	0,97	0,88	0,32	3,52	1,29	3,52	1,29	-	-		
O. PONDASI TIK																
1	Pekerjaan Pemasangan Pondasi TIK	Eg	71,00	0,23	53,25	0,17	17,75	0,06	71,00	0,23	71,00	0,23	-	-		
2	Pembuatan Bekisting Pondasi TIK	M2	17,28	0,73	12,96	0,55	4,32	0,18	17,28	0,73	17,28	0,73	-	-		
3	Pengapuran Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,64	1,76	3,48	1,32	1,16	0,44	4,64	1,76	4,64	1,76	-	-		
P. PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER																
1	Besi Baja 80.80.8 Tong Utama	Kg	1,950,00	3,63	1,305,92	2,42	644,08	1,21	1,950,00	3,63	1,469,16	2,73	480,84	0,91		
2	Besi Baja 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,00	235,20	0,67	117,60	0,33	352,80	1,00	264,60	0,75	88,20	0,25		
3	Pipa manhole tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	0,61	0,10	0,31	0,05	0,92	0,16	0,61	0,10	0,25	0,04		
4	Angkur Besi M16	Bh	64,00	0,46	42,67	0,31	21,33	0,15	64,00	0,46	48,00	0,33	16,00	0,12		
5	Pemasangan Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,45	2,67	0,97	1,33	0,48	4,00	1,45	3,00	1,09	1,00	0,36		
6	Pemasangan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,36	2,67	2,91	1,33	1,45	4,00	4,36	3,00	3,37	1,00	1,00		
Q. JANGKUTAN DAN PEMASANGAN																
R. PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER																
1	Pengapuran Besi Baja Rangka Tower	M2	28,00	0,57	18,47	0,38	9,53	0,19	28,00	0,57	21,00	0,43	7,00	0,14		
S. PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON																
1	Pengapuran Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,21	15,36	0,81	7,68	0,40	23,04	1,21	17,28	0,91	5,76	0,30		
T. PEKERJAAN PERISAPAN DARI SUMUR MASUK TANDON																
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,24	21,33	0,15	10,67	0,08	32,00	0,24	24,00	0,18	8,00	0,06		
2	Pemasangan Profil Tank 2200 L	bh	4,00	7,31	2,67	1,34	1,33	0,77	4,00	7,31	3,00	1,74	1,00	0,58		
U. PEKERJAAN PEMASANGAN KIRAN UMUM																
V. PEKERJAAN PERISAPAN																
1	Pembuatan Lokasi Kran umum	M	10,00	0,03	5,00	0,02	5,00	0,02	10,00	0,03	7,50	0,02	2,50	0,01		
W. PEKERJAAN TANAH																
1	Galian tanah	M3	1,84	0,10	0,92	0,05	0,92	0,05	1,84	0,10	1,38	0,07	0,46	0,02		
2	Unguan Tanah	M3	1,44	0,02	0,72	0,01	0,72	0,01	1,44	0,02	1,08	0,02	0,36	0,01		
X. PEKERJAAN BETON																
1	Pembuatan Pias bekisting	M2	15,68	0,67	7,84	0,33	7,84	0,33	15,68	0,67	11,76	0,50	3,92	0,14		
2	Pembuatan Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,65	0,94	0,31	0,94	0,33	1,88	0,65	1,41	0,49	0,47	0,14		
Y. PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KIRAN UMUM																
1	Pipa Besi 3/4"	Eh	4,00	0,08	2,00	0,04	2,00	0,04	4,00	0,08	3,00	0,04	1,00	0,02		
2	Pipa Besi 3/4"	Bh	4,00	0,04	2,00	0,02	2,00	0,02	4,00	0,04	3,00	0,03	1,00	0,01		
3	Pipa Besi 3/4"	M	64,00	0,48	32,00	0,24	32,00	0,24	64,00	0,48	48,00	0,36	16,00	0,12		
Z. PEKERJAAN AISIR																
1	Pembuatan AISIR	TR	4,00	1,14	2,00	0,58	2,00	0,58	4,00	1,14	3,00	0,87	1,00	0,29		
2	Pemeriksaan Akhir							33,31		100,00		92,81		7,19		
JUMLAH					100,00		66,89									

PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEGIATAN

GEMAWAN IKHARAH, T. M. H.
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabun, 12 Desember 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. FLORENCIA PAPUA DRILL



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanaba - Nabre 98816

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

KURVA S

Bulan Ke : Satu
Periode : 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023


KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabre II (Karaditi 1,
Karaditi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia)
LOKASI : Karaditi 1, Karaditi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia
TARUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74	RENCANA	1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	0,35	100,00
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	1,33	0,85	-	90,00
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00
			REALISASI	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78	RENCANA	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	60,00
			REALISASI	-	-	1,94	1,94	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	3,85	6,50	-	5,21	1,36	3,85	40,00
			REALISASI	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAN USUJIM	2,07	RENCANA	-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52	20,00
			REALISASI	-	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	10,00
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	10,00
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	0,00
JUMLAH				11,80	3,08	15,83	8,47	20,73	3,95	20,73	8,13	7,18	
RENCANA				11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00	
REALISASI				10,39	3,12	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF				10,39	13,51	-	-	-	-	-	-	-	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



SIMON RUMBOWAS
Pelaksana



KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabira II (Karaditi 1, Karaditi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia)
LOKASI : Karaditi 1, Karaditi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia
TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Dua
Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

KURVA S

TABEL ANGGARAN : 2023														
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	8,74	RENCANA	1,33	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,35	100,00
			REALISASI	1,37	0,85	1,33	0,85	1,33	0,65	1,33	0,85	-	-	90,00
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	59,39	RENCANA	10,47	2,28	11,33	3,01	11,48	3,15	11,48	4,02	2,18	80,00	
			REALISASI	9,01	2,28	9,88	2,28	12,21	4,60	12,21	6,92	-	70,00	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	7,78	RENCANA	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	80,00	
			REALISASI	-	-	1,94	-	1,94	-	1,94	1,94	-	50,00	
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	20,86	RENCANA	-	-	1,36	3,55	5,21	-	5,21	1,36	3,85	40,00	
			REALISASI	-	-	1,36	-	6,50	6,50	6,50	-	-	30,00	
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,07	RENCANA	-	-	-	0,52	0,52	-	0,52	-	0,52	20,00	
			REALISASI	-	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	10,00	
F	PEKERJAAN AKHIR	1,16	RENCANA	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	-	0,29	10,00	
			REALISASI	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	0,29	-	0,00	
	JUMLAH													
	RENCANA	BOBOT	100,00	11,80	3,08	15,63	8,47	20,73	3,85	20,73	8,13	7,19		
		KUMULATIF		11,80	14,88	30,80	39,27	60,00	63,95	84,69	92,81	100,00		
	REALISASI	BOBOT		10,39	3,12	14,52	3,42	22,27	12,98					
		KUMULATIF		10,39	13,51	28,03	31,44	53,71	66,69					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

(Signature)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

(Signature)
SIMON RUMBOWAS
Paboksana



CV. FLORENCIA PAPUA DRILL


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samubusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Karadidi I, Karadidi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia)
LOKASI : Karadidi 1, Karadidi 2, Wanggar Sari, Bumi Mulia
TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Tiga
Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

KURVA S

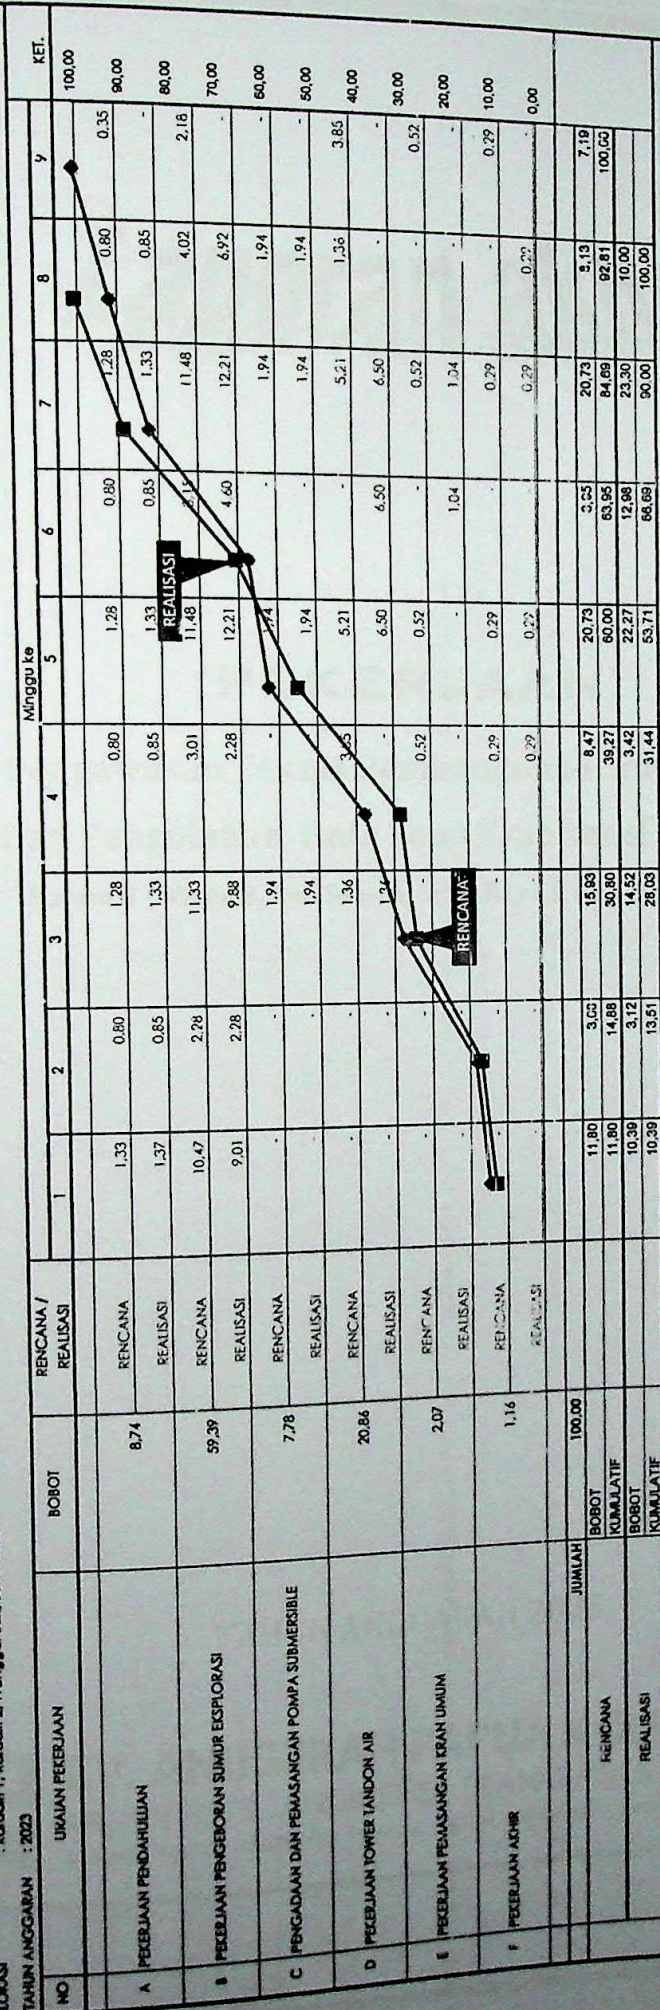

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

SIMON RUMBEWAS
Pejabat



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Sanabusa Bawali - PPI Sanoba - Nabire 98816

Laporan akhir

(PEKERJAAN)

**asa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Eksplorasi Dalam
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah**

Nabire II (Wadio 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI
JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA



Pemerintah Provinsi Papua Tengah
DINAS TEKNOLOGI, TRANSPORTASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONTRAK PENJAJARAN

CY. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wiyah Nabire II (Wadio 2, Kail Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
: PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KAIL SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu ke : Satu
Terdari : 25 Oktober 2023 - 28 Oktober 2023

KE- 1

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
Pembelian peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari	Kali	4,00	1,89	-	-	1,00	0,47	1,00	0,47	1,00	0,47	-	-
Pembelian peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil	Kali	4,00	2,02	-	-	1,00	0,51	1,00	0,51	1,00	0,51	-	-
PEKERJAAN KONSERVASI ZONA KONSERVASI DAN PROMOSI K3 terdiri atas:													
Pembelian	BH	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-
Pembelian (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,48	-	-	0,75	0,09	0,75	0,09	0,67	0,08	0,08	0,01
Pembelian (Goggles, Spectacles)	Rh	4,00	0,18	-	-	0,75	0,07	0,75	0,07	0,67	0,07	0,01	0,00
Pembelian (Safety Gloves)	Pg	6,00	0,05	-	-	0,75	0,01	0,75	0,01	0,67	0,01	0,08	0,00
Pembelian (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pg	6,00	1,91	-	-	0,75	0,24	0,75	0,24	0,67	0,21	0,08	0,03
Pembelian (Safety Vest)	BH	6,00	0,44	-	-	0,75	0,06	0,75	0,06	0,67	0,05	0,06	0,01
PEKERJAAN PENGFORAN SUMUR EKSPLORASI													
Pembelian Lokal Pengaliran	Ls	4,00	0,61	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
Pembelian rangka besi diameter 4"	M	175,00	31,72	-	-	43,75	7,93	43,75	7,93	43,75	7,93	-	-
Pembelian/ perapian dinding lubang bor	M	175,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
Pengambilan sampel dan Analisa Sample	Tik	4,00	1,82	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
Analisa hasil Cores	Tik	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisa Hidrologi	Tik	4,00	3,04	-	-	-	-	-	-	1,00	1,52	1,00	1,52
Analisa Akhri	Ls	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Pua	BH	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
Pengisian dinding lubang bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TFS													
W Penempatan bantalan dan W debit tetap	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W Penempatan	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENYEDIAAN													
Pembelian Box Sumur	Ls	4,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
Pompa Air Baku	Unit	4,00	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	159,00	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERSIAPAN :													
Pembelian Lokal Tower	M2	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galian Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buangan Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER													
Besi	Kg	148,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pembesian Beton	M2	13,44	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembesian Bekisting Beton	M3	3,52	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Beton Beton K-175	M3	3,52	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondasi TIK	Kg	71,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pembesian Pondasi TIK	M2	17,28	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembesian Bekisting Pondasi TIK	M3	4,44	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,44	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BANGKA DAN TANGGA TOWER													
Besi 100.80.6 Tenda Utama	Kg	1,558,88	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Besi 100.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Besi 100.40.4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angkur besi M16	Bh	64,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angkur besi M16	bh	4,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Perbaikan dan Pemasangan	Unit	4,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN BANGKA TOWER													
Pelaksanaan Cat Bangka Tower	M2	28,00	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN LANTAI DINDING TANDON													
Pelaksanaan Papan Lantai Kayu 100.10.10	M2	23,04	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENIPUAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	bh	4,00	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
PEKERJAAN PENYIAPAN													
Pembelian Lokal Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN TANAH													
Galian Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buangan Tanah	M3	1,44	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN BETON													
Pelaksanaan Pas bekisting	M2	15,48	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemasangan Car Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
Pipa PVC 3/4"	Bh	4,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	Bh	4,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipa PVC 3/4"	M	44,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN AKHIR													
Pelaksanaan Akhir	Tik	4,00	1,22	-	-	-	9,97	-	9,97	-	11,45	-	11,47
Jumlah			100,00										

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

SHAWAN BEKASIA, S.T., M.E.
NIP. 19791117 201004 1 002

Padang, 28 Oktober 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CY. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSKRIPSI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

LAPORAN MINGGUAN

Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pembuatan : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wadio 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
Lokasi : PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	Dua															KE - 2
		Periode : 30 Oktober 2023 - 04 November 2023															
		30 Oktober 2023 - 04 November 2023															
		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		1/2 MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI					
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
PEKERJAAN PENDAHULUAN																	
1	Mobilisasi peralatan bor 1 (katu) unit dan alat bantu serta team personal dari workshop ke job site.	Kat	4,00	1,89	1,00	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Demobilisasi peralatan bor 1 (katu) unit dan alat bantu serta team personal dari workshop ke job site.	Kat	4,00	1,89	-	-	1,00	0,47	1,00	0,47	-	-	-	-			
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat katok ukur beserta alat perlengkapannya	Kat	4,00	2,02	1,00	0,51	-	-	1,00	0,51	1,00	0,47	-	-			
SMK3 Keselamatan Sosial dan Promosi K3 terdapat atas:																	
1	Spanduk	BH	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Tapi pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,68	0,75	0,09	0,5	0,09	1,50	0,05	-	-	-	-			
3	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,18	0,75	0,02	0,75	0,02	1,50	0,05	0,67	0,02	0,67	0,02			
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,05	0,75	0,01	0,75	0,01	1,50	0,01	0,67	0,01	0,67	0,01			
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,91	0,75	0,24	0,75	0,24	1,50	0,48	0,67	0,21	0,67	0,21			
6	Komp Keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	0,75	0,06	0,75	0,06	1,50	0,11	0,67	0,05	0,67	0,05			
PEKERJAAN PENGORAN SUMUR EKSPLOKASI																	
1	Pembongkaran Lokal Pengaliran	Li	4,00	0,61	1,00	0,13	-	-	1,00	0,15	-	-	-	-			
2	Pengaliran segala format diameter 6"	M	175,00	31,72	43,75	7,93	-	-	43,75	7,93	-	-	-	-			
3	Pemadatan / perapasan dinding lubang bor	M	175,00	2,45	-	-	43,75	0,61	43,75	0,61	43,75	0,61	-	-			
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH																	
1	Pengambilan Sampel dan Analisis Sampel	TRK	4,00	1,82	1,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Analisa hasil Coring	TRK	4,00	6,08	-	-	-	-	1,00	0,46	-	-	-	-			
3	Analisa Hidrologi	TRK	4,00	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR																	
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	-	-	43,75	1,39	43,75	1,39	43,75	1,39	-	-			
2	Boltan Plus	BH	4,00	0,06	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-			
PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR																	
1	Pengaliran dinding Lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	-	-	0,84	0,13	0,84	0,13	0,84	0,13	-	-			
PEKERJAAN PUMPING TES																	
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN PENYELISAH																	
1	Pembuatan Box Sumur	Li	4,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE																	
POMPA AIR BAKU																	
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	159,00	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR																	
PEKERJAAN PERHAPAN :																	
1	Pembongkaran Lokal Tower	M2	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Bongkaran Tanah	M3	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER																	
a. Stok																	
1	Pekerjaan Pembesian Stok	Kg	168,80	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pembuatan bekisting Stok	M2	13,44	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Pemecoran beton Stok K-175	M3	3,52	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b. Pondasi TIK																	
1	Pekerjaan Pembesian Pondasi TIK	Kg	71,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pembuatan bekisting Pondasi TIK	M2	17,28	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Pemecoran beton Pondasi TIK K-175	M3	4,64	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER																	
1	Besi Baja 80.80.8 Terna Utama	Kg	1,958,88	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Besi Baja 40.40.4 (Pagar)	Kg	352,80	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Plat marbale tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Analox Raut M16	Bh	64,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Pemecoran Tangga Tower Tandon	bh	4,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Jasa Perakitan dan Pengecatan	Unit	4,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER																	
1	Pemecoran Besi Baja Rangka Tower	M2	28,00	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON																	
1	Pemecoran Papan Lantai Kayu Besi T= 2 cm	M2	23,04	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON																	
1	Pemecoran Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pemecoran Profile Tank 2200 L	bh	4,00	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAK UMUM																	
PEKERJAAN PERHAPAN :																	
1	Pembongkaran Lokal Kran umum	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN TANAH																	
1	Galian tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Bongkaran Kembali	M3	1,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN BETON																	
1	Pemecoran Pas bekisting	M2	15,68	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pemecoran Cor Block Beton Kran Air	M3	1,88	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAK UMUM																	
1	Pipa Raut 3/4"	Bh	4,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Kran Air PVC Ø 3/4"	Bh	4,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Pipa Raut PVC Ø 3/4"	M	64,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PEKERJAAN AKHIR																	
1	Pemecoran Akhir	TRK	4,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah																	
				100,00		9,97		3,73		13,67		2,99		0,05			

PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN

SUHANWAN BHANDARI, S.T., M.M.
NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 04 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Inspector



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wado 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
PAKET 6 NABIRE II (WADO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
2023

LAPORAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI		MINGGU INI	
------------------	--	---------	--	-------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SHAWAN BEANDAR, S. N. M.
NP. 19791117 201004 1 002

NOV 11 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA, KONSULTAN

Budi H. Purnawidya
Supervisor



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksploitasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wado 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
PAKET 8 NABIRE II (WADO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu : I : Empat

Periode : 13 November 2023 - 18 November 2023

KE- 4

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI			
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PERIODE : 13 November 2023 - 18 November 2023															
KE- 4															
URAIAN PEKERJAAN															
2															
PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1. Instalasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.															
2. Demobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.															
3. Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya															
3M3 Kanalisasi Sosial sal dan Promosi K3 terditi alat:															
1. Spanduk															
2. Tas pelindung (Safety Helmet)															
3. Pelindung mata (Goggles, Spectacles)															
4. Sarung tangan (Safety Gloves)															
5. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)															
6. Tasel keselamatan (Safety Vest)															
PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI															
1. Pembelian lokal Pengeboran															
2. Pengeboran segitiga format diameter 6"															
3. Pemasangan/perapian dinding lubang bor															
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH															
1. Pengambilan Sample dan Analisis Sample															
2. Analisis hasil Coating															
3. Analisis Hidrologi															
4. Laporan Akhir															
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR															
1. Pipa PVC AW diameter 4"															
2. Klem Plus															
PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR															
1. Pengisian dinding lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu															
PEKERJAAN PUMPING TEST															
1. Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap															
2. Uji Pemulihan															
PEKERJAAN PENYULUHAN															
1. Pembuatan Box Sumur															
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE															
POMPA AIR BAKU															
1. Pompa Submersible Phase															
2. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa															
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR															
PEKERJAAN PERSIAPAN :															
1. Pembelian lokal Tower															
2. Galian Tanah															
3. Bagan Tanah															
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER															
1. Batok															
2. Pekerjaan Pembesian Batok															
3. Pembesian bekisting Batok															
4. Pemasangan Beton Batok K-176															
5. Pondasi TIK															
6. Pekerjaan Pembesian Pondasi TIK															
7. Pembesian bekisting Pondasi TIK															
8. Pemasangan Beton Pondasi TIK K-176															
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER															
1. Besi Baja 60.80.8 Tanga Utama															
2. Besi Baja 40.40.4 (Pagar)															
3. Plat manhole tebal 1 cm															
4. Angkur Besi M16															
5. Pemasangan Tangga Tower Tandon															
6. Jang Pemasangan dan Pengepasan															
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER															
1. Pengecatan Besi Baja Rangka Tower															
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON															
1. Pemasangan Papan Lantai Kayu Besi 1" x 2 cm															
PEKERJAAN PERPIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON															
1. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"															
2. Pemasangan Profile Tank 2210 L															
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAM SUMUR															
PEKERJAAN PERSIAPAN															
1. Pembelian lokal Kram umum															
PEKERJAAN TANAH															
1. Galian tanah															
2. Bagan Krambol															
PEKERJAAN BETON															
1. Pekerjaan Pse bekisting															
2. Pekerjaan Cor Block Beton Kram Ak															
PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAM SUMUR															
1. Pipa Besi 3/4"															
2. Pipa PVC 3/4"															
3. Pipa PVC 1/2"															
PEKERJAAN AIRBOR															
1. Pekerjaan akhir															
TOTAL															



Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Manusia

CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengukuran Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wadio 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

: 2023		Minggu ke		Periode		: 20 November 2023 - 25 November 2023		KE- 8					
URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU INI		BENCANA		DEVIASI	
SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi peralatan bor 1 (atau) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site	Kal	4,00	1,89	2,00	0,95	1,00	0,47	3,10	1,42	1,00	0,47	
2	Mobilisasi peralatan bor 1 (atau) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site	Kal	4,00	1,89	2,00	0,95	-	-	2,00	0,95	-	-	
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kal	4,00	2,02	2,00	1,01	1,00	0,51	3,00	1,52	1,00	0,51	
IMKJ Kesehatan Sosial dan Promosi K3 terdiri atas:													
1	Sarung	BH	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	-	-	
2	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,68	3,00	0,34	0,75	0,19	3,75	0,43	0,67	0,06	
3	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,18	3,00	0,09	0,75	0,02	3,75	0,11	0,67	0,02	
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,05	3,00	0,02	0,75	0,01	3,75	0,03	0,67	0,01	
5	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,91	3,00	0,96	0,75	0,24	3,75	1,20	0,67	0,21	
6	Rompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	3,00	0,23	0,75	0,06	3,75	0,28	0,67	0,05	
PEKERJAAN PENGECATAN SUMUR EKSPLOKASI													
1	Pembanahan Lokal Pengecatan	Li	4,00	0,61	2,00	0,30	1,00	0,15	3,00	0,46	1,00	0,15	
2	Pengecatan segala format diameter 4"	M	175,00	31,72	87,50	15,86	40,75	7,93	131,25	23,79	43,75	7,53	
3	Pemadatan/ perapakan dinding lubang bor	M	175,00	2,45	87,50	1,22	-	-	87,50	1,22	-	-	
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1	Pengambilan Sample dan Analisa Sample	TK	4,00	1,82	2,00	0,91	1,00	0,44	3,00	1,37	1,00	0,46	
2	Analisa hasil Cores	TK	4,00	6,08	-	-	1,00	1,52	1,00	1,52	1,00	1,52	
3	Analisa Hidrologi	TK	4,00	3,04	-	-	1,00	0,76	1,00	0,76	-	-	
4	Laporan Akhir	Li	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	87,50	2,78	-	-	87,50	2,78	-	-	
2	Isolasi Pipa	BH	4,00	0,06	2,00	0,03	-	-	2,00	0,03	-	-	
PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pengisian dinding lubang bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	1,72	0,27	-	-	1,72	0,27	-	-	
PEKERJAAN PUMPING TES													
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	6,00	0,45	6,00	0,45	12,00	0,90	6,00	0,45	
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	6,00	0,45	6,00	0,45	12,00	0,90	6,00	0,45	
PEKERJAAN PENYERAPAN													
1	Pemasangan Box Sumur	Li	4,00	0,61	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSTIBLE													
1	Pompa Submerstible Phase	Unit	4,00	7,43	1,00	1,64	1,00	1,86	2,00	3,71	1,00	1,86	
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	159,00	0,62	39,75	0,15	39,75	0,15	79,50	0,31	39,75	0,15	
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
1	Pemasangan Pemasangan	M2	100,00	0,33	25,00	0,08	25,00	0,08	50,00	0,17	25,00	0,08	
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,01	0,06	0,00	
3	Urusan Tanah	M3	0,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	
PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER													
1	Scaff	Kg	168,80	0,56	42,20	0,14	42,20	0,14	84,40	0,28	42,20	0,14	
2	Pemasangan Pemasangan Scaff	M2	13,44	0,59	3,36	0,15	3,36	0,15	6,72	0,30	3,36	0,15	
3	Pemasangan Beldinding Scaff	M3	3,52	1,36	0,88	0,34	0,88	0,34	1,76	0,68	0,88	0,34	
4	Pemasangan Beton Scaff K-175	M3	4,64	1,85	1,16	0,46	1,16	0,46	2,32	0,93	1,16	0,46	
5	Pemasangan TIK	Kg	71,00	0,24	17,75	0,06	17,75	0,06	35,50	0,12	17,75	0,06	
6	Pemasangan Pemasangan Pondasi TIK	M2	17,28	0,76	4,32	0,19	4,32	0,19	8,64	0,38	4,32	0,19	
7	Pemasangan Beldinding Pondasi TIK	M3	4,64	1,85	1,16	0,46	1,16	0,46	2,32	0,93	1,16	0,46	
8	Pemasangan Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,64	1,85	1,16	0,46	1,16	0,46	2,32	0,93	1,16	0,46	
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
1	Besi Siku 80x80x6 Tangga Utama	Kg	1,958,88	3,82	489,72	0,95	489,72	0,95	979,44	1,91	489,72	0,95	
2	Besi Siku 40x40x4 (Pagar)	Kg	352,80	1,05	88,20	0,26	88,20	0,26	176,40	0,53	88,20	0,26	
3	Besi Siku 40x40x4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	0,23	0,04	0,23	0,04	0,46	0,08	0,23	0,04	
4	Plat marsole tebal 1 cm	Bh	64,00	0,49	16,00	0,12	16,00	0,12	32,00	0,24	16,00	0,12	
5	Angkur Baja M16	Bh	4,00	1,52	1,00	0,38	1,00	0,38	2,00	0,76	1,00	0,38	
6	Pemasangan Tangga Tower Tandon	Unit	4,00	4,56	1,00	1,14	1,00	1,14	2,00	2,28	1,00	1,14	
7	Urusan Pemasangan dan Pengecatan	Unit	4,00	4,56	1,00	1,14	1,00	1,14	2,00	2,28	1,00	1,14	
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
1	Pengecatan Besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,59	7,00	0,15	7,00	0,15	14,00	0,29	7,00	0,15	
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
1	Pemasangan Papan Lantai Kayu Besi Te 2 cm	M2	23,04	1,26	5,76	0,32	5,76	0,32	11,52	0,63	5,76	0,32	
PEKERJAAN PERAPIAN DAN SUMUR MASUK TANDON													
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	8,00	0,06	8,00	0,06	16,00	0,12	8,00	0,06	
2	Pemasangan Profil Tank 2200 L	Bh	4,00	2,43	1,00	0,61	1,00	0,61	2,00	1,27	1,00	0,61	
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM													
1	Pemasangan Kran umum	M	10,00	0,03	2,50	0,01	2,50	0,01	5,00	0,02	2,50	0,01	
PEKERJAAN TANAH													
1	Galian Tanah	M3	1,84	0,10	0,46	0,01	0,46	0,02	0,92	0,05	0,46	0,02	
2	Urusan Tanah	M3	1,44	0,03	0,36	0,01	0,36	0,01	0,72	0,01	0,36	0,01	
PEKERJAAN BETON													
1	Pemasangan Pagar Isolasi	M2	15,68	0,69	3,92	0,17	3,92	0,17	7,84	0,35	3,92	0,17	
2	Pemasangan Cor Block beton Kran Air	M3	1,86	0,68	0,47	0,17	0,47	0,17	0,94	0,34	0,47	0,17	
PENGADAAN PIPA DARI TANDON KE KRAN UMUM													
1	Besi Siku 3/4"	Bh	4,00	0,09	1,00	0,02	1,00	0,02	2,00	0,04	1,00	0,02	
2	Besi Siku 3/4"	Bh	4,00	0,05	1,00	0,01	1,00	0,01	2,00	0,02	1,00	0,01	
3	Besi Siku 3/4"	M	64,00	0,49	16,00	0,12	16,00	0,12	32,00	0,25	16,00	0,12	
PEKERJAAN AKHIR													
1	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
2	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
3	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
4	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
5	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
6	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
7	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
8	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
9	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
10	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
11	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
12	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
13	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
14	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
15	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
16	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
17	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
18	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
19	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
20	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
21	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
22	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
23	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
24	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
25	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
26	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
27	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
28	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,00	0,30	
29	Pemasangan Akh	TK	4,00	1,22	1,00	0,30	1,00	0,30	2,00	0,61	1,0		



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSKRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONSULTAN PENGAWAS:

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zonasi Basikal Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wadjo 2, Kall Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
: PAKET 8 NABIRE II (WADJO 2, KALL SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN MINIGUAN

Minggu ke : Enam
Periode : 27 November 2023 - 02 Desember 2023
KE- 6

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. PERSIAPAN PONDASIAN													
1.1. Pekerjaan pondasi bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	3,00	1,42	-	-	3,10	1,42	-	-	-	-
1.2. Demolisi pondasi bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	2,00	0,95	1,00	0,47	3,00	1,42	1,00	0,47	-	-
1.3. Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kolak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	2,02	3,00	1,52	-	-	3,00	1,52	-	-	-	-
2. SAMPAH KANDUK SAKLAWATI DAN PROMOSI K3 TERDARI ADAS:													
2.1. Sarung	BH	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	-	-	-	-
2.2. Helm pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,68	3,75	0,43	0,75	0,09	4,50	0,51	0,67	0,08	0,08	0,01
2.3. Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,16	3,75	0,11	0,75	0,02	4,50	0,14	0,67	0,02	0,08	0,00
2.4. Sarung tangan (Safety Gloves)	PSG	6,00	0,05	3,75	0,03	0,75	0,01	4,50	0,03	0,67	0,01	0,08	0,00
2.5. Sarung keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	PSG	6,00	1,91	3,75	1,20	0,75	0,24	4,50	1,44	0,67	0,21	0,18	0,03
2.6. Sarung keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	3,75	0,28	0,75	0,06	4,50	0,34	0,67	0,05	0,18	0,01
3. PERSIAPAN PENGESORAN SUMUR EKSPLOKASI													
3.1. Pemasangan Loket Pengesoran	LS	4,00	0,61	3,00	0,41	-	-	3,00	0,46	-	-	-	-
3.2. Pengesoran segitiga format diameter 4"	M	175,00	31,72	131,25	23,79	-	-	131,25	23,79	-	-	-	-
3.3. Pemasangan/ perancah dinding lubang bor	M	175,00	2,45	87,50	1,2	43,75	0,61	131,25	1,84	43,75	0,61	-	-
4. PENGAMATAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
4.1. Pengambilan sample di m Analisa Sample	TK	4,00	1,82	3,00	1,37	-	-	3,00	1,37	-	-	-	-
4.2. Analisa hasil Coring	TK	4,00	6,08	1,00	1,56	1,00	1,52	2,00	3,04	-	-	1,00	1,52
4.3. Analisa hidrologi	TK	4,00	3,04	1,00	0,76	1,00	0,76	2,00	1,52	1,00	0,76	-	-
4.4. Laporan Akhir	LS	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
5.1. Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	87,50	2,73	43,75	1,39	131,25	4,16	43,75	1,39	-	-
5.2. Jalon Paga	BH	4,00	0,06	2,00	0,01	1,00	0,02	3,00	0,05	1,00	0,02	-	-
6. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
6.1. Pengisian dinding lubang Bor (Material Pilihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	1,72	0,27	0,86	0,13	2,57	0,40	0,86	0,13	-	-
7. PERSIAPAN PUMPING TEST													
7.1. Uji pemompaan bertahap dan uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	-	-	12,00	0,90	-	-	-	-
7.2. Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	-	-	12,00	0,90	-	-	-	-
8. PERSIAPAN PENYELESAIAN													
8.1. Pemasangan Box Sumur	LS	4,00	0,61	1,00	0,15	1,00	0,15	2,00	0,30	1,00	0,15	-	-
9. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
9.1. Pompa Air Batu	Unit	4,00	7,43	2,00	3,71	-	-	2,00	3,71	-	-	-	-
9.2. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	159,00	0,62	79,50	0,31	-	-	79,50	0,31	-	-	-	-
10. PERSIAPAN TOWER TANDON AIR													
10.1. Pekerjaan PERSIAPAN:													
10.1.1. Pemasangan Loket Tower	M2	100,00	0,33	50,00	0,17	25,00	0,08	75,00	0,25	-	-	25,00	0,08
10.1.2. Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,11	0,01	0,06	0,00	0,17	0,01	-	-	0,04	0,00
10.1.3. Galian Tanah	M3	0,06	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	-	-	0,02	0,00
10.2. Pekerjaan BTON PONDASI TOWER													
10.2.1. Steel	Kg	168,80	0,56	84,40	0,20	42,20	0,14	126,60	0,42	-	-	42,20	0,14
10.2.2. Pekerjaan Pemasangan Steel	M2	13,44	0,59	6,72	0,20	3,36	0,15	10,08	0,45	-	-	3,36	0,15
10.2.3. Pemasangan beton Steel Tower	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.4. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.5. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.6. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.7. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.8. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.9. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.10. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.11. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.12. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.13. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.14. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.15. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.16. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.17. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.18. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.19. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.20. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.21. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.22. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.23. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.24. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.25. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.26. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.27. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.28. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.29. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.30. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.31. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.32. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.33. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.34. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.35. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.36. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.37. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.38. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.39. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.40. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.41. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.42. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.43. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.44. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.45. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	0,34
10.2.46. Pemasangan beton Steel K-175	M3	3,52	1,36	1,76	0,68	0,86	0,34	2,64	1,02	-	-	0,86	

• Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
• Pengawasan Pembuat Jumur Bapalokal dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Bapalokal Cekungan Air Tanah di
Wilayah Nabire II (Wadio 2, Kali Semeh, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
• PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEH, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)

LAPORAN MINGGUAN

Regio
Provinsi
Kabupaten
Tahun Anggaran

Minggu ke : Tujuh
Periode : 04 Desember 2021 - 09 Desember 2021

KE. 7

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		104 Desember 2021 - 09 Desember 2023				KE- 7	
SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	DEVIASI
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Modifikasi peralatan bar 1 (sat) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	3,00	1,42	1,00	0,47	4,00	1,89	1,00	0,47	-
2	Demobilisasi peralatan bar 1 (sat) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	3,00	1,42	-	-	3,00	1,42	-	-	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembungkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	2,02	3,00	1,52	1,00	0,51	4,00	2,02	1,00	0,51	-
SMK3 Keselamatan dan Promosi K3 terd. alat:													
1	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	-	-	-
2	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,18	4,50	0,14	0,75	0,02	5,25	0,16	0,67	0,08	0,01
3	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,05	4,50	0,03	0,75	0,01	5,25	0,04	0,67	0,01	0,08
4	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,91	4,50	1,44	0,75	0,24	5,25	1,68	0,67	0,21	0,08
5	Sarung keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	4,50	0,34	0,75	0,06	5,25	0,40	0,67	0,35	0,08
PEKERJAAN PENGEBOKAN SUMUR EKSPLOKASI													
1	Pembesian Lokal Pengaliran	Ls	4,00	0,61	3,00	0,46	1,00	0,15	4,00	0,61	1,00	0,15	-
2	Pengaliran segala format diameter 6"	M	175,00	31,72	131,25	23,79	43,75	7,93	175,00	31,72	43,75	7,93	-
3	Pemadatan/ perapian dinding lubang bor	M	175,00	2,45	131,25	1,84	-	-	131,25	1,84	-	-	-
PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1	Pengambilan Sample dan Analisis Sample	Tik	4,00	1,82	3,00	1,37	1,00	0,46	4,00	1,82	1,00	0,46	-
2	Analisa hasil Cores	Tik	4,00	6,08	2,00	3,04	1,00	1,52	3,00	4,56	1,00	1,52	-
3	Analisa Hidrologi	Tik	4,00	3,04	2,00	1,52	1,00	0,76	3,00	2,28	-	-	1,00
4	Laporan Akhir	Ls	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76
PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	131,25	4,16	-	-	131,25	4,16	-	-	-
2	Bottom Plug	BH	4,00	0,06	3,00	0,15	-	-	3,00	0,05	-	-	-
PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pengaliran dinding Lubang Bor (Material Priban) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	2,57	0,40	-	-	2,57	0,40	-	-	-
PEKERJAAN PUMPING TES													
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	6,00	0,45	18,00	1,35	6,00	0,45	-
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	6,00	0,45	18,00	1,35	6,00	0,45	-
PEKERJAAN PENYEBERAN													
1	Pembuatan Box Sumur	Ls	4,00	0,61	2,00	0,30	1,00	0,15	3,00	0,46	1,00	0,15	-
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
POMPA AIR BAKU													
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,43	2,00	3,71	1,00	1,86	3,00	5,57	1,00	1,86	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	159,00	0,62	79,50	0,31	39,75	0,15	119,25	0,46	39,75	0,15	-
PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERBAPAN :													
1	Pembesian Lokal Tower	M2	100,00	0,33	75,00	0,25	25,00	0,08	100,00	0,33	25,00	0,08	-
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,06	0,00	-
3	Isiran Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	-
PEKERJAAN BETON FONDASI TOWER													
a. Sloof													
1	Tekukan Pembesian Sloof	Kg	148,80	0,56	126,60	0,42	42,20	0,14	168,80	0,56	42,20	0,14	-
2	Pembuatan Bekisting Sloof	M2	13,44	0,59	10,08	0,45	3,36	0,15	13,44	0,55	3,36	0,15	-
3	Pengacran Beton Sloof K-175	M3	3,52	1,36	2,64	1,02	0,88	0,34	3,52	1,36	0,88	0,34	-
b. Pondasi TIK													
1	Tekukan Pembesian Pondasi TIK	Kg	71,00	0,24	53,25	0,18	17,75	0,16	71,00	0,24	17,75	0,16	-
2	Pembuatan Bekisting Pondasi TIK	M2	17,28	0,75	12,96	0,57	4,32	0,19	17,28	0,74	4,32	0,19	-
3	Pengacran Beton Pondasi TIK K-175	M3	4,44	1,85	3,48	1,39	1,4	0,46	4,44	1,85	1,4	0,46	-
PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
1	Besi Beton 80,80,6 Banga Utama	Kg	1,958,88	3,82	1,469,16	2,86	489,72	0,95	1,958,88	3,82	489,72	0,95	-
2	Besi Beton 40,40,4 (Tegap)	Kg	352,80	1,05	264,40	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	88,20	0,26	-
3	Plat marhale tebal 1 cm	M2	0,92	0,16	0,69	0,12	0,23	0,04	0,92	0,16	0,23	0,04	-
4	Angkur Besi M16	Bh	64,00	0,49	48,00	0,36	16,00	0,12	64,00	0,49	16,00	0,12	-
5	Pengadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,52	3,00	1,14	1,00	0,38	4,00	1,52	1,00	0,38	-
6	Jasa Peralatan dan Pengekasan	Unit	4,00	4,54	3,00	3,42	1,00	1,14	4,00	4,54	1,00	1,14	-
PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
1	Pengacatan besi Beton Rangka Tower	M2	28,00	0,59	21,00	0,44	7,00	0,15	28,00	0,59	7,00	0,15	-
PEKERJAAN LANTAI DUDUKAN TANDON													
1	Pengadaan Papan Lantai Kayu Besi Te 2 cm	M2	23,04	1,26	17,28	0,95	5,76	0,32	23,04	1,26	5,76	0,32	-
PEKERJAAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	24,00	0,18	8,00	0,06	32,00	0,25	8,00	0,06	-
2	Pengadaan Profile Tank 2300 L	Bh	4,00	2,43	3,00	1,82	1,00	0,61	4,00	2,43	1,00	0,61	-
PEKERJAAN PEMASANGAN KRAK UMUM													
1	Pembesian Lokal Kran umum	M	10,00	0,03	7,50	0,02	2,50	0,01	10,00	0,03	2,50	0,01	-
PEKERJAAN TANAH													
1	Isiran tanah	M3	1,84	0,10	1,38	0,07	0,46	0,02	1,84	0,10	0,46	0,02	-
2	Isiran Sembil	M3	1,44	0,03	1,08	0,02	0,36	0,01	1,44	0,03	0,36	0,01	-
PEKERJAAN BETON													
1	Pembesian Pori bekisting	M2	15,68	0,69	11,76	0,52	3,92	0,17	15,68	0,69	3,92	0,17	-
2	Pembesian Cor Meak Beton Kran Air	M3	1,88	0,68	1,41	0,51	0,47	0,17	1,88	0,68	0,47	0,17	-
PEKERJAAN PPA DARI TANDON KE KRAK UMUM													
1	Besi Beton 3/4	Bh	4,00	0,09	3,00	0,07	1,00	0,02	4,00	0,09	1,00	0,02	-
2	Isiran Air PVC 3/4"	Bh	4,00	0,05	3,00	0,03	1,00	0,01	4,00	0,05	1,00	0,01	-
3	Pipa Beton PVC 3/4"	M	64,00	0,49	48,00	0,37	16,00	0,12	64,00	0,49	16,00	0,12	-
PEKERJAAN ASHES													
1	Pembesian Ashes	Tik	4,00	1,22	2,00	0,61	1,00	0,30	3,00	0,91	1,00	0,30	-
Jumlah													
			100,00			88,22		21,58			120,77		0,81

PEJABAT PELAKSANA JAWAB KEGIATAN

SUDHAN EKANDAR ET. AL
NIP. 19791117 201004 1 002

NOTES 09, Disertasi 2023
KONSULTAN PENGAWAS

1992-1993



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONSULTAN PERENCANAAN

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN


Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Perairan
Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wadio 2, KAU SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KAU SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu ke : Delapan
Periode : 11 Desember 2023 - 12 Desember 2023
KE- 8

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		RENCANA		DEVIASI	
SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Modifikasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personal dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	4,00	1,89	-	-	4,00	1,89	-	-	-
2	Demobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personal dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89	3,00	1,42	1,00	0,47	4,00	1,89	1,00	0,47	-
3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya	Kali	4,00	2,02	4,00	2,02	-	-	4,00	2,02	-	-	-
B. KAJI KUALITAS SOSIAL DAN PROMOSI K3 TERDARI ALAS:													
1	Senduk	BH	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	-	-	-
2	Tutup pelindung (Safety Helmet)	Bh	6,00	0,68	5,25	0,60	0,75	0,09	6,00	0,68	0,67	0,08	0,01
3	Pelindung muka (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,18	5,25	0,16	0,75	0,02	6,00	0,18	0,67	0,02	0,08
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pkg	6,00	0,05	5,25	0,04	0,75	0,01	6,00	0,05	0,67	0,01	0,08
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pkg	6,00	1,91	5,25	1,68	0,75	0,24	6,00	1,91	0,67	0,21	0,08
6	Kompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	5,25	0,40	0,75	0,06	6,00	0,46	0,67	0,05	0,08
C. PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLOKASI													
1	Pembuatan Lokal Pengeboran	Ls	4,00	0,61	4,00	0,61	-	-	4,00	0,61	-	-	-
2	Pengeboran segala formasi dari diameter 6"	M	175,00	31,72	175,00	31,72	-	-	175,00	31,72	-	-	-
3	Pemadatan / pengisian sludg lubang bor	M	175,00	2,45	131,25	1,84	43,75	0,61	175,00	2,45	43,75	0,61	-
D. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
1	Pengambilan Sample dan Analisis Sample	TK	4,00	1,82	4,00	1,82	-	-	4,00	1,82	-	-	-
2	Analisa hasil Coring	TK	4,00	6,08	3,00	4,54	1,00	1,52	4,00	6,08	-	-	1,00
3	Analisa Hidrologi	TK	4,00	3,04	3,00	2,28	1,00	0,76	4,00	3,04	1,00	0,76	-
4	Laporan Akhir	Ls	1,00	1,52	-	-	1,00	1,52	1,00	1,52	-	-	1,00
E. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	131,25	4,16	43,75	1,39	175,00	5,55	43,75	1,39	-
2	Saluran Plus	BH	4,00	0,06	3,00	0,05	1,00	0,02	4,00	0,06	1,00	0,02	-
F. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
1	Pengisian dinding lubang Bor (Material Pilling) Gravel Part tertentu	M3	3,43	0,54	2,57	0,40	0,86	0,13	3,43	0,54	0,86	0,13	-
G. PEKERJAAN PUMPING TES													
1	Uji Pemompaan bertahap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	18,00	1,35	6,00	0,45	24,00	1,81	6,00	0,45	-
2	Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	18,00	1,35	6,00	0,45	24,00	1,81	6,00	0,45	-
H. PEKERJAAN PENYELESAIAN													
1	Pembuatan Box Sumur	Ls	4,00	0,61	3,00	0,46	1,00	0,15	4,00	0,61	1,00	0,15	-
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
POMPA AIR BAKU													
1	Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,43	3,00	5,57	1,00	1,84	4,00	7,43	1,00	1,84	-
2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	159,00	0,62	119,25	0,46	39,75	0,15	159,00	0,62	39,75	0,15	-
J. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
PEKERJAAN PERBAPAN :													
1	Pembuatan Lokal Tower	M2	100,00	0,33	100,00	0,33	-	-	100,00	0,33	25,00	0,08	(25,00)
2	Galian Tanah	M3	0,22	0,01	(0,22)	0,01	-	-	0,22	0,01	0,06	0,00	(0,06)
3	Isiung Tanah	M3	0,06	0,00	0,06	0,00	-	-	0,06	0,00	0,02	0,00	(0,02)
K. PEKERJAAN PETON PONDASI TOWER													
1	Stoof	Kg	168,80	0,54	168,80	0,54	-	-	168,80	0,54	42,20	0,14	(42,20)
2	Pekerjaan Pemasangan Stoof	M2	13,44	0,59	13,44	0,59	-	-	13,44	0,59	3,34	0,15	(3,34)
3	Pembuatan bekisting Stoof	M3	3,52	1,34	3,52	1,34	-	-	3,52	1,34	0,88	0,34	(0,88)
4	Pengecoran Beton Stoof K-175	M3	3,52	1,34	3,52	1,34	-	-	3,52	1,34	0,88	0,34	(0,88)
L. PONDASI TITIK													
1	Pekerjaan Pemasangan Pondasi TITIK	Kg	71,00	0,24	71,00	0,24	-	-	71,00	0,24	17,75	0,06	(17,75)
2	Pembuatan bekisting Pondasi TITIK	M2	17,28	0,74	17,28	0,74	-	-	17,28	0,74	4,32	0,19	(4,32)
3	Pengecoran Beton Pondasi TITIK K-175	M3	4,64	1,85	4,64	1,85	-	-	4,64	1,85	1,16	0,46	(1,16)
M. PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
1	Besi Siku 60,60,6 Tanga Utama	Kg	1,958,88	3,82	1,958,88	3,82	-	-	1,958,88	3,82	-	-	-
2	Besi Siku 40,40,4 (Pagar)	Kg	352,80	1,05	352,80	1,05	-	-	352,80	1,05	-	-	-
3	Besi Siku 40,40,4 (Pagar)	M2	0,92	0,16	0,92	0,16	-	-	0,92	0,16	-	-	-
4	Plat marbre tebal 1 cm	Bh	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
5	Analox baut M14	Bh	4,00	1,52	4,00	1,52	-	-	4,00	1,52	-	-	-
6	Pengadaan Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	4,56	4,00	4,56	-	-	4,00	4,56	-	-	-
7	Jasa Pemasangan dan Pengelasan	Unit	4,00	4,56	4,00	4,56	-	-	4,00	4,56	-	-	-
N. PEKERJAAN PENGECATAN RANGKA TOWER													
1	Pengecatan besi Siku Rangka Tower	M2	28,00	0,59	28,00	0,59	-	-	28,00	0,59	-	-	-
O. PEKERJAAN LANTAI DIBUKAN TANDON													
1	Pengadaan Pasir Lantai Kayu Besi Te 2 cm	M2	23,04	1,26	23,04	1,26	-	-	23,04	1,26	-	-	-
P. PEKERJAAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
1	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	32,00	0,25	-	-	32,00	0,25	-	-	-
2	Pengadaan Profile Tank 2200 L	Bh	4,00	2,43	4,00	2,43	-	-	4,00	2,43	-	-	-
Q. PEKERJAAN PEMASANGAN KRAM UMUM													
1	Pekerjaan PERBAPAN	M	10,00	0,03	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	-	-	-
2	Pembuatan Lokal Kram umum	M	1,84	0,10	1,84	0,10	-	-	1,84	0,10	-	-	-
R. PEKERJAAN TANAH													
1	Galian tanah	M3	1,44	0,03	1,44	0,03	-	-	1,44	0,03	-	-	-
2	Isiung Kembali	M3	1,44	0,03	1,44	0,03	-	-	1,44	0,03	-	-	-
S. PEKERJAAN BETON													
1	Pekerjaan Pori bekisting	M2	15,48	0,49	15,48	0,49	-	-	15,48	0,49	-	-	-
2	Pekerjaan Cor Beton Kram Kram Air	M3	1,88	0,68	1,88	0,68	-	-	1,88	0,68	-	-	-
T. PEMASANGAN PIPA DARI TANDON KE KRAM UMUM													
1	Pipa Kram 3/4"	Bh	4,00	0,09	4,00	0,09	-	-	4,00	0,09	-	-	-
2	Pipa Kram 3/4"	Bh	4,00	0,05	4,00	0,05	-	-	4,00	0,05	-	-	-
3	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
4	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
5	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
6	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
7	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
8	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
9	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
10	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
11	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
12	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
13	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
14	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
15	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
16	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
17	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
18	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
19	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
20	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
21	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
22	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
23	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
24	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
25	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
26	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
27	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
28	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
29	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
30	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
31	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
32	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
33	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
34	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
35	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
36	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
37	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
38	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
39	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
40	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
41	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
42	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
43	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
44	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
45	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
46	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
47	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
48	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
49	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-
50	Pipa Kram 3/4"	M	64,00	0,49	64,00	0,49	-	-	64,00	0,49	-	-	-

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SUDAWAN BEKANDAR, ST. M.N.

NIP. 19791117 201004 1 002

Nabire, 12 Desember 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
KE- 8





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Karambura Lawah - PTP Sarapura - Kabupaten Paniai

FORUM PENGEWAJ

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah
Ninkila II Wacile 2, Kiri Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2
PAKET 8 NABIRE II (WADJO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)

LAPORAN BULANAN

2023

Bulan ke : Satu

Periode : 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023

KE- 1

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI	
		SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A. PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	1. Mobilisasi / pendirian bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari wilayah ke job site.	Kali	4,00	1,89	-	-	1,00	0,47	1,00	0,47	1,00	0,47	-	-
2	2. Demobilisasi peralatan bar 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personel dari wilayah ke job site.	Kali	4,00	1,89	-	-	1,00	0,47	1,00	0,47	1,00	0,47	-	-
3	3. Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk alat workshop ke job site.	Kali	4,00	2,02	-	-	1,00	0,51	1,00	0,51	1,00	0,51	-	-
4	4. Pemasangan dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat perlengkapannya													
5	5. Pengangkutan Logistik dan Promosi K3 terdiri atas:													
6	6. Pasokan	BH	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-
7	7. Helm	Bh	6,00	0,68	-	-	1,50	0,17	1,50	0,17	1,33	0,15	0,17	0,02
8	8. Kacamata (Goggles, Spectacles)	Bh	6,00	0,18	-	-	1,50	0,05	1,50	0,05	1,33	0,04	0,17	0,01
9	9. Sarung tangan (Safety gloves)	Psg	6,00	0,05	-	-	1,50	0,01	1,50	0,01	1,33	0,01	0,17	0,00
10	10. Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and low cap)	Psg	6,00	1,91	-	-	1,50	0,48	1,50	0,48	1,33	0,43	0,17	0,05
11	11. Rompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	-	-	1,50	0,11	1,50	0,11	1,33	0,10	0,17	0,01
12	B. PEKERJAAN PENGHOBAN SUMUR EKSPLOKASI													
13	1. Pemasangan Lokal Pengaliran	LS	4,00	0,61	-	-	1,00	0,15	1,00	0,15	1,00	0,15	-	-
14	2. Pemasangan rangka Formasi diameter 4"	M	175,00	31,72	-	-	43,75	7,93	43,75	7,93	43,75	7,93	-	-
15	3. Pemasangan / perapian di dalam lubang bor	M	175,00	2,45	-	-	43,75	0,61	43,75	0,61	43,75	0,51	-	-
16	C. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
17	1. Pengambilan sampel dan Analisa Sample	TK	4,00	1,82	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-
18	2. Analisa hasil Coring	TK	4,00	3,04	-	-	-	-	-	-	1,00	1,52	(1,00)	(1,52)
19	3. Analisa Hidrologi	LS	1,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4. Laporan Akhir													
21	D. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
22	1. Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	-	-	43,75	1,39	43,75	1,39	43,75	1,39	-	-
23	2. Beton Plast	BH	4,00	0,04	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,02	-	-
24	E. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
25	1. Pengisian dinding lubang bor (Material Pijihan) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	-	-	0,86	0,13	0,86	0,13	0,86	0,13	-	-
26	F. PEKERJAAN PEMBERING TES													
27	1. Uji pemompaan beraturan dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	2. Uji Pemulihan	Jam	24,00	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	G. PEKERJAAN PENYERAPAN													
30	1. Pemasangan Box Sumur	LS	4,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	H. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
32	1. Pompa Air Baku	Unit	4,00	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	2. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M'	159,00	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	I. PEKERJAAN TOWER TANDON AIR													
35	1. Pemasangan Rangka Tower	M2	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2. Galvanisasi Rangka Tower	M3	0,22	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3. Galvanisasi Rangka Tower	M3	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	J. PEKERJAAN BETON PONDASI TOWER													
39	1. Beton	Kg	168,80	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	2. Pemasangan Pemasangan Scaffolding	M2	13,44	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	3. Pemasangan Scaffolding Scaffolding	M3	3,52	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	4. Pemasangan Rangka Scaffolding K-178	Kg	71,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	5. Pemasangan Rangka Scaffolding K-178	M2	17,28	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	6. Pemasangan Rangka Scaffolding K-178	M3	4,64	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	K. PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
46	1. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	Kg	1,958,88	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	2. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	Kg	352,80	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	3. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	M2	0,92	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	4. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	Bh	64,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	5. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	Bh	4,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	6. Rangka Tower 40.40.4 (Papan)	Unit	4,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	L. PEKERJAAN PENGICATAN RANGKA TOWER													
53	1. Pemasangan Rangka Tower	M2	28,00	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	M. PEKERJAAN LANTAI BENDUKAN TANDON													
55	1. Pemasangan Rangka Lantai Kayu 2 cm	M2	23,04	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	N. PEKERJAAN PERIPAAN DARI SUMUR MASUK TANDON													
57	1. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	2. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4"	Bh	4,00	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	O. PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN SUMUR													
60	1. Pemasangan Kran Sumur	M'	10,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	P. PEKERJAAN TANAH													
62	1. Lantai Tanah	M3	1,84	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	2. Lantai Tanah	M3	1,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Q. PEKERJAAN BRON													
65	1. Pemasangan Bron	M2	15,68	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	2. Pemasangan Bron	M3	1,88	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	R. PEMASANGAN PIPA DAN TANDON KE KRAN SUMUR													
68	1. Pipa Steel 3/4"	Bh	4,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	2. Pipa Steel 3/4"	Bh	4,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	3. Pipa Steel 3/4"	M	64,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	S. PEKERJAAN AKHIR													
72	1. Pemasangan Akhir	TK	4,00	1,22	-	-	-	-	13,01	-	13,01	-	-	(1,43)
73	JUMLAH				100,00									

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

NIK: 19791117 201004 1 002

Substansi: 01/01/2024 2023
KONSULTAN PENGEWAJ
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

NIK: 19791117 201004 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengkajian Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah
Nabire II (Wadio 2, Kali Semen, Bumi Raya 1, Bumi Raya 2)
: PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

LAPORAN BULANAN

Bulan Ke : Dua
Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023
KE- 2

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				BULAN LALU		BULAN INI		3/D BULAN INI				RENCANA			
		SAT.	VOLUME	BOBOT		VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
		3	4	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1.1	Instalasi peralatan bor 1 (suku) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89		1,00	0,47	2,00	0,95	3,00	1,42	2,00	0,95				
1.2	Demobilisasi peralatan bor 1 (suku) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kali	4,00	1,89		1,00	0,47	2,00	0,95	3,00	1,42	2,00	0,95				
1.3	Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemampatan sumur termasuk pembongkaran dan pemindahan alat kotak ukur beserta alat penengkapannya	Kali	4,00	2,02		1,00	0,51	2,00	1,01	3,00	1,52	2,00	1,01				
1.4	Instalasi peralatan dan Promosi K3 terdiri atas:																
1.4.1	Topi	BH	1,00	0,05		1,00	0,05										
1.4.2	Topi pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,68		1,50	0,17	3,00	0,34	4,50	0,51	2,67	0,30	0,33	0,04		
1.4.3	Penutup mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,18		1,50	0,05	3,00	0,09	4,50	0,14	2,67	0,08	0,33	0,01		
1.4.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	6,00	0,05		1,50	0,01	3,00	0,02	4,50	0,03	2,67	0,02	0,33	0,00		
1.4.5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	6,00	1,91		1,50	0,41	3,00	0,94	4,50	1,44	2,67	0,85	0,33	0,11		
1.4.6	Masker keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46		1,50	0,11	3,00	0,23	4,50	0,34	2,67	0,20	0,33	0,03		
2	PEKERJAAN PENGORAK SUMUR EKSPLOKASI																
2.1	Pembesian Lokal Zengabon	Ls	4,00	0,61		1,00	0,15	2,00	0,30	3,00	0,46	2,00	0,30				
2.2	Pengelasan rangka kawat diameter 6"	M	175,00	31,72		43,75	7,93	87,50	15,86	131,25	23,79	87,50	15,86				
2.3	Pengelasan / perapian dinding lubang bor	M	175,00	2,45		43,75	0,61	87,50	1,22	131,25	1,84	87,50	1,22				
3	PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH																
3.1	Pengambilan sampel dan Analisa Sample	TK	4,00	1,82		1,00	0,46	2,00	0,91	3,00	1,37	2,00	0,91				
3.2	Analisa hasil Coring	TK	4,00	6,08				2,00	3,04	2,00	3,04	2,00	3,04				
3.3	Analisa Hidrologi	TK	4,00	3,04				2,00	1,52	2,00	1,52	2,00	1,52				
3.4	Laporan Akhir	Ls	1,00	1,52													
4	PENGADAAN PWA KONSTRUKSI SUMUR																
4.1	Pipa PVC AW diameter 6"	M	175,00	5,55		43,75	1,39	87,50	2,78	131,25	4,16	87,50	2,78				
4.2	Saluran Pipa	BH	4,00	0,06		1,00	0,02	2,00	0,03	3,00	0,06	2,00	0,03				
5	PENGADAAN BAHAN ISAN KONSTRUKSI SUMUR																
5.1	Pengalasan dinding lubang bor / Material Pilihan Gravel Perak Terentu	M3	3,43	0,54		0,86	0,13	1,72	0,27	2,57	0,40	1,72	0,27				
6	PEKERJAAN PUMPING TES																
6.1	Uji Pemampatan berhadap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81				12,00	0,90	12,00	0,90	12,00	0,90				
6.2	Uji Pemampatan	Jam	24,00	1,81				12,00	0,90	12,00	0,90	12,00	0,90				
7	PEKERJAAN PENTELPAHAN																
7.1	Pembesian besi sumur	Ls	4,00	0,61				2,00	0,30	2,00	0,30	2,00	0,30				
8	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE																
8.1	Pompa submersible Phone	Unit	4,00	7,43				2,00	3,71	2,00	3,71	2,00	3,71				
8.2	Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	159,00	0,62				79,50	0,31	79,50	0,31	79,50	0,31				
9	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR																
9.1	Pembesian Lokal Tower	M2	100,00	0,33				75,00	0,25	75,00	0,25	50,00	0,17	25,00	0,08		
9.2	Galon Tanah	M3	0,22	0,01				0,17	0,01	0,17	0,01	0,11	0,01	0,06	0,00		
9.3	Grukan Tanah	M3	0,06	0,00				0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00		
10	PEKERJAAN MITON FONDASI TOWER																
10.1	Stal																
10.2	Pembesian Pembesian Stal	Kg	168,80	0,54				126,60	0,42	126,60	0,42	84,40	0,28	42,20	0,14		
10.3	Pembesian Jekelina Stal	M2	13,44	0,59				10,08	0,45	10,08	0,45	6,72	0,30	3,36	0,15		
10.4	Pengalasan beton Stal K-175	M3	3,52	1,36				2,64	1,02	2,64	1,02	1,76	0,68	0,88	0,34		
11	Fondasi TIK																
11.1	Pembesian Pembesian Fondasi TIK	Kg	71,00	0,24				53,25	0,18	53,25	0,18	35,50	0,12	17,75	0,06		
11.2	Pembesian Jekelina Fondasi TIK	M2	17,28	0,76				12,96	0,57	12,96	0,57	8,64	0,38	4,32	0,19		
11.3	Pengalasan beton Fondasi TIK K-175	M3	4,64	1,85				3,48	1,39	3,48	1,39	2,32	0,93	1,16	0,46		
12	PEKERJAAN RANGKA DAN TANGGA TOWER																
12.1	Besi Baja RUMAH Rong Rong	Kg	1,958,88	3,82				1,469,16	2,84	1,469,16	2,84	979,44	1,91	489,72	0,95		
12.2	Besi Baja RUMAH Rong Rong (Pagar)	Kg	352,80	1,05				264,60	0,79	264,60	0,79	176,40	0,53	88,20	0,26		
12.3	Plat marplat tebal 1 cm	M2	0,92	0,16				0,69	0,12	0,69	0,12	0,46	0,08	0,23	0,04		
12.4	Aspalur besi M16	Bh	64,00	0,49				48,00	0,36	48,00	0,36	32,00	0,24	16,00	0,12		
12.5	Pembesian Tangga Tower Tandon	Bh	4,00	1,52				3,00	1,14	3,00	1,14	2,00	0,74	1,00	0,38		
12.6	Saluran Pipa dan Pengalasan	Unit	4,00	4,56				3,00	3,42	3,00	3,42	2,00	2,28	1,00	1,14		
13	PEKERJAAN PENGALASAN RANGKA TOWER																
13.1	Pengalasan besi RUMAH Rong Rong	M2	28,00	0,59				21,00	0,44	21,00	0,44	14,00	0,29	7,00	0,15		
14	PEKERJAAN LAMPAI DINDING TANDON																
14.1	Pengalasan Papan Lantai Kayu Besi 1m x 2 cm	M2	23,04	1,26				17,28	0,95	17,28	0,95	11,52	0,63	5,76	0,32		
15	PEKERJAAN PERPAJAN DARI SUMUR MASUK TANDON																
15.1	Pengalasan Pipa PVC dia. 3/4"	M	32,00	0,25				24,00	0,18	24,00	0,18	16,00	0,12	8,00	0,06		
15.2	Pengalasan Profil Torsi 2000 L	Bh	4,00	2,43				3,00	1,82	3,00	1,82	2,00	1,22	1,00	0,61		
16	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAM SUMUR																
16.1	Pembesian Lokal Kram Sumur	M	10,00	0,03				7,50	0,02	7,50	0,02	5,00	0,02	2,50	0,01		
17	PEKERJAAN TANAH																
17.1	Saluran Tanah	M3	1,84	0,10				1,38	0,07	1,38	0,07	0,92	0,05	0,46	0,02		
17.2	Saluran Kram	M3	1,44	0,03				1,08	0,02	1,08	0,02	0,72	0,01	0,36	0,01		
18	PEKERJAAN MITON																
18.1	Pengalasan Pipa Jekelina	M2	15,48	0,69				1,41	0,51	1,41	0,51	0,94	0,34	0,47	0,17		
18.2	Pengalasan Cor. Besi Beton Kram Air	M3	1,88	0,46								2,00	0,02	1,00	0,01		
19	PEKERJAAN PWA DARI TANDON KE KRAM SUMUR																
19.1	Pipa PVC 8 3/4"	Bh	4,00	0,09				3,00	0,07	3,00	0,07	2,00	0,02	1,00	0,01		
19.2	Pipa PVC 8 3/4"	Bh	4,00	0,05				3,00	0,03	3,00	0,03	2,00	0,02	1,00	0,01		
19.3	Pipa PVC 8 3/4"	M	44,00	0,49				48,00	0,37	48,00	0,37	32,00	0,25	16,00	0,12		
20	PEKERJAAN AKHIR																
20.1	Laporan Akhir	TK	4,00	1,22				2,00	0,61	2,00	0,61	48,72	49,04			6,18	
Jumlah				100,00		13,01			56,22								

PEMBAK PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

IRWAN HENDRIK S. M.S.
NIP. 19791117 201004 1 002

30 November 2023
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Perencanaan Pembinaan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah
: PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)

: 2023

Bulan Ke : Tiga

Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

KE - 8

LAPORAN BULANAN

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		RENCANA		DEVIASI		
	SAT.	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2													
1. PERSIAPAN PONDASIAN													
1.1. Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kal	4,00	1,89	3,00	1,42	1,00	0,47	4,00	1,89	1,00	0,47	-	-
1.2. Mobilisasi peralatan bor 1 (satu) unit dan alat bantu serta team personil dari workshop ke job site.	Kal	4,00	1,89	3,00	1,42	1,00	0,47	4,00	1,89	1,00	0,47	-	-
1.3. Pemasangan Pipa dan Mesin untuk uji pemompaan sumur termasuk pembangunan dan pemindahan alat katok ukur beserta alat perlengkapannya	Kal	4,00	2,02	3,00	1,42	1,00	0,51	4,00	2,02	1,00	0,51	-	-
1.4.3. Instalasi keselamatan dan Promosi K3 terdiri atas:													
1.4.3.1. Spanduk	BH	1,00	0,05	1,00	0,05	-	-	1,00	0,05	-	-	-	-
1.4.3.2. Tali pelindung (Safety Helmet)	BH	6,00	0,68	4,50	0,51	1,50	0,17	6,00	0,68	2,00	0,23	(0,50)	(0,04)
1.4.3.3. Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	BH	6,00	0,18	4,50	0,14	1,50	0,05	6,00	0,18	2,00	0,06	(0,50)	(0,02)
1.4.3.4. Sarung tangan (Safety Gloves)	PSG	6,00	0,05	4,50	0,03	1,50	0,01	6,00	0,05	2,00	0,01	(0,50)	(0,00)
1.4.3.5. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	PSG	6,00	1,91	4,50	1,44	1,50	0,48	6,00	1,91	2,00	0,64	(0,50)	(0,16)
1.4.3.6. Rompi keselamatan (Safety Vest)	BH	6,00	0,46	4,50	0,34	1,50	0,11	6,00	0,46	2,00	0,15	(0,50)	(0,04)
2. PERSIAPAN PENGOPERAN SUMUR EKSPLOKASI													
2.1. Pemasangan Lokal Pengaliran	LS	4,00	0,61	3,00	0,46	1,00	0,15	4,00	0,61	1,00	0,15	-	-
2.2. Pengaliran segala format diameter 6"	M	175,00	31,72	131,25	23,79	43,75	7,93	175,00	31,72	43,75	7,93	-	-
2.3. Pemadatan / perapian dinding lubang bor	M	175,00	2,45	131,25	1,84	43,75	0,61	175,00	2,45	43,75	0,61	-	-
3. PENGAMBILAN DAN ANALISA SAMPEL TANAH													
3.1. Pengambilan Sample dan Analisis Sample	TKL	4,00	1,82	3,00	1,37	1,00	0,44	4,00	1,82	1,00	0,44	-	-
3.2. Analisis hasil Coring	TKL	4,00	6,08	2,00	3,04	2,00	3,04	4,00	6,08	1,00	1,52	1,00	1,52
3.3. Analisis Hidrologi	TKL	4,00	3,04	2,00	1,52	2,00	1,52	4,00	3,04	2,00	1,52	-	-
3.4. Laporan Akhir	LS	1,00	1,52	-	-	1,00	1,52	1,00	1,52	1,00	1,52	-	-
4. PENGADAAN PIPA KONSTRUKSI SUMUR													
4.1. Pipa PVC AW diameter 4"	M	175,00	5,55	131,25	4,16	43,75	1,39	175,00	5,55	43,75	1,39	-	-
4.2. Isoterm Plug	BH	4,00	0,06	3,00	0,05	1,00	0,02	4,00	0,06	1,00	0,02	-	-
5. PENGADAAN BAHAN ISIAN KONSTRUKSI SUMUR													
5.1. Pengaliran dinding Lubang Bor (Material Pitman) Gravel Park tertentu	M3	3,43	0,54	2,57	0,40	0,86	0,13	3,43	0,54	0,16	0,13	-	-
6. PERSIAPAN PEMBERIAN													
6.1. Uji pemompaan terhadap dan Uji debit tetap	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	12,00	0,90	24,00	1,81	12,00	0,90	-	-
6.2. Uji Pemompaan	Jam	24,00	1,81	12,00	0,90	12,00	0,90	24,00	1,81	12,00	0,90	-	-
7. PERSIAPAN PERSIAPAN													
7.1. Pembuatan Box Sumur	LS	4,00	0,61	2,00	0,30	2,00	0,30	4,00	0,61	2,00	0,30	-	-
8. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE													
8.1. POMPA AIR BAKU													
8.2. Pompa Submersible Phase	Unit	4,00	7,43	2,00	3,71	2,00	3,71	4,00	7,43	2,00	3,71	-	-
8.3. Pemasangan Pipa PVC dia. 3/4" Outlet Pompa	M	159,00	0,62	79,50	0,31	79,50	0,31	159,00	0,62	79,50	0,31	-	-
9. PERSIAPAN TOWER TANDON AIR													
9.1. PERSIAPAN PERSIAPAN :													
9.1.1. Pemasangan Lokal Tower	M2	100,00	0,33	75,00	0,25	25,00	0,08	100,00	0,33	50,00	0,17	(25,00)	(0,08)
9.1.2. Galian Tanah	M3	0,22	0,01	0,17	0,01	0,06	0,00	0,22	0,01	0,11	0,01	(0,06)	(0,00)
9.1.3. Urugan Tanah	M3	0,06	0,00	0,05	0,00	0,32	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	(0,02)	(0,00)
10. PERSIAPAN BETON PONDASI TOWER													
10.1. Beton	Kg	168,80	0,56	126,60	0,42	42,20	0,14	168,80	0,56	84,40	0,28	(42,20)	(0,14)
10.2. Pemasangan Pemasangan Scaff	M2	13,44	0,59	10,08	0,45	3,36	0,15	13,44	0,59	6,72	0,30	(3,36)	(0,15)
10.3. Pemasangan Bekisting Scaff	M2	3,52	1,36	2,64	1,22	0,88	0,34	3,52	1,36	1,76	0,68	(0,88)	(0,34)
10.4. Pemasangan Beton Scaff K-175	M3	71,00	0,24	53,25	0,18	17,75	0,06	71,00	0,24	35,50	0,12	(17,75)	(0,06)
10.5. Pemasangan Pemasangan Pondasi TIKK	Kg	17,28	0,76	12,96	0,57	4,32	0,19	17,28	0,76	8,64	0,31	(4,32)	(0,19)
10.6. Pemasangan Bekisting Pondasi TIKK	M2	4,64	1,85	3,48	1,39	1,16	0,46	4,64	1,85	2,32	0,93	(1,16)	(0,46)
10.7. Pemasangan Beton Pondasi TIKK K-175	M3	71,00	0,24	53,25	0,18	17,75	0,06	71,00	0,24	35,50	0,12	(17,75)	(0,06)
11. PERSIAPAN RANGKA DAN TANGGA TOWER													
11.1. Besi Baja 80,80 & 80,80 Utama	Kg	1,958,88	3,82	1,469,16	2,86	489,72	0,95	1,958,88	3,82	979,44	1,91	(489,72)	(0,95)
11.2. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.3. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.4. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.5. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.6. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.7. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.8. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.9. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.10. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.11. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.12. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.13. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.14. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.15. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.16. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.17. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.18. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.19. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.20. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.21. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.22. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.23. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.24. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.25. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.26. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.27. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.28. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.29. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.30. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.31. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80	1,05	176,40	0,53	(88,20)	(0,26)
11.32. Besi Baja 40,40 (Papan)	Kg	352,80	1,05	264,60	0,79	88,20	0,26	352,80					

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. ZHARA UTAMA KONSTRUKS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samudra Bawah - PPI Samoha - Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Tudic 2,
LOKASI : PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KAU SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Satu
Periode : 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023

KURVA S

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	9,14	RENCANA 1,39 REALISASI 1,43		0,84 0,88	1,34 1,39	0,84 0,88	1,34 1,39	0,84 0,88	1,34 1,39	0,84 0,88	0,36 -	
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	57,60	RENCANA 10,06 REALISASI 8,54		2,15 2,15	10,96 9,44	2,91 2,15	11,11 11,87	3,06 4,58	11,11 11,87	3,94 7,00	2,28 -	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	8,05	RENCANA - REALISASI -		- -	2,01 2,01	- -	2,01 2,01	- -	2,01 2,01	2,01 2,01	- -	
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	21,84	RENCANA - REALISASI -		- -	1,43 1,43	4,03 4,03	5,46 5,46	- -	5,46 5,46	- -	1,43 -	4,03
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,16	RENCANA - REALISASI -		- -	- -	0,54 0,54	0,54 0,54	- -	0,54 0,54	- -	- -	0,54
F	PEKERJAAN AKHIR	1,22	RENCANA - REALISASI -		- -	- -	0,30 0,30	0,30 0,30	- -	0,30 0,30	- -	0,30 -	0,30
JUMLAH		100,00											
RENCANA				11,45	2,99	15,74	8,62	20,77	3,90	20,77	8,24	7,52	
KUMULATIF				11,45	14,43	30,18	38,80	59,57	63,47	84,24	92,48	100,00	
BOBOT				9,97	3,03								
KUMULATIF				9,97	13,01								

PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWANISKANDAR, ST., M.SI

NIP. 1979111720100411002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. ZHARA UTAMA KONSTRUKS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samudra Bawah - PT Samudra - Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KEGIATAN : Penelepon Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan data: Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wado 2,
LOKASI : PAKET 8 NABIRE II (WADO 2, KAU SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
TAHUN ANGGARAN : 2023

Bulan Ke : Dua
Periode : 01 November 2023 - 30 November 2023

KURVA S

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	9,14	RENCANA 1,39 REALISASI 1,43	1,39	0,84	1,34	0,84	1,34	0,84 RENCANA 0,84	1,34	0,84	0,36	
B	PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	57,60	RENCANA 10,06 REALISASI 8,54	10,06	2,15	10,96	2,91	11,11	3,06	11,11	3,96	2,28	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	8,05	RENCANA - REALISASI -	-	-	2,01	-	2,01	4,58	2,01	2,01	-	
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	21,84	RENCANA - REALISASI -	-	-	1,43	4,03	5,46	5,46	5,46	1,43	4,03	
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,16	RENCANA - REALISASI -	-	-	-	0,54	0,54	0,54	0,54	-	0,54	
F	PEKERJAAN AKHIR	1,22	RENCANA - REALISASI -	-	-	-	0,30	0,30	-	0,30	0,30	-	
Jumlah				11,45	2,99	15,74	8,62	20,77	3,90	20,77	8,24	7,52	
RENCANA				11,45	14,43	30,18	38,80	59,57	63,47	84,24	92,48	100,00	
BOBOT				9,97	3,03	14,27	7,91	21,58	11,46				
KUMULATIF				9,97	13,01	27,27	35,18	56,76	68,22				

PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

SUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. ZHARA UTAMA KONSTRUKS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Sambutsa Bawah - PPI Sanebo - Nabire 99816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ANUGERAH PAPUA
KONSULTAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
: Pengawasan Pembuatan Sumur Eksplorasi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Cekungan Air Tanah di Wilayah Nabire II (Wadio 2,
: PAKET 8 NABIRE II (WADIO 2, KALI SEMEN, BUMI RAYA 1, BUMI RAYA 2)
: 2023

Bulan Ke : Tiga
Periode : 01 Desember 2023 - 12 Desember 2023

KURVA S

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	RENCANA / REALISASI	Minggu ke									KET.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	9,14	RENCANA 1,39 REALISASI 1,43	1,39	0,84	1,34	0,84	1,34	0,84	1,34	0,84	0,36	
B	PEKERJAAN PENCEBORAN SUMUR EKSPLORASI	57,50	RENCANA 10,06 REALISASI 8,54	2,15	2,15	10,96	2,91	11,87	3,06	11,11	3,96	2,28	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SUBMERSIBLE	8,05	RENCANA - REALISASI -	-	-	2,01	-	2,01	-	2,01	2,01	-	
D	PEKERJAAN TOWER TANDON AIR	21,84	RENCANA - REALISASI -	-	-	1,43	4,03	5,46	-	5,46	1,43	4,03	
E	PEKERJAAN PEMASANGAN KRAN UMUM	2,16	RENCANA - REALISASI -	-	-	1,43	0,54	0,54	0,54	0,54	-	0,54	
F	PEKERJAAN AKHIR	1,22	RENCANA - REALISASI -	-	-	-	0,30	0,30	-	0,30	0,30	-	
JUMLAH		100,00											
RENCANA				11,45	2,99	15,74	8,62	20,77	3,90	20,77	8,24	7,52	
BOBOT				11,45	14,43	30,18	38,80	59,57	63,47	84,24	92,48	100,00	
REALISASI				9,97	3,03	14,27	7,91	21,58	11,46	21,58	10,20	-	
KUMULATIF				9,97	13,01	27,27	35,18	56,76	68,22	89,80	100,00	-	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST, M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
