




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl. Merdeka Nabire - Papua Tengah



PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA
NABARUA BAWAH
TAHUN ANGGARAN 2023

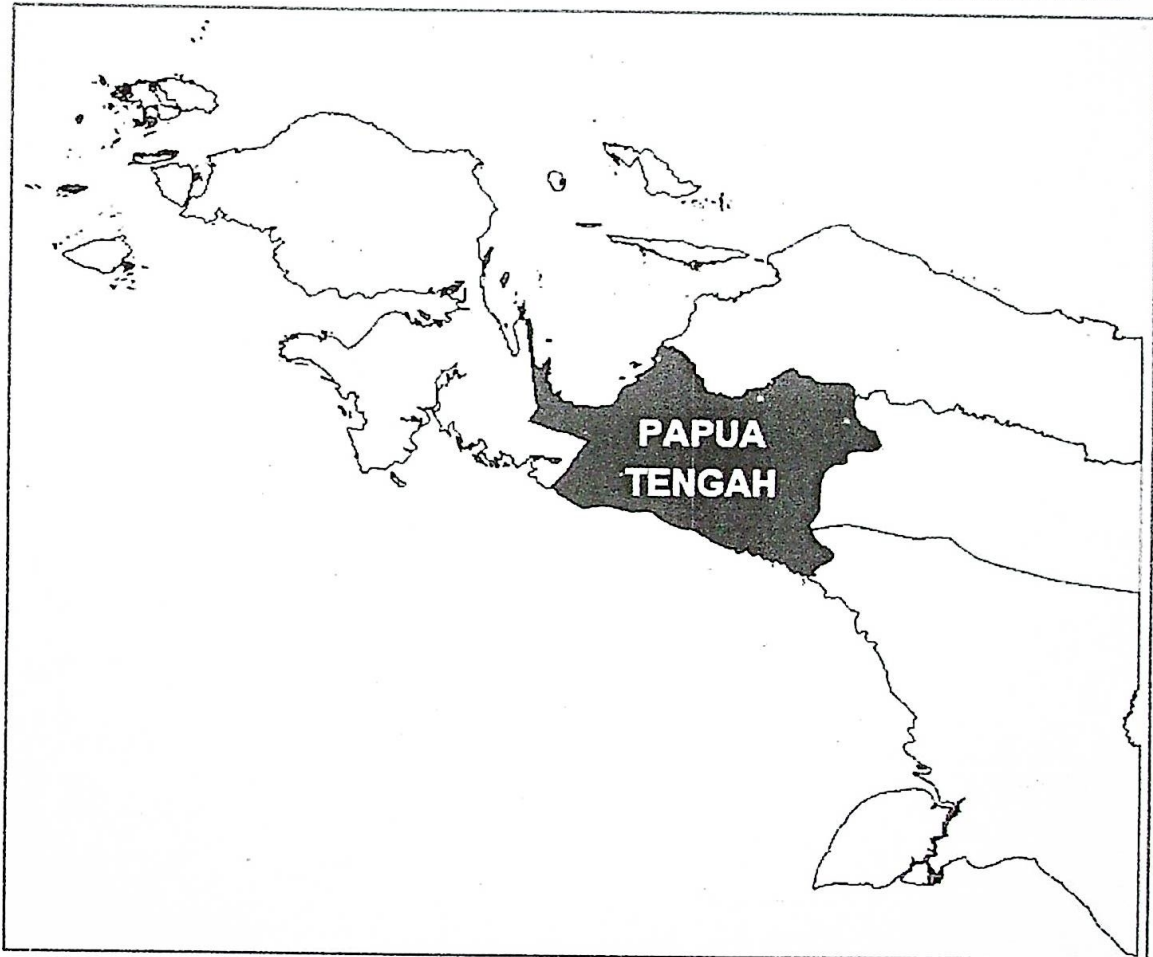

LAPORAN BULAN 2 (DESEMBER)

KONSULTAN PENGAWAS



CV. ARWINA KONSULTAN
Professional Konsultan Service
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24, Jember 61451, Jawa Timur

KONTRAKTOR PELAKSANA



BULABU KONSULTAN JAYA
General Contractor & Engineer
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24, Jember 61451, Jawa Timur



CV BERDIRI TEGAK
Konstruksi, Pengadaan Barang & Jasa
Alamat: Komplek Wapate 1, Tia - Kabupaten Dorey



CV. MAYA JANGGA PAPUA
CONTRACTOR & LEVERANSIR
Jl. Bungkuring 54, Kelurahan Karang Kuning, Distrik Kuala Gajah, Kabupaten Mimika
Provinsi Papua Tengah, Indonesia 59120



CV. ARWINA KONSULTAN

Professional Konsultan Service

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 2A Dok V Telp. (0967) 5164197 Jayapura – Papua

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Nabire, 31 Desember 2023

Perihal : Laporan Bulanan

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVNSI PAPUA TENGAH**

di -

Nabire

Dengan hormat,

Berdasarkan Kontrak Konsultan Supervisi

Paket : **PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA
NABARUA BAWAH**

Nomor : **600/34/SPK-SNP/PUPR-PT/XI/2023**

tanggal : **25 Novemver 2023**

bersama ini disampaikan Laporan Bulanan

No : 02

Periode : Bulan Desember 2023

Sebanyak : 5 buku

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Hormat kami,
KONSULTAN SUPERVISI
CV. ARWINA KONSULTAN


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
SURAT PENGATNTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETA LOKASI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Umum	1
1.2. Uraian Pekerjaan	5
1.3. Kondisi Eksisting	10
1.4. Rencana Penanganan	10
BAB II AKTIVITAS KONTRAKTOR	
2.1. Aktivitas Fisik Bulan ini	12
2.2. Struktur Organisasi Kontraktor	15
2.3. Daftar Peralatan	17
2.4. Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan.....	18
2.6. Ringkasan Quality Control	33
BAB III AKTIVITAS KONSULTAN	
3.1. Laporan Aktivitas Konsultan Supervisi	35
3.2. Struktur Organisasi Konsultan Supervisi	36
3.3. Jadwal Penugasan Personil	37
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran	39
LAMPIRAN	
Lampiran sesuai progress pada bulan yang bersangkutan	40

PETA LOKASI

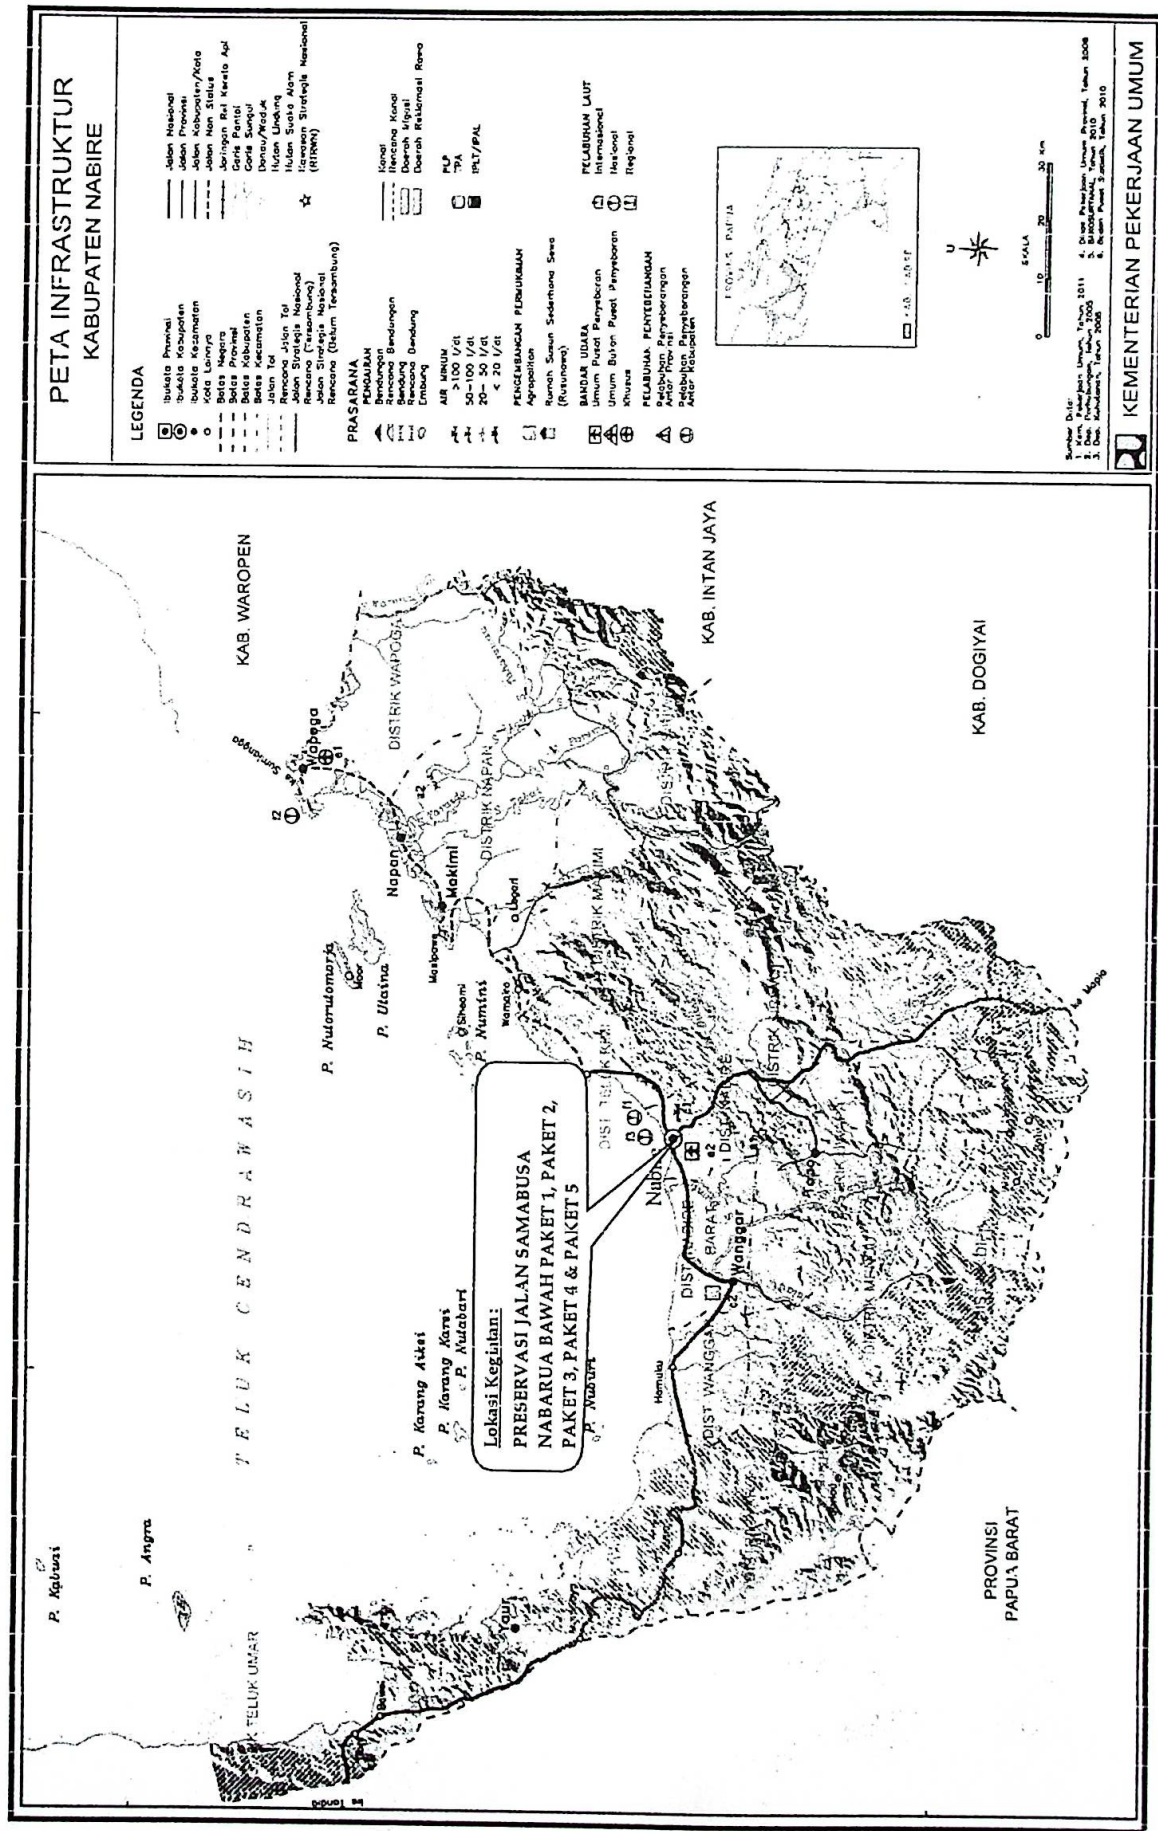

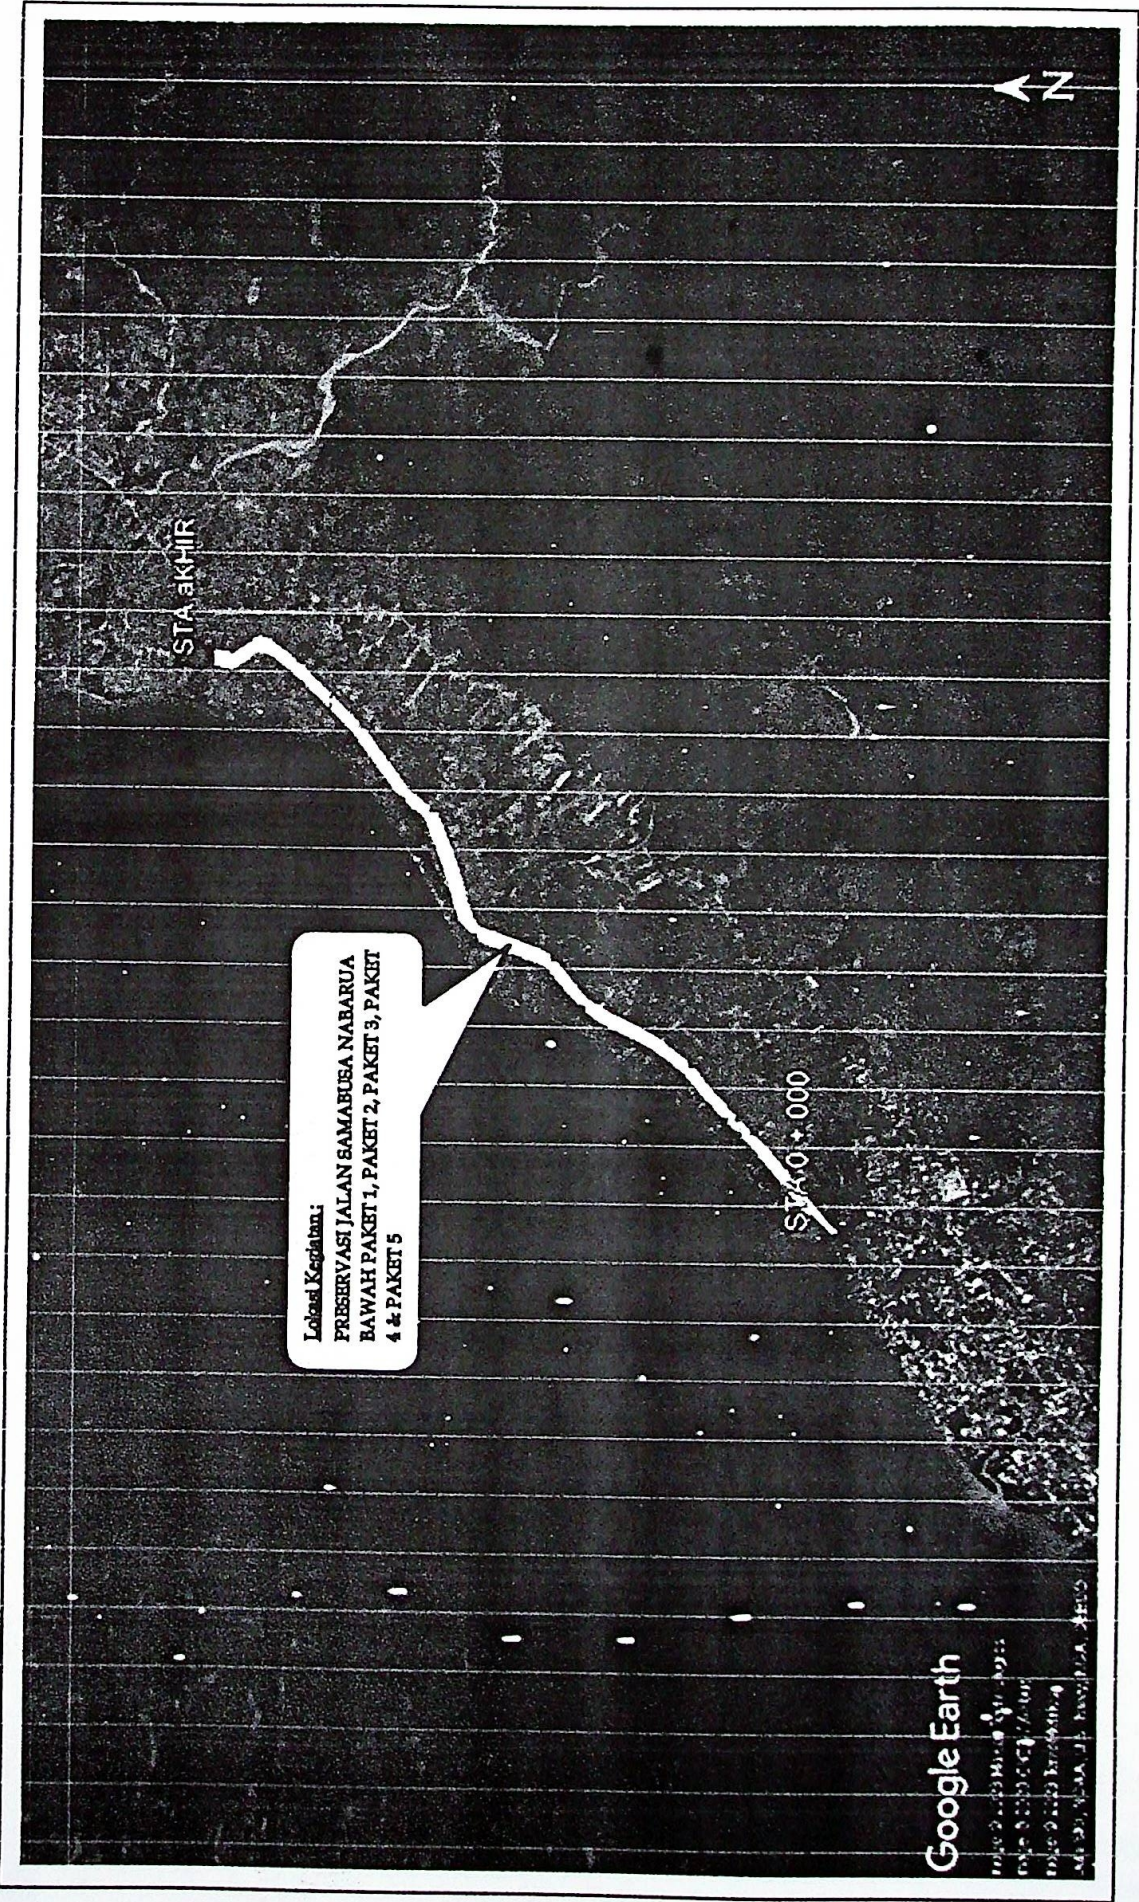

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

1.2. UMUM

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan sasaran pembangunan yang diarahkan pada Indonesia Bagian Timur termasuk di dalamnya Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, maka pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan.

Dan Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian baik pelaksanaan fisik di lapangan maupun administrasi, maka Pemerintah daerah dalam hal ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, telah menunjuk Konsultan Pengawasan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan - kegiatan diantaranya :

- *"PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 1" oleh CV. BULABU ANUGERAH JAYA.*
- *"PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 2" oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA.*
- *"PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 3" oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA.*
- *"PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 4" oleh CV. BERDIRI TEGAK.*
- *"PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 5" oleh CV. BULABU ANUGERAH JAYA.*

Dan dalam hal ini Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan Pengawasan jalan tersebut diatas yaitu CV. ARWINA KONSULTAN Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/34/SPK-SNP/PUPR-PT/XI/2023 Tanggal 25

November 2023. Adapun Struktur Organisasi Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kegiatan PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH yaitu yang terlampir dibawah ini:


STRUKTUR ORGANISASI

PENGGUNA ANGGARAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

Pekerjaan : "PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 1, PAKET 2, PAKET 3, PAKET 4 &
PAKET 5"

Kabupaten : Nabire

Tahun : 2023

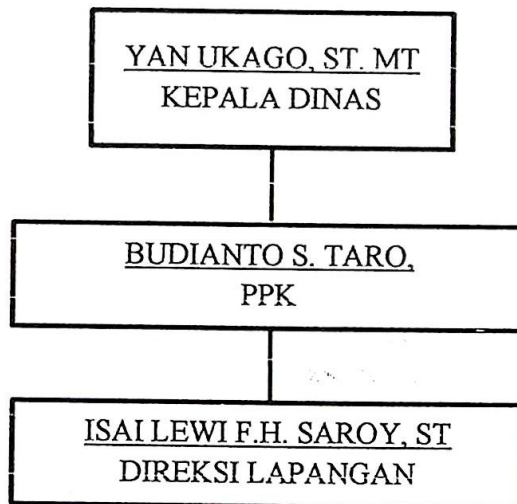

Adapun pula data-data umum dari kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan – Kegiatan “PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH”, Kabupaten Nabire yaitu:

- Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 1
Nomor Kontrak : 600/19/SPK-SN1/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 21 November 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 999.491.861,87;
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 40 (Empat Puluh) Hari kalender
- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 2
Nomor Kontrak : 600/22/SPK-SN2/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 999.584.459,81;
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 40 (Empat Puluh) Hari kalender
- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 3
Nomor Kontrak : 600/25/SPK-SN3/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 999.584.459,81;
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 40 (Empat Puluh) Hari kalender

➤ Kontraktor : CV. BERDIRI TEGAK
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 4
Nomor Kontrak : 600/28/SPK-SN4/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 27 November 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 868.171.245,65;
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 35 (Tiga Puluh Lima) Hari kalender

➤ Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 5
Nomor Kontrak : 600/31/SPK-SN5/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 999.584.459,81;
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 40 (Empat Puluh) Hari kalender

1.2. URAIAN PEKERJAAN

Adapun Uraian Pekerjaan kontraktor pelaksana, adalah sebagai berikut :

- “PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 1”
oleh CV. BULABU ANUGERAH JAYA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
PEKERJAAN : PRESERVASI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH PAKET 1						
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH						
LOKASI : KABUPATEN NABIRE, PROV. PAPUA TENGAH						
SUMBER DANA : APBDP						
TAHUN ANGGAR. : 2023						
No Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	BOBOT THDP TOTAL
a	b	c	d	e	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.0	54,890,000	54,890,000	6.10
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.0	23,137,500	23,137,500	2.57
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.0	55,550,000	55,550,000	6.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					133,577,500	14.83
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	2,540.0	12,468.18	31,669,189	3.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31,669,189	3.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	381.0	783,923.40	298,674,814	33.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					298,674,814	33.17
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.1	38,635.68	74,336,978	8.25
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	127.3	2,845,111.66	362,258,077	40.23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					436,595,054	48.48
NILAI FISIK					900,516,557	100.00

➤ "PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 2"
oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
PEKERJAAN : PRESERVASI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH PAKET 2 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH LOKASI : KABUPATEN NABIRE, PROV. PAPUA TENGAH SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGAR : 2023						
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	BOBOT THDP TOTAL
a	b	c	d	e	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.0	54,890,000	54,890,000	6.10
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.0	23,137,500	23,137,500	2.57
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.0	55,550,000	55,550,000	6.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					133,577,500	14.83
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	2,540.0	12,468.18	31,669,189	3.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31,669,189	3.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	381.0	783,923.40	298,674,814	33.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					298,674,814	33.17
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.1	38,635.68	74,336,978	8.25
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	127.3	2,845,111.66	362,258,077	40.23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					436,595,054	48.48
NILAI FISIK					900,516,557	100.00

➤ "PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 3"
oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
PEKERJAAN : PRESERVASI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH PAKET 3 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH LOKASI : KABUPATEN NABIRE, PROV. PAPUA TENGAH SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGAR : 2023						
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	BOBOT THDP TOTAL
a	b	c	d	e	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.0	54,890,000	54,890,000	6.10
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.0	23,137,500	23,137,500	2.57
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.0	55,550,000	55,550,000	6.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					133,577,500	14.83
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	2,540.0	12,468.18	31,669,189	3.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31,669,189	3.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	381.0	783,923.40	298,674,814	33.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					298,674,814	33.17
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.1	38,635.68	74,336,978	8.25
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	127.3	2,845,111.66	362,258,077	40.23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					436,595,054	48.48
NILAI FISIK					900,516,557	100.00

➤ "PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 4"
oleh CV. BERDIRI TEGAK

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
PEKERJAAN : PRESERVASI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH PAKET 4 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH LOKASI : KABUPATEN NABIRE, PROV. PAPUA TENGAH SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGAR : 2023						
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	BOBOT THDP TOTAL
a	b	c	d	e	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.0	69,095	69,095	0.01
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.0	23,137,500	23,137,500	2.96
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.0	48,540	48,540	0.01
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					23,255,135	2.97
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	28.08	373,359.36	10,483,931	1.34
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					10,483,931	1.34
	DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (8)	Beton, f'c 15 Mpa	M ³	1.34	2,364,389.22	3,168,282	0.41
7.3 (1)	Baja Tulangan Poles-BjTP 280	Kg	185.22	27,793.99	5,148,003	0.66
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ²	30.75	1,458,819.80	44,858,709	5.74
7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	350.00	1,410,970.00	493,839,500	63.14
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M ¹	15.40	119,787.25	1,844,724	0.24
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					548,859,217	70.17
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
8.3.(1a)	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µ	M ²	215.6	49,690.99	10,713,377	1.37
8.7.(1a)	Pengecatan struktur baja pada daerah kering, tebal 80 mikron	M ²	176.8	162,157.26	28,661,296	3.66
8.10.(1)	Penggantian lantai Kayu	M ³	7.1	7,463,193.29	52,615,513	6.73
8.10.(7)	Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M ³	1.8	7,751,029.08	13,951,852	1.78
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					105,942,038	13.55
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	80.0	49,647.38	3,971,790	0.51
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,971,790	0.51
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M ³	108.6	779,586.79	84,624,146	10.82
10.2.(1)	Pemeliharaan Kinerja Jembatan bentang m	LS	1.0	5,000,000.00	5,000,000	0.64
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					89,624,146	11.46
NILAI FISIK					782,136,257	100.00

➤ "PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 5"
oleh CV. BULABU ANUGERAH JAYA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
PEKERJAAN : PRESERVASI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH PAKET 5 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH LOKASI : KABUPATEN NABIRE, PROV. PAPUA TENGAH SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGAR : 2023						
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $f = (d \times e)$	BOBOT THDP TOTAL
a	b	c	d	e	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.0	54,890,000	54,890,000	6.10
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.0	23,137,500	23,137,500	2.57
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.0	55,550,000	55,550,000	6.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					133,577,500	14.83
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	2,540.0	12,468.18	31,669,189	3.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31,669,189	3.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	381.0	783,923.40	298,674,814	33.17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					298,674,814	33.17
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.1	38,635.68	74,336,978	8.25
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	127.3	2,845,111.66	362,258,077	40.23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					436,595,054	48.48
NILAI FISIK					900,516,557	100.00

1.3. KONDISI EKSISTING

Adapun Kondisi eksisting lokasi Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH Tahun 2023 yaitu :

- Lokasi Pembangunan Berada di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- Area Lahan Berkontur Datar.
- Tanah dasar pada lokasi kegiatan cukup baik.

1.4. RENCANA PENANGANAN

Adapun rencana penanganan dari Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH adalah sebagai berikut:

Rencana Penanganan :

Adapun proses Penanganan pada PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 1, PAKET 2, PAKET 3, PAKET 4 & PAKET 5 Tahun Anggaran 2023 oleh kontraktor pelaksana yaitu:

- PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 1 oleh CV. BULABU ANUGERAH JAYA yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - ❖ DIVISI V. PERKERASAN BERBUTIR
 - ❖ DIVISI VI. PERKERASAN ASPAL
- PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 2 oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - ❖ DIVISI V. PERKERASAN BERBUTIR
 - ❖ DIVISI VI. PERKERASAN ASPAL

- PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 3
oleh CV. NAIYA JANGGA PAPUA yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - ❖ DIVISI V. PERKERASAN BERBUTIR
 - ❖ DIVISI VI. PERKERASAN ASPAL

- PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 4
oleh CV. BERDIRI TEGAK yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - ❖ DIVISI VII. STRUKTUR
 - ❖ DIVISI VIII. REHABILITASI JEMBATAN
 - ❖ DIVISI IX. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
 - ❖ DIVISI X. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

- PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 5
oleh CV. BULABU ANUGERAI JAYA yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - ❖ DIVISI V. PERKERASAN BERBUTIR
 - ❖ DIVISI VI. PERKERASAN ASPAL

BAB II

AKTIVITAS KONTRAKTOR

2.1. AKTIVITAS FISIK BULAN INI

- ✓ Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 1
Kabupaten : Nabire.
Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

Aktivitas pekerjaan

- Divisi III, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan
- Divisi V. Perkerasan Berbutir
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A
- Divisi VI. Perkerasan Aspal
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi &
Lataston Lapis Aus (HRS-WC)

- ✓ Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 2
Kabupaten : Nabire.
Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

Aktivitas pekerjaan

- Divisi III, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan
- Divisi V. Perkerasan Berbutir

Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A

- Divisi VI. Perkerasan Aspal

Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi &
Lataston Lapis Aus (HRS-WC)

- ✓ Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
- Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 3
- Kabupaten : Nabire.
- Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

Aktifitas pekerjaan

- Divisi III, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan
- Divisi V. Perkerasan Berbutir
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A
- Divisi VI. Perkerasan Aspal
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi &
Lataston Lapis Aus (HRS-WC)

- ✓ Kontraktor : CV. BERDIRI TEGAK
- Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 3
- Kabupaten : Nabire.
- Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

Aktifitas pekerjaan

- Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
Pekerjaan Timbunan Biasa dari sumber galian

- Divisi VII. Struktur
Pekerjaan Beton $f_c'15$ Mpa, Baja Tulangan Polos-BjTP 280, Pasangan Batu, Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis dan Sandaran (Railing).
- Divisi VIII. Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 μ m, Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron, Penggantian Lantai Kayu dan Penggantian Papan Lajur Kendaraan.
- Divisi IX. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-lain
Pekerjaan Patok Pengarah
- Divisi X. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
Pekerjaan Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan bentang m

✓ Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
 Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
 BAWAH PAKET 5
 Kabupaten : Nabire.
 Tahun : 2023

Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:


Aktifitas pekerjaan

- Divisi III, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan
- Divisi V. Perkerasan Berbutir
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A
- Divisi VI. Perkerasan Aspal
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi & Lataston Lapis Aus (HRS-WC)

2.2. STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR


CV. BULABU ANUGERAH JAYA

PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 1




CV. NAIYA JANGGA PAPUA

PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 2




CV. NAIYA JANGGA PAPUA

PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 3




CV. BERDIRI TEGAK

PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 4

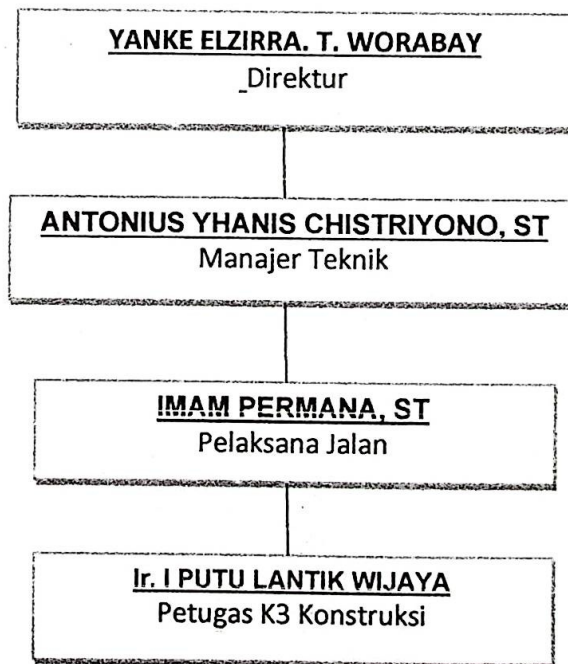

CV. BULABU ANUGERAH JAYA

PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH PAKET 5

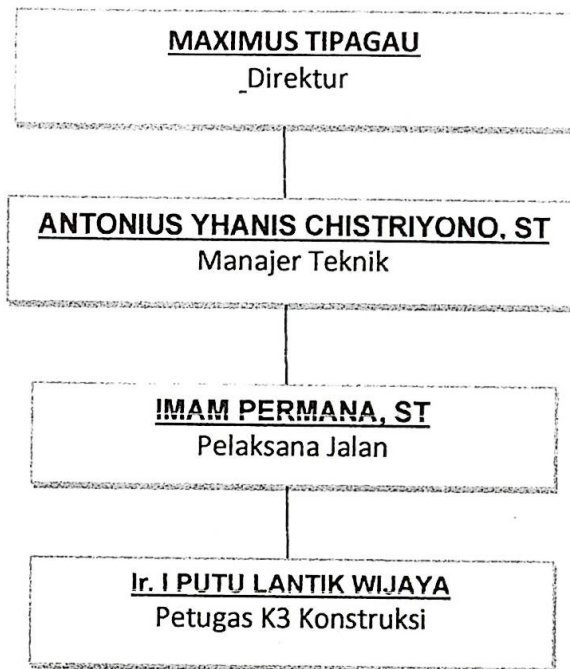

2.3. DAFTAR PERALATAN

Adapun dibawah ini Tabel daftar penggunaan peralatan yang dipergunakan kontraktor pelaksana yaitu :

➤ CV. BULABU ANUGERAH JAYA

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1.	Exavator	1 Unit	Nabire	Baik
2.	Water Tanker	1 Unit	Nabire	Baik
3	Motor Greder	1 Unit	Nabire	Baik
4.	Vibrator Roler	1 Unit	Nabire	Baik
5.	Wheel Loader	1 Unit	Nabire	Baik

➤ CV. NAIYA JANGGA PAPUA

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1.	Exavator	1 Unit	Nabire	Baik
2.	Water Tanker	1 Unit	Nabire	Baik
3	Motor Greder	1 Unit	Nabire	Baik
4.	Vibrator Roler	1 Unit	Nabire	Baik
5.	Wheel Loader	1 Unit	Nabire	Baik

➤ CV. BERDIRI TEGAK

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1.	Exavator	1 Unit	Nabire	Baik
2.	Dump Truck	1 Unit	Nabire	Baik

2.4. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

- ❖ Laporan Mingguan
- ❖ Laporan Bulanan

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Item 1 Pakat
Proposisi/Karya : Persepsi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Palat 1
Tahun Anggaran : 2022

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBARUAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	HARGA KONTRAK	TOTAL HARGA KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU 13:		4 (EMPAK)		Bulan I					Bulan 2					Kd						
							PERIODE:		11 Desember 2023		S/D		17 Desember 2023		1		2		3			4		5		6	
							REALISASI		REALISASI		S/D MINGGU JALU		S/D MINGGU JALU		21 Nov 2023		27 Nov 2023		1 Dec 2023			5 Dec 2023		11 Dec 2023		18 Dec 2023	
							VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		S/D MINGGU JALU		S/D MINGGU JALU		5 Dec 2023			11 Dec 2023		18 Dec 2023		25 Dec 2023	
							VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME			BOBOT		VOLUME		BOBOT	
I	DIVISI 1. UMUM																										
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	54,890,000	54,890,000	6.10	0.50	3.05	-	0.50	3.05	50	4.57														
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	23,137,500	23,137,500	2.57	0.50	1.28	-	0.50	1.28	50	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43						
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	55,550,000	55,550,000	6.17	0.50	3.08	-	0.50	3.08	50	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03						
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKNIK																										
3.3(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	2,516.00	12,468.18	31,669,180	3.52	-	1,039.6	1.44	1,039.6	1.44	41	0.83	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88						
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BEROTOT																										
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	785,923.40	299,674,814	13.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																										
6.1(1)	Lapis Perap Pengikat - Aspal C utir/Emulsi	Liter	1,924.05	35,635.68	74,336,978	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.3(3)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	2,845,111.66	362,258,077	-10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL BOBOT																											
							7.42		1.44		8.86																
							43.94 %																				
RENCANA																											
REALISASI																											
DEVIASI																											
							-35.08 %																				

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Nama Paket : Presensi Jalan Sembarusa Nabarus Bawah Paket 1
 Prop/Kab/Kota : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Anggaran : 2023

[illegible]

Disetujui oleh:

DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:

CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Persepsi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Pabel 1
 Proposalkannya : Persepsi Papan Tengah / Nabrue
 Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAKAR	URAIAN KEGIATAN	SAT	KONTRAK		CCO		MINGGU 53 : PERIOD 51		MINGGU 54 : PERIOD 52		MINGGU 55 : PERIOD 53		Bulan 1						Bulan 2						Ket
1	DIVISI 1. UMUM	LS	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	S/L MINGGU LALU	VOLUME BOBOT	S/L MINGGU INI	VOLUME BOBOT	S/D MINGGU INI	PERSENT ASE	21 Nov 2023	27 Nov 2023	4 Dec 2023	10 Dec 2023	17 Dec 2023	24 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	Ket
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	0.50	3.05	0.25	1.52	0.75	4.57	75	4.57	75	4.57	75	4.57	75	4.57	75	4.57	75	4.57	75
1.4(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalin Linas	LS	1.00	2.57	1.00	2.57	0.50	1.28	0.25	0.64	0.75	1.93	75	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	0.50	3.08	0.25	1.54	0.75	4.63	75	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK																								
3.2(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.52	1,339.58	1.44	1,039.58	1.44	-	-	1,039.6	1.44	100	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERUNTUT																								
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	33.17	259.89	22.62	-	-	182.00	15.84	182.00	15.84	70	-	5.53	9.23	11.31	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																								
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.05	8.25	2,423.01	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(3)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	50.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT					100.00	100.00		8.86		19.53		28.41		6.03	2.34	7.86	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71
RENCANA AAD-01					52.90 %	52.90 %								6.03	8.36	16.23	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94
REALISASI					28.41 %	28.41 %								0.00	0.00	7.42	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
DEVIASI					-24.50 %	-24.50 %								0.00	0.00	-8.81	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08	-31.08

Disetujui oleh:
 DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
 CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
 NIP. 19670205 199202 1 012


 ALFRADY ZULIANSYAH, ST
 Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket	: Preservasi Jejak Samudra Nabarus Bawah Paket 1
Prop/Kab/Kota	: Provinsi Papua Tengah / Nabire
Tahun Anggaran	: 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012


ALFAHADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Preservasi Jalan Samudra Nabaria Bawah Paket 1
 Prop/Kab/Kota : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Disetujui oleh:

DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:

CV. ARWINA KONSULTAN

BUDIANTO S. TARO
NIP. 19770828 200502 1 002

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Piel :
Proyek/kegiatan :
Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBIAYARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	HARGA KONTRAK	TOTAL HARGA KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	3 (TIGA)				JULAI				AGUSTUS				Kd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							MINGGU KE: 3		PERIODE		7 Desember 2023		S/D		13 Desember 2023		20 Desember 2023			27 Desember 2023		3 Desember 2023		10 Desember 2023		17 Desember 2023		24 Desember 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU LALU		MINGGU INI			MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU LALU		MINGGU INI		MINGGU LALU		MINGGU INI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

JADWAL PELAKSANAAN DAN KIRVA "S"

Nama Paket : Preservasi Jalan Samabusi s Nabarua Bawah Paket 2
 Prop/Kab/Kotaye : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Anggaran : 2023

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANG

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWIS F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Preservasi Jalan Semabusa Nabarus Zawah Paket 2
 Prop/Kab/Kode : Provinsi Papua Tengah / 11abire
 Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN															
Nama Pelak : Preservasi Jalan Samabusa Nabaru Swah Putih 2 Propinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Nabaru Tahun Anggaran : 2023															
MATA PEMERIKSAAN	URAIAN KEGIATAN	BAT	KONTRAK		CCO		MINGGU RE : PERIOD :				Bulan 1				Ket
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	5 (LIMA)		2		Bulan 2				
							S/D MINGGU LALU VOLUME	BOBOT	MINGGU INI VOLUME	BOBOT	S/D MINGGU INI VOLUME	BOBOT	1	2	
I	DIVISI 1. UMUM														
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	0.50	3.05	0.25	1.52	0.75	4.57	75	100%	
1.2.1.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	2.57	1.00	2.57	0.50	1.28	0.25	0.64	0.75	1.93	75	90%	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	0.50	3.08	0.25	1.54	0.75	4.63	75	80%	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKNIK														
3.3.1.1	Penyediaan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.52	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	-	1,039.6	1.44	100		70%	
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERTUTUP														
5.1.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	33.17	259.89	22.62	-	-	195.00	15.98	195.00	16.98	75	50%	
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL														
6.1.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,974.35	8.25	2,423.01	10.40	-	-	-	-	-	-		30%	
6.3.1.1	Letakan Lapis Aspal (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	50.71	-	-	-	-	-	-		10%	
TOTAL BOBOT			100.00		100.00		8.86	20.68	25.34					0%	
			Rencana Minggu ini (Kontrak Awal)				6.03	2.34	6.03	2.34	7.86	27.71	27.71	28.35	
			Rencana s/d Minggu ini (Kontrak Awal)				6.03	8.36	6.03	8.36	16.33	43.94	43.94	71.65	
			Rencana Minggu ini (Addendum No 01)											44.05	
			Rencana s/d Minggu ini (Addendum No 01)											8.86	
			Realisasi s/d Minggu ini											1.44	
			Realisasi Minggu ini											7.12	
			Deviasi											-8.81	

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Paket 2
Propinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Nabarua
Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAKARAN	URAIAN KEGIATAN	BAT	KONTRAK		CCO		MINGGU 6 : (JANUARI)		Bulan 1						Bulan 2						Ket
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	REALISASI		1	2	3	4	5	6							
							S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU INI							PERSENTASE						
																VOLUME BOBOT	VOLUME BOBOT	ASE			
I	DIVISI 1. UMUM																				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	0.75	4.57	0.25	1.52	1.00	6.10	100	4.57							
1.8.1.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	2.37	1.00	2.37	0.75	1.93	0.25	0.84	1.00	2.37	100	0.43	0.43	0.43	0.43	0.64	0.64	0.64	
1.1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	0.75	4.63	0.25	1.54	1.00	6.17	100	1.03	1.03	1.03	1.03	1.54	1.54	1.54	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TAMAH DAN GEOSINTETIK																				
3.3.1.1	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.32	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44		1,039.6	1.44	100		0.88	0.88	0.88	0.88	0.80	0.80	0.80	
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR																				
5.1.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas I.	M3	381.00	33.17	259.89	22.62	1,950.00	16.98	64.89	5.65	259.89	22.62	100		11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																				
6.1.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,324.05	8.25	2,423.01	10.40			2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	100		2.75	2.75	2.75	5.20	5.20	5.20	
6.3.3.1	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Tor	127.33	40.23	160.49	50.71			160.49	50.71	160.49	50.71	100		13.41	13.41	13.41	25.35	25.35	25.35	
TOTAL BOBOT				100.00		100.00		29.84		70.46		100.00									

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Pak : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Paket 2
Proposed Code : 19970828 200502 1 002
Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMERIKSAAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	KONTRAK		OCO		BULAN KE : 2		DUA		Bulan 1				Bulan 2				Ket
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	PERIOD 1		PERIOD 2		PERIOD 3		PERIOD 4		PERIOD 5		6		
							S/D JUALAN LAJU VOLUME	S/D JUALAN LAJU BOBOT	REALISASI BULAN INI VOLUME	REALISASI BULAN INI BOBOT	S/D 27 Nov 2023 S/D	S/D 4 Dec 2023 S/D	S/D 11 Dec 2023 S/D	S/D 18 Dec 2023 S/D	S/D 25 Dec 2023 S/D				
																18 DES 2023		18 DES 2023	
I	DIVISI 1. UMUM																		
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GROSINTETIK																		
3.2(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.52	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1,039.58
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR																		
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	33.17	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89	2.62	259.89
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																		
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.05	8.25	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	2,423.01
6.3(3)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	5.71	160.49	50.71	160.49	50.71	160.49	50.71	160.49	50.71	160.49	50.71	160.49	50.71	160.49
TOTAL BOBOT				100.00	100.00	100.00	0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

Disetujui oleh:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

BUDIANTO S. TARO
NIP. 19770828 200502 1 002

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY JULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Prasasti Jalan Semabusa Nabarus Baruah Paket 3
 Prop/Kab/Kota : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Angkutan : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN


Nama Paksi : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Palak 3
 Propinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Jayapura
 Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAWA RAH	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	HARGA KONTRAK	TOTAL HARGA KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU KE-1		4 (EMPAT)		Bulan 1		Bulan 2			Ket									
							PERIOD 1		11 Desember 2023		1 Desember 2023		1		2		3		4		5		6		
							REALISASI		REALISASI		PIKSIPT ASE		1		2		3		4		5		6		
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
I	DIVISI 1. UMUM																								
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	54,890,000	54,890,000	6.10	0.50	3.05	-	-	0.50	3.05	50	4.57			RENCANA	1.32	10%						
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	23,137,500	23,137,500	2.57	0.50	1.28	-	-	0.50	1.28	50	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	10%					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	55,550,000	55,550,000	6.17	0.50	3.08	-	-	0.50	3.08	50	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	10%					
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																			10%					
3.3 (1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	2,540.00	12,418.18	31,669,189	3.52	-	-	1,039.6	1.44	1,039.6	1.44	41	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	10%					
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BEREUTIR																			10%					
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	783,933.40	298,674,814	35.17	-	-	-	-	-	-	-	5.53	9.53	9.21	9.21	9.21	9.21	10%					
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																REALISASI			10%					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.05	38,615.68	74,336,978	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	10%					
6.3 (1)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	2,845.1	362,258,077	41.23	-	-	-	-	-	-	-	-	13.41	13.41	13.41	13.41	13.41	10%					
TOTAL BOBOT							101.00	7.42	1.44	8.86															
RENCANA							41.94 %	Rent: Kontrak Progress s/d Minggu ini (%)			6.03	2.34	7.86	27.71	27.71	28.35									
REALISASI							8.86 %	Rent: Kontrak Progress kumulatif (%)			6.03	8.36	16.23	43.94	71.65	100.00									
DEVIASI							-31.08 %	Real Progress kumulatif (%)			0.00	0.00	7.42	8.86											
								Deviasi (%)			-6.03	-8.36	8.86	-35.08											

Disetujui oleh:
 DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
 CV. ARWINA KONSULTAN



ISAI LEWT F.H. SAROY, ST
 NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
 Supervisi Engineer

TADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Nama Pesta	: Pesta Jalan Sambutan Nibaranu Rawati Pukul 3
Provinsi/Kabupaten	: Provinsi Papua Tengah / Nabire
Tahun Anggaran	: 2023
URUTAN KE-	4
JUMLAH	

TOTAL BOEOT

Dibuat oleh:

CV ARWINA KONSULTAN

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST.
Supervisi Engineer

33

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paksiol	: Preservasi Jalan Samudra Naburua Berah Paksiol 3
Prop/Kab/Xcode	: Prov/Kab/Papua Tengah / Nalibre
Tahun Anggaran	: 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CW. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Pelat : **Preservasi Jalan Samabusa Nabarua (Rawa) Paket 3**
 Propinsi/Kabupaten : **Provinsi Papua Tengah / Nabarua**
 Tahun Anggaran : **2023**

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBARA	URAIAN KEGIATAN	SAT	KONTRAK		CCO		PERIODE :		MINGGU KE :		6 (EIAM)		Bulan 1						Bulan 2						Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	S/D MINGGU LALU VOLUME BOBOT	S/D MINGGU INI VOLUME BOBOT	25 Desember 2023	31 Desember 2023	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																	REALISASI MINGGU INI		PERSENTASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Pele : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua 3km. W. Paket 3
 Propinsi/Kode : Provinsi Papua Tengah / Nabarua
 Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAKARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	KONTRAK		CCO		PERIODE		BULAN RE		2		3		4		5		6		K4
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD KONTRAK	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD KONTRAK	REALISASI		S/D		31 Desember 2023		24 Des 2023		4 Des 2023		18 Des 2023		25 Des 2023		
							LOKOT	VOLUME	BOBOT	S/D JULIAN INI	BOBOT	S/D	24 Des 2023	S/D	4 Des 2023	S/D	25 Des 2023				
I	DIVISI 1. URUM																				
1.1	Mobilisasi	L1	1.00	6.10	1.00	5.10			-	1.00	6.10	1.00	6.10	1.00	6.57						
1.8.11	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	L1	1.00	2.57	1.00	2.57			-	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	0.43	0.43	0.41	0.64	0.64	0.64	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	L1	1.00	6.17	1.00	6.17			-	1.00	6.17	1.00	6.17	1.00	1.03	1.03	1.03	1.54	1.54	1.54	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK																				
3.3.11	Penyiapan Badan Jalan	M1	2,540.00	3.52	1,039.58	1.44			-	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44	1.00	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR																				
5.1.11	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M1	381.00	33.17	259.89	22.62			-	259.89	22.62	259.89	22.62	100	5.53	9.27	11.31	11.31	11.31	11.31	
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																				
6.1.11	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	L1	1,924.05	8.25	2,423.01	10.40			-	2,423.01	10.40	2,423.01	10.40	100		27.71	5.20	5.20	5.20	5.20	
6.3.3	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	53.71			-	160.49	50.71	160.49	50.71	100		13.41	25.35	25.35	25.35	25.35	
TOTAL BOBOT				100.00		100.00			0.00		100.00		100.00								
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												
									Deviasi												
									Rencana Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Kontrol Awal)												
									Rencana Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Rencana s/d Minggu Ini (Addendum No 01)												
									Realisasi s/d Minggu Ini												
									Realisasi Minggu Ini												

➤ CV. BERDIRI TEGAK

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

[illegible]

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Paket 4
Profil/Kategori : Perovai/Papua Tengah / Nabarua
Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAYARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU KE :			3 (TGA)			Bulan 1			Bulan 2			Ket			
					PERIODE :			11 Desember 2023			27 Nov/2023			4						
					REALISASI			MINGGU INI			9/11 MINGGU INI			11 Dec 2023				16 Dec 2023		
					VOLUME	BOBOT	BOBOT	VOLUME	BOBOT	BOBOT	VOLUME	BOBOT	BOBOT	VOLUME	BOBOT	BOBOT				
I	DIVISI 1. UMUM																			
1.2	Mobilisasi	L1	1.00	0.01	0.75	0.01	0.75	0.01	0.01	7.5	0.01	RENCANA	0.00	0.00	0.00	5				
1.8.11	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	L4	1.00	2.96	0.75	2.22	0.75	2.22	7.5	0.56	0.56	0.59	0.59	0.59	0.59	25 Dec 2023				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	L1	1.00	0.01	0.75	0.00	0.75	0.00	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7/10				
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																			
3.2.1(a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M1	28.00	1.34	-	-	-	-	-	-	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	31 Dec 2023				
VII	DIVISI 7. STRUKTUR																			
7.1.8	Beton, f'c=15 Mpa	M1	1.34	0.41	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	60%				
7.3.11	Baja Tulangan Polos-BJTV 280	M1	185.21	0.66	-	-	-	-	-	-	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	50%				
7.9.11	Pasangan Batu	M1	30.75	5.74	-	-	-	-	-	-	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	50%				
7.10.3(a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M1	350.00	63.14	50.00	14.43	130.00	23.45	37	-	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	18.94				
7.13.11	Sandaran (Railing)	M1	15.40	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40%				
VIII	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN																			
8.3.1(a)	Pengisian struktur padat elemen struktur beton, let	M2	215.60	1.37	-	-	-	-	-	-	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	1.32				
8.7.1(a)	Pengisian struktur baja pada daerah kering lebar 80	M2	176.75	3.66	-	-	-	-	-	-	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.24				
8.10.11	Pengantian Lantai Kayu	M3	7.03	6.73	-	-	-	-	-	-	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	0.89				
8.10.7	Pengantian Papan Lantai Kendaraan	M3	1.80	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%				
XI	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																			
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	80.00	0.51	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10%				
X	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																			
10.1.11	Galian pada Saluran Air atau Leming untuk Pemelihan	M1	108.55	10.82	100.0	10.28	103.13	10.28	95	-	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	1.32				
10.2.11	Pemeliharaan Kinerja Jembatan ... bernang ... m	L1	1.00	0.64	-	-	-	-	-	-	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.89				
TOTAL BOBOT					100.00		14.43	35.96								0%				
RENCANA					20.53 %											24.35				
REALISASI					35.96 %											100.00				
DEVIASI					15.43 %															
					21.53	14.43			35.96											
					Renc. Kontrk Progres s/d Minggu ini (%)					19.93	24.22	30.90	24.35							
					Renc. Kontrk Progres Komulatif (%)					20.53	44.75	75.65	100.00							
					Real Progres s/d Minggu ini (%)					7.64	13.89	14.13								
					Real Progres Komulatif (%)					7.64	21.53	35.96								
					Deviasi (%)					7.04	1.00	-8.79								

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

Signature

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket : Preservasi Jalan Samabusa Nabaru Bawah Paket 4
 Profil Paksi
 Tahun Anggaran : 2025

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAKARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU KE :		8/D	24 Desember 2023		PERSENTASE ABE	Bulan 1-3					Ket
					PERIOD E			REALISASI			1	2	3	4	5	
					R/D MINGGUJALU	BOBOT/T		MINGGUJALU	BOBOT							
I	DIVISI 1. UMUM	LS	1.00	0.01	0.75	0.01	0.75	0.01	75	0.01	RENCANA					100.4
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	2.96	0.75	2.22	0.75	2.12	75	0.59	0.59	0.59	0.56	0.59	50.4	
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	0.01	0.75	0.00	0.75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.4	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	0.01	0.75	0.00	0.75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.4	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOMINTETIK	M3	28.08	1.34						0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	84.4	
3.2(1a)	Timbunan Benda dari sumber galian	M3	28.08	1.34						0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	70.4	
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	M3								0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	60.4	
7.1(6)	Beton 1615 Mpa	M3	1.34	0.41						0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	50.4	
7.3(1)	Baja Tulangan Poles-Bjtr-280	Kg	183.22	0.66						1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	18.94	
7.9(1)	Pasangan Batu	M3	30.75	5.74						12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	50.4	
7.10(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M3	350.00	63.14	130.00	23.45	11.73	195.01	35.18	56	0.13	0.13	0.13	0.13	40.4	
7.13(1)	Sandaran (Railing)	M1	15.40	0.24						0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	1.22	
VIII	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN	M2	215.60	1.37						1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	2.24	
8.3(1a)	Pengisian profil pada elemen struktur beton, lb	M2	176.75	3.66						2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.89	
8.7(1a)	Pengisian struktur buis pada daerah kerang beton lb	M2	7.05	6.73						0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	20.4	
8.10(1)	Pengisian Lemai Kayu	M3	1.80	1.78						3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	10.4	
8.10(7)	Pengisian Papan Jalur Kandangan	M3	1.80	1.78						0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	10.4	
XI	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Buat	80.00	0.51						0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	20.4	
9.2(6)	Patok Pengarah	Buat	80.00	0.51						3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	10.4	
X	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	M3	108.55	10.82	103.13	10.28		103.13	10.28	95	0.31	0.31	0.31	0.31	10.4	
10.1(1)	Challen pada Saluran Air atau Lering untuk Pemeliharaan	M3	108.55	10.82	103.13	10.28		103.13	10.28	95	0.31	0.31	0.31	0.31	10.4	
10.2(1)	Pemeliharaan Kinerja Jembatan ... bentang m	LS	1.00	0.64											5.4	
TOTAL BOBOT					35.96	11.73		47.69			0.50	19.93	24.22	30.90	24.35	
					75.65 %						0.50	20.55	44.75	78.65	100.00	
					47.69 %						7.64	13.85	14.43	11.73		
					-27.96 %						7.54	21.50	35.96	47.69		
											7.04	1.00	-8.79	-27.96		

Disetujui oleh:
 DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
 CV. ARWINA KONSULTAN

Handwritten signature

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
 NIP. 19670205 199202 1 012

ALFIADY ZULIANSYAH, ST
 Supervisi Engineer

> CV. BULABU ANUGERAH JAYA

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Nama Paket : <u>Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Etape 1</u> Prop/Kas/Kod/ra : <u>Provinsi Papua Tengah/Nabara</u> Tahun Anggaran : <u>2023</u>										Bulan 1				Bulan 2				Ket								
MATA PEMBELAJARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	HARGA KONTRAK	TOTAL HARGA KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU 13:1		3 (TODA)		1		2		3		4		5		6					
							PERIODE		04 Desember 2023		S/D 10 Desember 2023		24 Nov 2023		27 Nov 2023		4 Dec 2023		11 Dec 2023		18 Dec 2023		24 Dec 2023		31 Dec 2023	
							KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS		KASABUS	
							S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU	S/D MINGGU LAJU
I	DIVISI 1. UMUM	LS	1,00	54.890.000	54.890.000	6,10	-	-	0,50	3,05	0,50	3,05	0,50	3,05	0,50	3,05	0,50	3,05	0,50	3,05	0,50	3,05				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	23.137.500	23.137.500	2,57	-	-	0,50	1,28	0,50	1,28	0,50	1,28	0,50	1,28	0,50	1,28	0,50	1,28	0,50	1,28				
1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	55.550.000	55.550.000	6,17	-	-	0,50	3,08	0,50	3,08	0,50	3,08	0,50	3,08	0,50	3,08	0,50	3,08	0,50	3,08				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	12.468.18	12.468.18	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GIZO BINTETET	M2	2.540,00	31.669.180	31.669.180	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.3(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	2.540,00	12.468.18	12.468.18	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR	M3	381,00	782.923.40	782.923.40	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381,00	782.923.40	782.923.40	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL	Liter	1.924,05	38.635.65	38.635.65	8,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cold/Emulsi	Liter	1.924,05	38.635.65	38.635.65	8,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.3(2)	Lapisan Lapis Atas (HPS-WC)	Ton	127,23	2.845.111.66	2.845.111.66	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL BOBOT							100,00	0,00	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42					
							16,23 %	Renc. Kontrol Progress s/d Minggu ini (%)																		
							7,42 %	Renc. Kontrol Progress Kumulatif (%)																		
							-8,81 %	Real Progress s/d Minggu ini (%)																		
							-8,81 %	Real Progress Kumulatif (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
							-8,81 %	Deviasi (%)																		
</																										

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN										JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"									
Nama Paket : Persepsi Jalan Sate dan Nabarua Bawah Paket 5 Propinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Nabarua Tahun Anggaran : 2023																			
MATA PEMBIYARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME KONTRAK	HARGA KONTRAK	TOTAL HARGA KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	MINGGU KE. 4 (EMPAT)				MINGGU KE. 5 (LIMA)				MINGGU KE. 6 (ENAM)				Kd
							PERIODE: 11 Desember 2023				17 Desember 2023				18 Desember 2023				
							REALISASI				REALISASI				REALISASI				
							S/D MINGGU LALU	VOLUME	BOBOT	S/D MINGGU INI	VOLUME	BOBOT	S/D MINGGU INI	VOLUME	BOBOT	S/D MINGGU LALU	VOLUME	BOBOT	
I	DIVISI 1. UMUM	LS	1.00	54,890,000	54,890,000	6.10	0.50	3.05	-	0.50	3.05	50	4.57	RENCANA	50	4.57	RENCANA	100%	
1.2	Mobilisasi																		
1.8.1.1	Mangkiran dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	23,137,500	23,137,500	2.57	0.50	1.28	-	0.50	1.28	50	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	96%	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	55,550,000	55,550,000	6.17	0.50	3.08	-	0.50	3.08	50	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	96%	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TAJAH DAN GEOMETRIK																		
3.3.1.1	Penyipan Badan Jalan	M2	2,540.00	12,468.18	31,669,189	3.52	-	1,039.6	1.44	1,039.6	1.44	41	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	62%	
V	DIVISI 5. PERKERASAN PERBUTIR																		
5.1.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	783,223.40	298,674,814	33.17	-	-	-	-	-	-	-	5.53	9.21	9.21	9.21	30%	
VI	DIVISI 6. PERKERASAN APAL																		
6.1.1.1	Lapis Base Pengisian - Aspal Cold/Emulsi	Liter	1,974.05	38,635.68	74,336,978	8.25	-	-	-	-	-	-	-	2.75	2.75	2.75	2.75	100%	
6.3.1.1	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	2,845,111.65	362,258,077	40.23	-	-	-	-	-	-	-	13.41	13.41	13.41	13.41	9%	
TOTAL BOBOT							100.00	7.42	1.44	8.86	100.00	7.42	1.44	8.86	100.00	7.42	1.44	8.86	
							43.94 %	Renc. Kontrak Progress s/d Minggu ini (%)			6.03	2.34	7.86	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	28.35
							8.86 %	Renc. Kontrak Progress Kumulatif (%)			6.03	8.36	16.23	43.94	43.94	43.94	43.94	43.94	100.00
							-35.08 %	Real Progress s/d Minggu ini (%)			0.00	0.00	7.42	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	
								Real Progress Kumulatif (%)			0.00	0.00	7.42	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	
								Deviasi (%)			-6.03	-8.36	-8.81	-35.08	-35.08	-35.08	-35.08	-35.08	

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN										JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"										
Nama Paket : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Bawah Pabel 3 Propinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Nabara Tahun Anggaran : 2023																				
MATA PEMBAKARAN	URAIAN KEGIATAN	BAT	KONTRAK		CCO		MINGGU KE :		PERCENT ASE	Bulan 1					Bulan 2					Ket
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	VOLUME KONTRAK	BOBOT THD TOTAL	PERIODE :													
							S/D MINGGU LALU	REALISASI		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		BOBOT	S/D MINGGU INI			
										VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		VOLUME	BOBOT	VOLUME	
I	DIVISI 1. UMUM																			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	0.50	3.05	50	4.57										
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	2.57	1.00	2.57	0.50	1.28	50	0.43										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	0.50	3.08	50	1.03										
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOMORFOLOGI																			
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.52	1,039.58	1.44	-	-	41											
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERSUTIR																			
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	381.00	33.17	259.89	22.62	-	-												
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL																			
6.1 (1)	Lapis Remp Pengikat - Ar-pal Cair/Emulsi	Liter	1,924.05	8.25	2,423.01	10.40	-	-												
6.3 (3)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	50.71	-	-												
TOTAL BOBOT				100.00		100.00														
</																				

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Pelat : Preservasi Jalan Samabusa Nabarua Barati Plat 6
Provinsi/Kabupaten : Provinsi Papua Tengah / Nabire
Tahun Anggaran : 2023

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

MATA PEMBAKARAN	URAIAN KEGIATAN	SAT	KONTRAK			CCO		MINGGU KE :				5		Bulan 1		Bulan 2				Ket			
			VOLUME KONTRAK	BOBOT THD KONTRAK TOTAL	BOBOT THD BOBOT TOTAL	PERIODE :		S/D	24 Desember 2023	REALISASI		1	2	3	4	5	6						
						S/D MINGGU LALU				MINGGU INI	S/D MINGGU INI												
						VOLUME BOBOT	BOBOT											VOLUME BOBOT	BOBOT				
I	DIVISI 1. UMUM																						
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	6.10	1.00	6.10	0.50	3.05	0.25	1.52	0.75	4.57	75	100%									
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	2.57	1.00	2.57	0.50	1.28	0.25	0.64	0.75	1.93	75	90%	0.43	0.43	0.43	0.43	0.64				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	6.17	1.00	6.17	0.50	3.08	0.25	1.54	0.75	4.63	75	84%	1.03	1.03	1.03	1.03	1.54				
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													76%									
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,540.00	3.52	1,039.58	1.44	1,039.58	1.44			1,039.6	1.44	100	60%	0.88	0.88	0.88	0.88	0.60				
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR													50%									
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	351.00	33.17	259.89	22.62			195.00	15.98	195.00	10.98	75	100%	5.53	9.32	11.31	11.31	11.31				
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL													75%									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,924.05	8.25	2,433.01	10.40								10%									
6.3 (3)	Lapisan Lapis Atas (HRS-WC)	Ton	127.33	40.23	160.49	50.71																	
TOTAL BOBOT			100.00	100.00	100.00	8.86	20.68	29.34															
							Rencana Minggu Ini (Kontrak Awal)				6.03	2.34	7.86	27.71	27.71	28.35							
							Rencana s/d Minggu ini (Kontrak Awal)				6.03	8.36	16.23	43.94	43.94	71.63	100.00						
							Rencana Minggu ini (Addendum No 01)												47.10				
							Rencana s/d Minggu ini (Addendum No 01)												8.86	52.90	100.00		
							Realisasi s/d Minggu Ini				0.00	0.00	7.42	1.44	20.68								
							Realisasi Minggu Ini				0.00	0.00	7.42	8.86	29.34								
							Deviasi:				-6.03	-8.36	-8.81	-35.08	-33.36								
																					Dibuat oleh:		

Disetujui oleh:

DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:

CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

ISAI LEWIF.H. SAROY, ST


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

Disetujui oleh:

DIREKSI LAPANGAN

CV. ARWINA KONSULTAN

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST

NIP. 19670205 1992021012

Supervisi/Engineer

47

2.6. RINGKASAN QUALITY CONTROL

- Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 1
Nomor Kontrak : 600/19/SPK-SN1/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 21 November 2023
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Desember 2023)
 - Rencana : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Deviasi : 0 %
- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 2
Nomor Kontrak : 600/22/SPK-SN2/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Desember 2023)
 - Rencana : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Deviasi : 0 %
- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 3
Nomor Kontrak : 600/25/SPK-SN3/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Desember 2023)
 - Rencana : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Deviasi : 0 %

➤ Kontraktor : CV. BERDIRI TEGAK
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 4
Nomor Kontrak : 600/28/SPK-SN4/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 27 November 2023
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Desember 2023)
• Rencana : 100 %
• Realisasi : 100 %
• Deviasi : 0 %

➤ Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 5
Nomor Kontrak : 600/31/SPK-SN5/PUPR-PT/XI/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Desember 2023)
• Rencana : 100 %
• Realisasi : 100 %
• Deviasi : 0 %

BAB III

AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

3.1. LAPORAN AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

❖ Site Engineer :

1. Mengikuti Rapat Rutin Bulanan
2. Inspeksi Kelokasi Pekerjaan PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pengawasan (Supervisi).
3. Memeriksa semua pekerjaan fisik Proyek terhadap kualitas dan kuantitas.
4. Memeriksa progress kemajuan fisik yang diajukan kontraktor.
5. Memonitor semua Pekerjaan Quality Control yang dilaksanakan Kontraktor.
6. Memeriksa Monthly Sertificate (Sertifikat Bulanan) yang diajukan Kontraktor.
7. Membuat dan menyusun laporan bulanan dan laporan Kemajuan progress pekerjaan Konsultan.

❖ Quantty/Qualty Control/Inspector.

1. Memeriksa laporan harian dan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor.
2. Mengawasi semua pekerjaan konstruksi dilapangan.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN SUPERVISI

CV. ARWINA KONSULTAN

PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH
KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2023

GEORGE MICHAEL M UDAM, ST
Direktur


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Supervisi Engineer

Yonas Stanty Wayar, ST
Inspector

RISMAN KAIMUDIN, ST
Inspector

MARIANA YOSEVINA URAPMABIN, ST
ADM Kanto/Sekretaris

Di Buat oleh
CV. ARWINA KONSULTAN


ALFRIADY ZULIANSYAH, ST
Site Engineer

3.3 JADWAL PENUGASAN PERSONIL

JADWAL PENGAWASAN PERSONIL									
NO	PERSONIL	NOVEMBER		DESEMBER					
		25 November 2023 SID	02 Desember 2023 SID	09 Desember 2023 SID	16 Desember 2023 SID	23 Desember 2023 SID	30 Desember 2023 SID	06 Januari 2024 SID	13 Januari 2024 SID
I.	SITE ENGINEER								
II.	INSPECTOR 1								
III.	INSPECTOR 2								
IV.	ADM KANTOR/SEKRETARIS								
KETERANGAN :		HADIR	:						
		TIDAK HADIR	:						

Disetujui oleh:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Disetujui oleh:
DIREKSI LAPANGAN

Dibuat oleh:
CV. ARWINA KONSULTAN

BUDIANTO S. TARO
NIP. 19770828 200502 1 002

ISAI LEWI F.H. SAROY, ST
NIP. 19670205 199202 1 012

REZKY RAMADHAN, ST
Supervisi Engineer

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan / monitoring pelaksanaan pekerjaan Paket PENGAWASAN TEKNIS PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA BAWAH, maka dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Kemajuan progres fisik untuk bulan Desember 2023 *Berjalan suai progress yang di rencanakan* Deviasi dari pekerjaan di bulan ini Positif.
- ❖ Kontraktor melakukan musyawarah yang baik dengan masyarakat setempat, serta kontraktor melakukan kerja lembur mengejar keteringgalan progress dari rencana.
- ❖ Adapun rincian kemajuan progres sebagai berikut :

Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (31 Desember 2023)

- Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 1

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Deviasi : 0 %

- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 2

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Deviasi : 0 %

- Kontraktor : CV. NAIYA JANGGA PAPUA
Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 3

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Deviasi : 0 %

➤ Kontraktor : CV. BERDIRI TEGAK

Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 4

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Deviasi : 0 %

➤ Kontraktor : CV. BULABU ANUGERAH JAYA

Nama Pekerjaan : PRESERVASI JALAN SAMABUSA NABARUA
BAWAH PAKET 5

- Rencana : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Deviasi : 0 %

4.2. SARAN

Hal-hal yang perlu kami sarankan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- ❖ Diharapkan kontraktor dapat berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pemilik/pengelola tempat wisata agar dapat memperlancar pekerjaan.
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat melakukan Pendekatan persusif dengan Masyarakat setempat dan pemilik/pengelola tempat wisata agar dapat memperlancar pekerjaan.
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat mempergunakan tenaga dari masyarakat/warga setempat sebagai tenaga harian, guna mempermudah ketika terjadi pemalangan, dimana tenaga tersebut bisa membantu dalam bernegosiasi di lokasi pekerjaan.
