



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS PEKERKAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah



LAPORAN BULAN I

PEKERJAAN :

**PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

LOKASI :

**KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH**



CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESIGN - SUPERVISION - ENGINEERING CONSULTANT

Office : Komplek Industri Korpri - Jl. P. Puruchitir Nabire - Jayapura

Phone : 0967-510554, Fax : 0967-510555

Email : faysentosa_consult@yol.co.id

TAHUN :

2023



CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESAIN – SUPERVISION – ENGINEERING CONSULTANT

Office : Komplek Puri Jeruk Nipis No. 01 Jl. Jeruk Nipis Abepura – Jayapura

Phone : 0967 – 5185454. Fax : 0967 – 5185453

Nomor : 02/FKS/WAS-AKIPPT/2023

Nabire, 18 Oktober 2023

Perihal : Laporan Pendahuluan

Kepada Yth,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Merdeka, nabire / provinsi papua tengah

di -

Nabire

Dengan hormat,

Berdasarkan Kontrak Konsultan Supervisi

Paket : **PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH**

Nomor : **20.3/WAS-AKSES PPT/SP/DPUPR-PPT/2023**

tanggal : **16 OKTOBER 2023**

bersama ini disampaikan Laporan Pendahuluan

No : 01

Periode : LAPORAN BULAN 1

Sebanyak : 5 buku

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
KONSULTAN SUPERVISI
CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

DESIARTI NDAMI WALAHARA, ST

Site Engineer

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
SURAT PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETA LOKASI	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum.....	1
1.2. Uraian Pekerjaan	4
1.3. Kondisi Eksisting	5
1.4. Rencana Penanganan	5

BAB II AKTIVITAS KONTRAKTOR

2.1. Aktivitas Fisik Bulan ini	6
2.2. Struktur Organisasi Kontraktor	7
2.3. Daftar Peralatan	8
2.4. Laporan Kemajuan Pekerjaan	8
2.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan.....	15
2.6. Ringkasan Quality Control	16

BAB III AKTIVITAS KONSULTAN

3.1. Laporan Aktivitas Konsultan Supervisi.....	17
3.2. Struktur Organisasi Konsultan Supervisi	18
3.3. Jadwal Penugasan Personil.....	19


BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Saran	20


LAMPIRAN

Lampiran sesuai progress pada bulan yang bersangkutan	21
---	----

PETA LOKASI

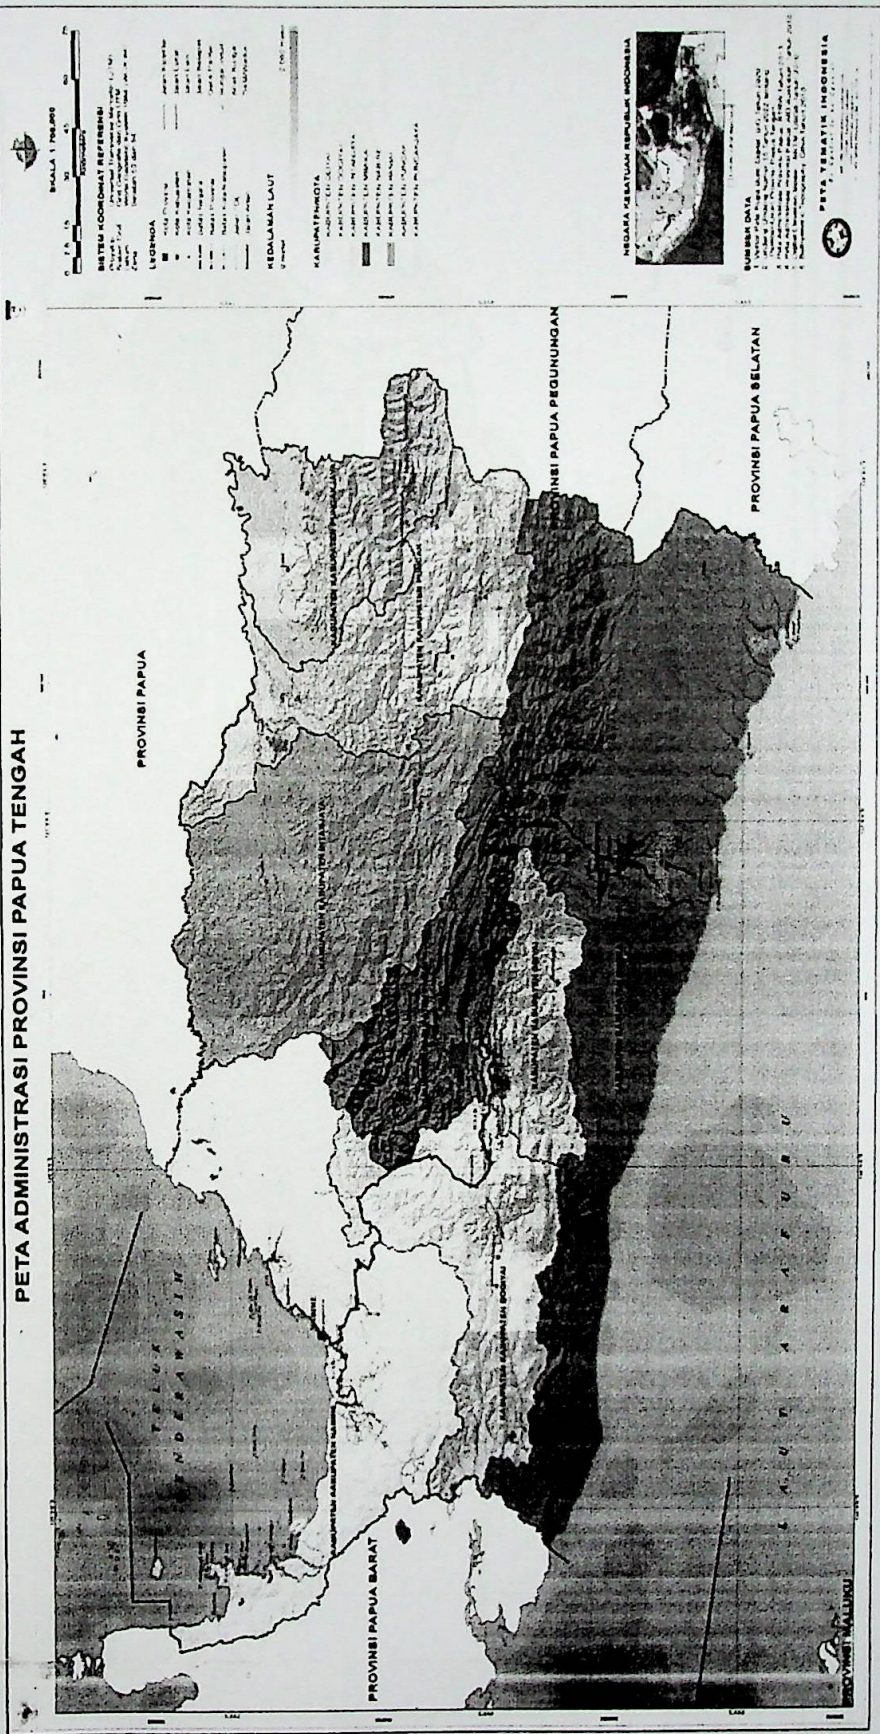

PETA LOKASI KABUPATEN NABIRE

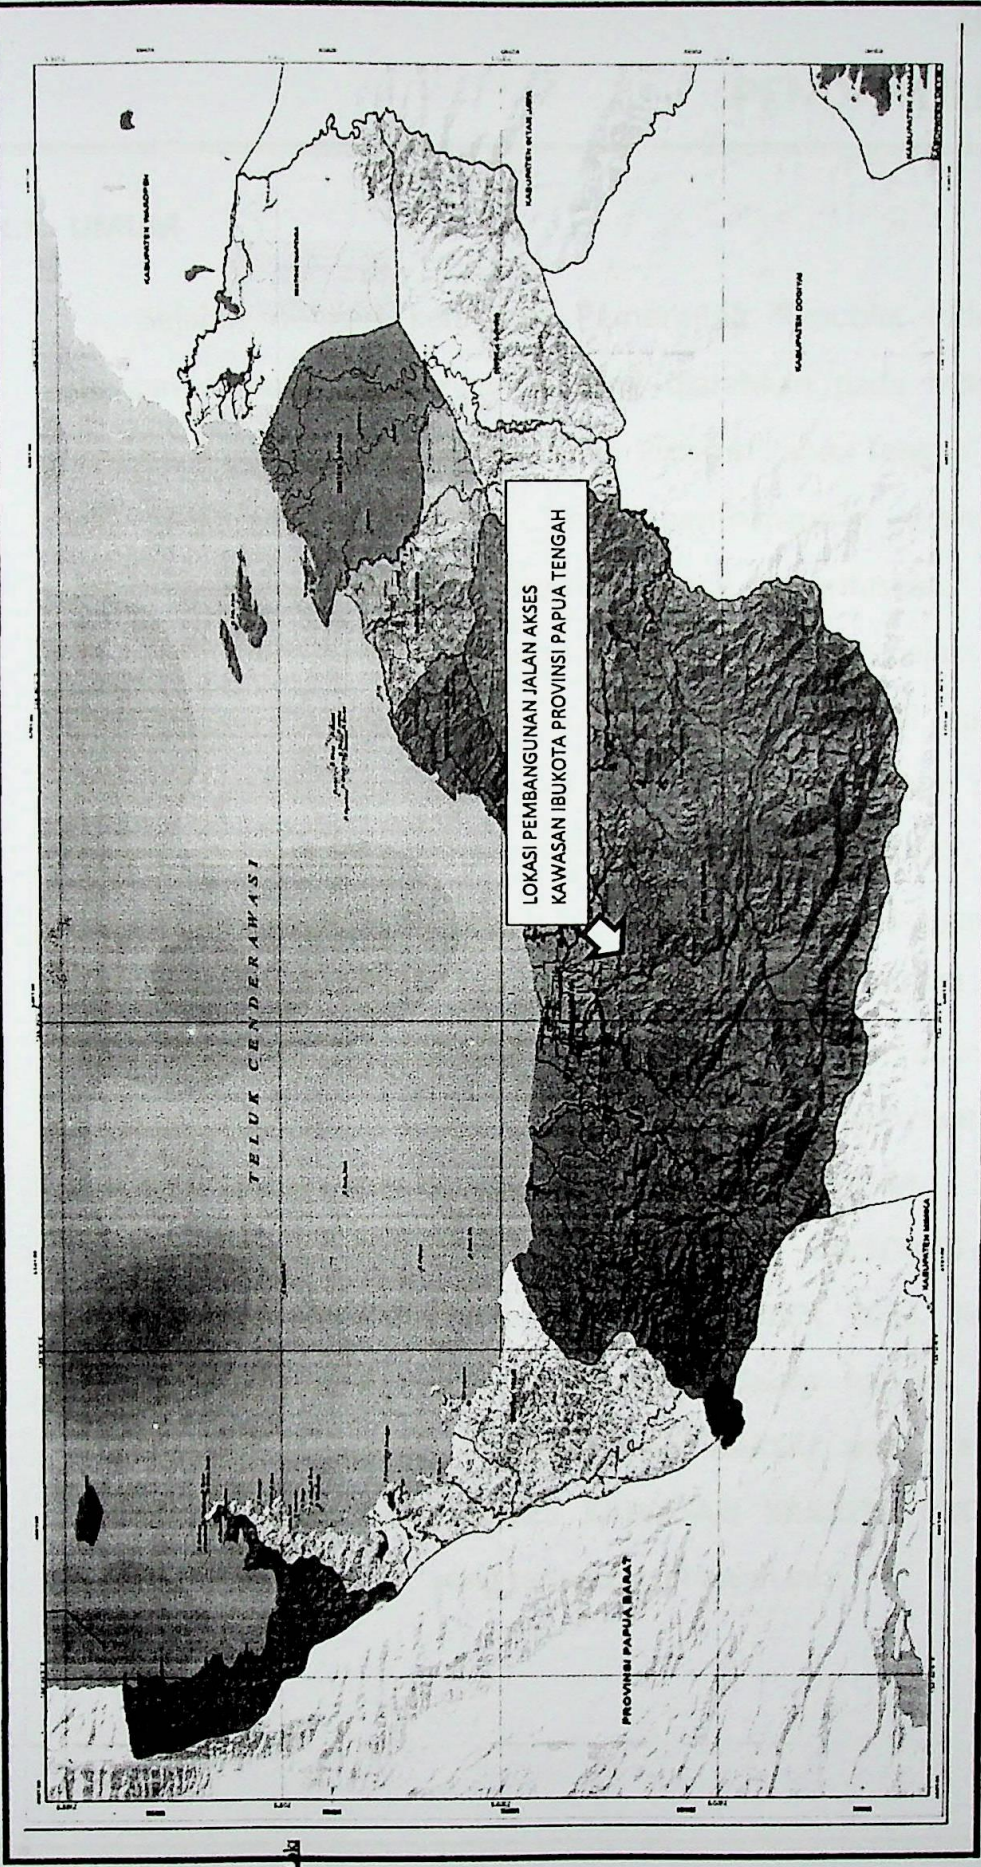

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan sasaran pembangunan yang diarahkan pada Indonesia Bagian Timur termasuk di dalamnya Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Kabupaten Nabire , maka pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan.

Dan Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian baik pelaksanaan fisik di lapangan maupun administrasi, maka Pemerintah daerah dalam hal ini **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, telah menunjuk Konsultan Pengawasan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan **"PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH "**. Dan dalam hal ini Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan Pengawasan jalan tersebut diatas yaitu **CV. FAYA KUNTURA SENTOSA** , Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor **20.3/WAS-AKSES PPT/SP/DPUPR-PPT/2023** Tanggal 16 OKTOBER 2023. Adapun Struktur Organisasi Pengguna Anggaran dalam hal ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT pada kegiatan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH** yaitu yang terlampir dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI


PENGGUNA ANGGARAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)

Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH

Provinsi : Papua Tengah

Kabupaten : Nabire

Tahun : 2023



Adapun pula data-data umum dari kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan **"PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH "**, Provinsi papua tengah,kabupaten Nabire yaitu:

Kontraktor : **PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI**
Nama Pekerjaan : **PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH**
Nomor Kontrak : **21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023**
Tanggal Kontrak : **16 OKTOBER 2023**
Nilai Kontrak Fisik : **Rp. 34.196.817.583,13**
Tahun Anggaran : **2023**
Waktu Pelaksanaan : **75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender**

1.2. URAIAN PEKERJAAN

Adapun Uraian Pekerjaan kontraktor pelaksana
**PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI
PAPUA TENGAH** berdasarkan Perjanjian kontrak Tanggal 27
OKTOBER 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah					
Prop/Kab/Kodya : Provinsi Papua Tengah / Nabire					
Tahun Anggaran : ' 2023					
No	Uraian	Sat	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	e	d	f
	DIVISI 1. UMUM				
1,2	Mobilisasi	LS	1,00	311.000.000,00	311.000.000,00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	59.060.000,00	59.060.000,00
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	144.100.000,00	144.100.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	14.068,00	62.034,55	872.702.049,40
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	126.832,50	32.424,69	4.112.504.494,43
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M ³	6.291,90	27.050,77	170.200.752,01
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	45.260,00	477.094,75	21.593.308.385,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	130.000,00	12.339,41	1.604.123.773,49
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²	80.000,00	24.261,81	1.940.944.621,03
	NILAI FISIK :				30.807.944.075,35
	PPN 11% :				3.388.873.848,29
	JUMLAH :				34.196.817.923,64
	DIBULATKAN :				34.196.817.000,00

1.3. KONDISI EKSISTING

Adapun Kondisi eksisting lokasi Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH Tahun 2023 yaitu :

- Lokasi Peningkatan Berada di Kabupaten nabire, Distrik Wanggar, Provinsi Papua Tengah.
- Area Lahan Berkontur Datar dan Gunung.
- Tanah dasar pada lokasi kegiatan cukup baik.

1.4. RENCANA PENANGANAN

Adapun rencana penanganan dari Kegiatan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH adalah sebagai berikut:

Rencana Penanganan :

Adapun proses Penanganan pada PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH Tahun Anggaran 2023 oleh kontraktor pelaksana yaitu:

- PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH yang terdiri atas:
 - ❖ DIVISI I. UMUM
 - ❖ DIVISI II. DRAINASE
 - ❖ DIVISI III. PEKERJAAN TANAH

2.1. AKTIVITAS FISIK BULAN INI

Kontraktor : PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI

Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Provinsi : PAPUA TENGAH

Kabupaten : NABIRE

Tahun : 2023


Adapun aktivitas kontraktor pelaksana pada bulan ini yaitu:

- A. Kontraktor baru saja melakukan mobilisasi alat berat dari Jayapura
- B. Kontraktor masih melakukan negosiasi terkait sewa lahan untuk Barak pekerja, lokasi Gudang dan Direksi Keet.
- C. Kontraktor baru saja memulai pengambilan data MC 0 di lokasi pekerjaan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR

PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI

**PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA
TENGAH**

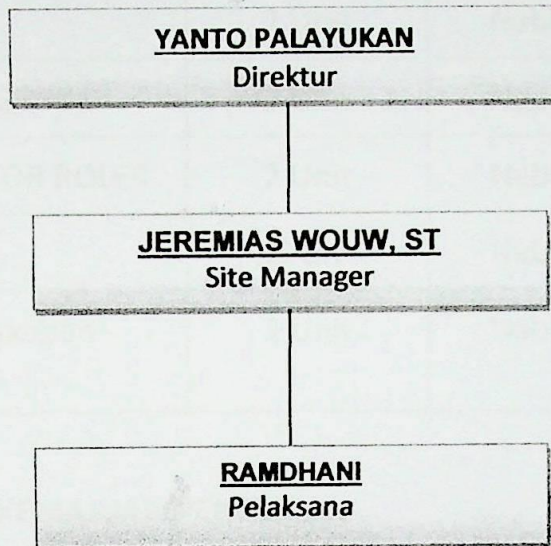

2.3. DAFTAR PERALATAN

Adapun dibawah ini Tabel daftar penggunaan peralatan yang dipergunakan kontraktor pelaksana dilapangan yaitu :

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1.	Exavator	6 Unit	Nabire	Baik
2.	Dozer	2 Unit	Nabire	Baik
3	MOTOGRADE	2 Unit	Nabire	Baik
4	VIBRATOR ROLER	2 Unit	Nabire	Baik
5.	Truck	55 Unit	Nabire	Baik
6.	Perlengkapan Lainnya	1 Unit	Nabire	Baik

2.4. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

- ❖ Laporan Mingguan
- ❖ Laporan Bulanan

2.5 JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (KURVA S)

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN


Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Perumahan Tengah
Proyek/Kategori : Perumahan Tengah /Hidro
Tahun Anggaran : 2023



PT. FIKS KONTROL KENDALIA
Jl. Raya Pahlawan No. 100, RT. 10, RW. 10, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Pahlawan, Kota Bekasi
Telp. (021) 8888 8888, Fax (021) 8888 8888, Email: fiks@fiks.co.id

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"


fks										18 Oktober 2023										01 November 2023										14 Oktober 2023										08 November 2023										01 Desember 2023										08 Desember 2023										15 Desember 2023										22 Desember 2023										29 Desember 2023										05 Januari 2024										12 Januari 2024										19 Januari 2024										26 Januari 2024										02 Februari 2024										09 Februari 2024										16 Februari 2024										23 Februari 2024										01 Maret 2024										08 Maret 2024										15 Maret 2024										22 Maret 2024										29 Maret 2024										05 April 2024										12 April 2024										19 April 2024										26 April 2024										03 Mei 2024										10 Mei 2024										17 Mei 2024										24 Mei 2024										31 Mei 2024										07 Juni 2024										14 Juni 2024										21 Juni 2024										28 Juni 2024										05 Juli 2024										12 Juli 2024										19 Juli 2024										26 Juli 2024										02 Agustus 2024										09 Agustus 2024										16 Agustus 2024										23 Agustus 2024										30 Agustus 2024										06 September 2024										13 September 2024										20 September 2024										27 September 2024										04 Oktober 2024										11 Oktober 2024										18 Oktober 2024										25 Oktober 2024										01 November 2024										08 November 2024										15 November 2024										22 November 2024										29 November 2024										06 Desember 2024										13 Desember 2024										20 Desember 2024										27 Desember 2024										03 Januari 2025										10 Januari 2025										17 Januari 2025										24 Januari 2025										31 Januari 2025										07 Februari 2025										14 Februari 2025										21 Februari 2025										28 Februari 2025										06 Maret 2025										13 Maret 2025										20 Maret 2025										27 Maret 2025										03 April 2025										10 April 2025										17 April 2025										24 April 2025										01 Mei 2025										08 Mei 2025										15 Mei 2025										22 Mei 2025										29 Mei 2025										05 Juni 2025										12 Juni 2025										19 Juni 2025										26 Juni 2025										03 Juli 2025										10 Juli 2025										17 Juli 2025										24 Juli 2025										31 Juli 2025										07 Agustus 2025										14 Agustus 2025										21 Agustus 2025										28 Agustus 2025										04 September 2025										11 September 2025										18 September 2025										25 September 2025										02 Oktober 2025										09 Oktober 2025										16 Oktober 2025										23 Oktober 2025										30 Oktober 2025										06 November 2025										13 November 2025										20 November 2025										27 November 2025										04 Desember 2025										11 Desember 2025										18 Desember 2025										25 Desember 2025										01 Januari 2026										08 Januari 2026										15 Januari 2026										22 Januari 2026										29 Januari 2026										05 Februari 2026										12 Februari 2026										19 Februari 2026										26 Februari 2026										05 Maret 2026										12 Maret 2026										19 Maret 2026										26 Maret 2026										02 April 2026										09 April 2026										16 April 2026										23 April 2026										30 April 2026										07 Mei 2026										14 Mei 2026										21 Mei 2026										28 Mei 2026										04 Juni 2026										11 Juni 2026										18 Juni 2026										25 Juni 2026										02 Juli 2026										09 Juli 2026										16 Juli 2026										23 Juli 2026										30 Juli 2026										06 Agustus 2026										13 Agustus 2026										20 Agustus 2026										27 Agustus 2026										03 September 2026										10 September 2026										17 September 2026										24 September 2026										01 Oktober 2026										08 Oktober 2026										15 Oktober 2026										22 Oktober 2026										29 Oktober 2026										05 November 2026										12 November 2026										19 November 2026										26 November 2026										03 Desember 2026										10 Desember 2026										17 Desember 2026										24 Desember 2026										31 Desember 2026										07 Januari 2027										14 Januari 2027										21 Januari 2027										28 Januari 2027										04 Februari 2027										11 Februari 2027										18 Februari 2027										25 Februari 2027										03 Maret 2027										10 Maret 2027										17 Maret 2027										24 Maret 2027										31 Maret 2027										07 April 2027										14 April 2027										21 April 2027										28 April 2027										05 Mei 2027										12 Mei 2027										19 Mei 2027										26 Mei 2027										02 Juni 2027										09 Juni 2027										16 Juni 2027										23 Juni 2027										30 Juni 2027										07 Juli 2027										14 Juli 2027										21 Juli 2027										28 Juli 2027										04 Agustus 2027										11 Agustus 2027										18 Agustus 2027										25 Agustus 2027										01 September 2027										08 September 2027										15 September 2027										22 September 2027										29 September 2027										06 Oktober 2027										13 Oktober 2027										20 Oktober 2027										27 Oktober 2027										03 November 2027										10 November 2027										17 November 2027										24 November 2027										01 Desember 2027										08 Desember 2027										15 Desember 2027										22 Desember 2027										29 Desember 2027										05 Januari 2028										12 Januari 2028										19 Januari 2028										26 Januari 2028										02 Februari 2028										09 Februari 2028										16 Februari 2028										23 Februari 2028										01 Maret 2028										08 Maret 2028										15 Maret 2028										22 Maret 2028										29 Maret 2028										05 April 2028										12 April 2028										19 April 2028										26 April 2028										03 Mei 2028										10 Mei 2028										17 Mei 2028										24 Mei 2028										31 Mei 2028										07 Juni 2028										14 Juni 2028										21 Juni 2028										28 Juni 2028										04 Juli 2028										11 Juli 2028										18 Juli 2028										25 Juli 2028										01 Agustus 2028										08 Agustus 2028										15 Agustus 2028										22 Agustus 2028										29 Agustus 2028										05 September 2028										12 September 2028										19 September 2028										26 September 2028										02 Oktober 2028										09 Oktober 2028										16 Oktober 2028										23 Oktober 2028										30 Oktober 2028										06 November 2028										13 November 2028										20 November 2028										27 November 2028										03 Desember 2028										10 Desember 2028										17 Desember 2028										24 Desember 2028										31 Desember 2028										07 Januari 2029										14 Januari 2029										21 Januari 2029										28 Januari 2029										04 Februari 2029										11 Februari 2029										18 Februari 2029										25 Februari 2029										03 Maret 2029										10 Maret 2029										17 Maret 2029										24 Maret 2029										31 Maret 2029										07 April 2029										14 April 2029										21 April 2029										28 April 2029										05 Mei 2029										12 Mei 2029										19 Mei 2029										26 Mei 2029										02 Juni 2029										09 Juni 2029										16 Juni 2029										23 Juni 2029										30 Juni 2029										07 Juli 2029										14 Juli 2029										21 Juli 2029										28 Juli 2029										04 Agustus 2029										11 Agustus 2029										18 Agustus 2029										25 Agustus 2029										01 September 2029										08 September 2029										15 September 2029										22 September 2029										29 September 2029										06 Oktober 2029										13 Oktober 2029										20 Oktober 2029										27 Oktober 2029										03 November 2029										10 November 2029										17 November 2029										24 November 2029										01 Desember 2029										08 Desember 2029										15 Desember 2029										22 Desember 2029										29 Desember 2029										05 Januari 2030										12 Januari 2030										19 Januari 2030										26 Januari 2030										02 Februari 2030										09 Februari 2030										16 Februari 2030										23 Februari 2030										01 Maret 2030										08 Maret 2030										15 Maret 2030										22 Maret 2030										29 Maret 2030										05 April 2030										12 April 2030										19 April 2030										26 April 2030										03 Mei 2030										10 Mei 2030										17 Mei 2030										24 Mei 2030										31 Mei 2030										07 Juni 2030										14 Juni 2030										21 Juni 2030										28 Juni 2030										04 Juli 2030										11 Juli 2030										18 Juli 2030										25 Juli 2030										01 Agustus 2030										08 Agustus 2030										15 Agustus 2030										22 Agustus 2030										29 Agustus 2030										05 September 2030										12 September 2030										19 September 2030										26 September 2030										02 Oktober 2030										09 Oktober 2030										16 Oktober 2030										23 Oktober 2030										30 Oktober 2030										06 November 2030										13 November 2030										20 November 2030										27 November 2030										03 Desember 2030										10 Desember 2030										17 Desember 2030										24 Desember 2030										31 Desember 2030										07 Januari 2031										14 Januari 2031										21 Januari 2031										28 Januari 2031										04 Februari 2031										11 Februari 2031										18 Februari 2031										25 Februari 2031										03 Maret 2031										10 Maret 2031										17 Maret 2031										24 Maret 2031										31 Maret 2031										07 April 2031										14 April 2031										21 April 2031										28 April 2031										05 Mei 2031										12 Mei 2031										19 Mei 2031										26 Mei 2031										02 Juni 2031										09 Juni 2031										16 Juni 2031										23 Juni 2031										30 Juni 2031										07 Juli 2031										14 Juli 2031										21 Juli 2031										28 Juli 2031										04 Agustus 2031										11 Agustus 2031										18 Agustus 2031										25 Agustus 2031										01 September 2031										08 September 2031										15 September 2031										22 September 2031										29 September 2031										06 Oktober 2031										13 Oktober 2031										20 Oktober 2031										27 Oktober 2031										03 November 2031										10 November 2031										17 November 2031										24 November 2031										01 Desember 2031										08 Desember 2031										15 Desember 2031										22 Desember 2031										29 Desember 2031										05 Januari 2032										12 Januari 2032										19 Januari 2032										26 Januari 2032										02 Februari 2032										09 Februari 2032										16 Februari 2032										23 Februari 2032										01 Maret 2032										08 Maret 2032										15 Maret 2032										22 Maret 2032										29 Maret 2032										05 April 2032										12 April 2032										19 April 2032										26 April 2032										03 Mei 2032										10 Mei 2032										17 Mei 2032										24 Mei 2032										31 Mei 2032										07 Juni 2032										14 Juni 2032										21 Juni 2032										28 Juni 2032										04 Juli 2032										11 Juli 2032										18 Juli 2032										25 Juli 2032										01 Agustus 2032										08 Agustus 2032										15 Agustus 2032										22 Agustus 2032										29 Agustus 2032										05 September 2032										12 September 2032										19 September 2032										26 September 2032										02 Oktober 2032										09 Oktober 2032										16 Oktober 2032										23 Oktober 2032										30 Oktober 2032										06 November 2032										13 November 2032										20 November 2032										27 November 2032										03 Desember 2032										10 Desember 2032										17 Desember 2032										24 Desember 2032										31 Desember 2032										07 Januari 2033										14 Januari 2033										21 Januari 2033										28 Januari 2033										04 Februari 2033										11 Februari 2033										18 Februari 2033										25 Februari 2033										03 Maret 2033										10 Maret 2033										17 Maret 2033										24 Maret 2033										31 Maret 2033										07 April 2033										14 April 2033										21 April 2033										28 April 2033										05 Mei 2033										12 Mei 2033										19 Mei 2033										26 Mei 2033										02 Juni 2033										09 Juni 2033										16 Juni 2033										23 Juni 2033										30 Juni 2033										07 Juli 2033										14 Juli 2033										21 Juli 2033										28 Juli 2033										04 Agustus 2033										11 Agustus 2033										18 Agustus 2033										25 Agustus 2033										01 September 2033										08 September 2033										15 September 2033										22 September 2033										29 September 2033										06 Oktober 2033										13 Oktober 2033										20 Oktober 2033										27 Oktober 2033										03 November 2033										10 November 2033										17 November 2033										24 November 2033										01 Desember 2033										08 Desember 2033										15 Desember 2033										22 Desember 2033										29 Desember 2033										05 Januari 2034										12 Januari 2034										19 Januari 2034										26 Januari 2034										02 Februari 2034										09 Februari 2034										16 Februari 2034										23 Februari 2034										01 Maret 2034										08 Maret 2034										15 Maret 2034										22 Maret 2034										29 Maret 2034										05 April 2034										12 April 2034										19 April 2034										26 April 2034										03 Mei 2034										10 Mei 2034										17 Mei 2034										24 Mei 2034										31 Mei 2034										07 Juni 2034										14 Juni 2034										21 Juni 2034										28 Juni 2034										04 Juli 2034										11 Juli 2034										18 Juli 2034										25 Juli 2034										01 Agustus 2034										08 Agustus 2034										15 Agustus 2034										22 Agustus 2034										29 Agustus 2034										05 September 2034										12 September 2034										19 September 2034										26 September 2034										02 Oktober 2034										09 Oktober 2034										16 Oktober 2034										23 Oktober 2034										30 Oktober 2034										06 November 2034										13 November 2034										20 November 2034										27 November 2034										03 Desember 2034										10 Desember 2034										17 Desember 2034										24 Desember 2034										31 Desember 2034										07 Januari 2035										14 Januari 2035										21 Januari 2035										28 Januari 2035										04 Februari 2035										11 Februari 2035										18 Februari 2035										25 Februari 2035										03 Maret 2035										10 Maret 2035										17 Maret 2035										24 Maret 2035										31 Maret 2035										07 April 2035										14 April 2035										21 April 2035										28 April 2035										05 Mei 2035										12 Mei 2035										19 Mei 2035										26 Mei 2035										02 Juni 2035										09 Juni 2035										16 Juni 2035										23 Juni 2035										30 Juni 2035										07 Juli 2035										14 Juli 2035										21 Juli 2035										28 Juli 2035										04 Agustus 2035										11 Agustus 2035										18 Agustus 2035										25 Agustus 2035										01 September 2035										08 September 2035										15 September 2035										22 September 2035										29 September 2035										06 Oktober 2035										13 Oktober 2035										20 Oktober 2035										27 Oktober 2035										03 November 2035										10 November 2035										17 November 2035										24 November 2035										01 Desember 2035										08 Desember 2035										15 Desember 2035										22 Desember 2035										29 Desember 2035										05 Januari 2036										12 Januari 2036										19 Januari 2036										26 Januari 2036										02 Februari 2036										09 Februari 2036										16 Februari 2036										23 Februari 2036										01 Maret 2036										08 Maret 2036										15 Maret 2036										22 Maret 2036										29 Maret 2036										05 April 2036										12 April 2036										19 April 2036										26 April 2036										03 Mei 2036										10 Mei 2036										17 Mei 2036										24 Mei 2036										31 Mei 2036										07 Juni 2036										14 Juni 2036										21 Juni 2036										28 Juni 2036										04 Juli 2036										11 Juli 2036										18 Juli 2036										25 Juli 2036										01 Agustus 2036										08 Agustus 2036										15 Agustus 2036										22 Agustus 2036										29 Agustus 2036										05 September 2036										12 September 2036										19 September 2036										26 September 2036										02 Oktober 2036										09 Oktober 2036										16 Oktober 2036										23 Oktober 2036										30 Oktober 2036										06 November 2036										13 November 2036										20 November 2036										27 November 2036										03 Desember 2036										10 Desember 2036										17 Desember 2036										24 Desember 2036										31 Desember 2036										07 Januari 2037										14 Januari 2037										21 Januari 2037										28 Januari 2037										04 Februari 2037										11 Februari 2037										18 Februari 2037										25 Februari 2037										03 Maret 2037										10 Maret 2037										17 Maret 2037										24 Maret 2037										31 Maret 2037										07 April 2037										14 April 2037										21 April 2037										28 April 2037										05 Mei 2037										12 Mei 2037										19 Mei 2037										26 Mei 2037										02 Juni 2037										09 Juni 2037										16 Juni 2037										23 Juni 2037										30 Juni 2037										07 Juli 2037										14 Juli 2037										21 Juli 2037										28 Juli 2037										04 Agustus 2037										11 Agustus 2037										18 Agustus 2037										25 Agustus 2037										01 September 2037										08 September 2037										15 September									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Mabro, 01 November 2023
DEBATOLEH :
KONSTRUKSI DAN KENDALIA
CV. FIKS KONTROL KENDALIA
Desain dan Konstruksi
Supervisi Engineer

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN


Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
 Prop/Kab/Kode : Provinsi Papua Tengah / Nabire
 Tahun Anggaran : 2023



PT. FAYA KUNTURA SENTOSA
 PT. FAYA KUNTURA SENTOSA
 Gedung 1 Komplek Perkotaan IRI, Jl. Jend. Sudirman - Jayapura
 Nomor 1887 - 1111111, Fax 1111111 - 1111111
 Email : faya.kuntura.sentosa@gmail.com

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

No	Uraian	Sat	Volume	Bobot (%)	MINGGU KE : 2 (DUA)										OKTOBER												NOVEMBER												DESEMBER												Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					PERIODE :		REALISASI		PERSEN		28 Oktober 2023		01 November 2023		18 Oct 2023		26 Oct 2023		2 Nov 2023		9 Nov 2023		16 Nov 2023		22 Nov 2023		30 Nov 2023		8 Dec 2023		13 Dec 2023		20 Dec 2023		27 Dec 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		REALISASI		PERSEN		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT		VOLUME		BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a	b	c	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</



Nabire, 30 Oktober 2023
 Disahkan Oleh :
 KONSULTAN SURVEYING
 CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
 DESIARTI KUNTURA SENTOSA
 Supervisor Engineer

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nama Paket	: Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
PropKab/Kodys	: Provinsi Papua Tengah / Nabre
Tahun Anggaran	: 2023

OV. FAYA KUNTURA SENTOSA
DESAIN - PERANCANGAN - ILLUSTRASI COMPTONARY
Office : Komplek Padi Putih Blok No. 81 K, Jendral Mulya Surabaya - Indonesia
Phone : 0047 - 8118414, Fax : 0047 - 8118481
Email : fayaovun_000000@yahoo.com

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA "S"

[illegible]

MENYETULUI :

PEJABAT BERKUALITAS KOMPETEN (PPK)
DINAS PERENCANAAN, UMUM DAN PEMERintahan
RAJAHMUNINGRAJ, PROVINSI PAPUA BARAT

Nabire. 01 November 2023

DIBUAT OLEH :

KONSULTASI DAN SERVIS
CV. FAMA KUNTURA SENTOSA

DESIARTI NDAMANTALAHARA ST

2.6. RINGKASAN QUALITY CONTROL

Kontraktor : PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN
IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
Nomor Kontrak : 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
Tanggal Kontrak : 16 OKTOBER 2023
Nilai Kontrak Fisik : Rp. 34.196.817.583,13
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender

Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (Oktober 2023)

- Rencana : 7,79 %
- Realisasi : 0,15 %
- Deviasi : 7,64 %

3.1. LAPORAN AKTIVITAS KONSULTAN SUPERVISI

❖ **Site Engineer :**

1. Mengikuti Rapat Rutin Bulanan
2. Inspeksi Kelokasi Pekerjaan PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pengawasan (Supervisi).
3. Memeriksa semua pekerjaan fisik Proyek terhadap kualitas dan kuantitas.
4. Memeriksa progress kemajuan fisik yang diajukan kontraktor.
5. Memonitor semua Pekerjaan Quality Control yang dilaksanakan Kontraktor.
6. Memeriksa Monthly Sertificate (Sertifikat Bulanan) yang diajukan Kontraktor.
7. Membuat dan menyusun laporan bulanan dan laporan Kemajuan progress pekerjaan Konsultan.


❖ **Quantty/Quality Control/Inspector.**

1. Memeriksa laporan harian dan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor.
2. Mengawasi semua pekerjaan konstruksi dilapangan.

3.2. STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN SUPERVISI

CV. FAYA KUNTURA SENTOSA

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
PROVINSI PAPUA TENGAH/KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2023



Diajukan oleh:
CV. FAYA KUNTURA SENTOSA


DESIARTI NDAMALAWAHARA, ST
Site Engineer

PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan / monitoring pelaksanaan pekerjaan Paket PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH maka dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Kemajuan progres fisik untuk bulan Oktober 2023 berjalan lambat hal ini dikarenakan lambatnya mobilisasi peralatan dari kota Nabire menuju lokasi pekerjaan. Deviasi dari pekerjaan di bulan ini Negatif 7,64 %.
- ❖ Adapun keterlambatan dalam Pekerjaan Ini dikarenakan Kontraktor cepat dalam memobilisasi alat berat dan personil ke lokasi pekerjaan.
- ❖ Kontraktor melakukan mengalami masalah dalam musyawarah dengan masyarakat setempat yang tidak mau melakukan land clearing seluas 30 mtr arah kanan dan kiri jalan.
- ❖ Adapun rincian kemajuan progres sebagai berikut :
Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini (**01 November 2022**)
 - Rencana : 7,79 %
 - Realisasi : 0,15 %
 - Deviasi : - 7,64 %

4.2. SARAN

Hal-hal yang perlu kami sarankan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- ❖ Diharapkan kontraktor dapat dengan segera melakukan mobilisasi dan Pembangunan barak pekerja di lokasi pekerjaan
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat bermusyawarah dengan masyarakat setempat, agar tidak terjadinya pemalangan yang mengakibatkan progress pekerjaan dilapangan terganggu.
- ❖ Diharapkan kontraktor dapat menggunakan masyarakat local setempat dalam merekrut tenaga harian agar dapat memberdayakan masyarakat local setempat.

LAMPIRAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



MOBILISASI



MOBILISASI

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA ' TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE. PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



LOKASI PENAMPUNGAN ALAT BERAT



LOKASI CAMP PEKERJA DAN DIREKSI KEET

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 21.4/JL-AKSES.PPT/SPMK/DPUPR-PPT/ 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 34.196.817.583,13
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. YADA WASISTA KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
WAKTU PELAKSANAAN	: 75 HARI KALENDER



26 Oct 2023 at 08.58.35
-3.466831,+135.381384
Kabupaten Nabire
Papua

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi

LOKASI EXISTING PEKERJAAN



26 Oct 2023 at 08.58.35
-3.466831,+135.381384
Kabupaten Nabire
Papua

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsi

LOKASI EXISTING PEKERJAAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Mereka, Nabire – Papua Tengah e-mail : dpupr.papuatengah@gmail.com

Nabire, 27 Oktober 2023

Nomor : 009/Direksi/UND.RAPAT/JLAKSES/PPT/2023
Perihal : Undangan Rapat

Yth, Pelaksana Teknis
di-
Tempat


Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, kami sebagai direksi bersama konsultan pengawas pada pekerjaan jalan akses ibukota Provinsi Papua Tengah telah turun ke lapangan. Namun didapati belum adanya pergerakan mobilisasi alat dan pembuatan kamp bagi pekerja. Sehubungan hal tersebut maka kami mengundang pelaksana teknis lapangan bisa menjelaskan situasi yang dapati di lapangan pada rapat yang dilaksanakan pada :

1. Tempat : Aula Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah,
2. Hari/Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
3. Waktu : Jam 14.00 WIT

Untuk dapat menjelaskan di depan PPK dan Direksi perihal belum ada pergerakan alat dan pembuatan kamp pekerja.

Diharapkan pelaksana menyiapkan rencana kerja dan time scedull.

Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direksi

ANGKA BUDHI, ST

Tembusan :

1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah
2. PPK
3. Konsultan Pengawas
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Alamat : Jalan Mereka, Nabire – Papua Tengah e-mail : dpupr.papuatengah@gmail.com


Nabire, 30 Oktober 2023

Nomor : 010/Direksi/TEGURAN/JLAKSES/PPT/2023
Perihal : Teguran Pertama

Yth, Direktur PT Yada Wasista Konstruksi
di-
Tempat.

Setelah mendengar penjelasan dari pelaksana teknis terkait belum adanya pergerakan alat dan pembuatan kamp bagi pekerja di lapangan pada rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di Aula Rapat Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah kami sebagai direksi mengambil keputusan untuk memberikan Teguran Pertama sehubungan belum adanya pergerakan alat dan belum adanya pembuatan kamp bagi pekerja yang merupakan keterlambatan pekerjaan yang dilakukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penyedia. Diharapkan agar dapat segera dilaksanakan pembuatan kamp bagi pekerja dan mobilisasi alat ke lokasi kerja.

Demikian surat teguran pertama ini di buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direksi

ANGKA BUDHI, ST

Tembusan :

1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah
2. PPK
3. Konsultan Pengawas
4. Arsip.
